
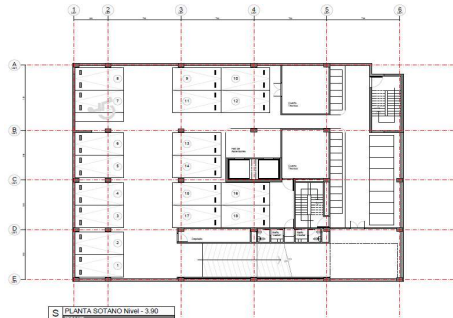


 Banco de Desarrollo Territorial	INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO	Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
--	---	--

FECHA	8/08/2023			PERIODO No.	27	DEL	31/07/2023	AL	6/08/2023
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.								
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	SCJ-2162-2022								
PLAZO INICIAL:	DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO								
FECHA DE INICIACIÓN:	27/01/2023								
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/06/2024								
MODIFICATORIO No. 1	PRORROGA CINCO (5) MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30/11/2024								
PLAZO EN DIAS:	674								
PLAZO TRANSCURRIDO:	191 EQUIVALE AL			28%		DEL PLAZO DEL CONTRATO			
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022	1,61%		Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022						
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022	1,61%		Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022						
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL	100,00%		Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022						
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	10,75%		% AVANCE ETAPA 1	11,53%		% (+) ADELANTO % (-) ATRASO	0,78%		
VALOR INICIAL :	\$ 21.411.634.465,00								
VALOR PAGADO:	\$ 0,00								
VALOR POR PAGAR:	\$ 21.411.634.465,00								

2. CONTROL DE HITOS.				
No.		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.	27/01/2023	27/01/2023	0
2	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	27/01/2023	27/01/2023	0
3	REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRAMA A LA SDSCJ	3/02/2023	3/02/2023	0
4	REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO	3/02/2023	3/02/2023	0
5	CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO	7/02/2023	7/02/2023	0
6	APROBACION MANUAL OPERATIVO	21/02/2023	14/03/2023	21
7	DESEMBOLSO DE RECURSOS	31/03/2023	31/03/2023	0
8	REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA	15/02/2023	15/02/2023	0
9	PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA	31/03/2023	31/03/2023	0
10	PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ	31/03/2023	31/03/2023	0
11	ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION	12/04/2023	4/04/2023	-8
12	PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA	3/05/2023	3/05/2023	0
13	DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION	31/05/2023	31/05/2023	0
14	APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION	7/06/2023	6/06/2023	-1
15	PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS	20/06/2023	11/07/2023	21
16	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS	19/07/2023	19/07/2023	0
17	ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)	19/01/2024	En Ejecución	
18	ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)	19/09/2024		
19	CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA	19/01/2025		
20	LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	19/03/2025		
21	ACCIONES TRANSVERSALES	19/03/2025		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
SE REALIZO LA PRESENTACION DE UNA PROPUESTA DE ANTEPROYECTO, SOCIALIZADA ENTRE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y FINDETER, TENIENDO EN CUENTA LAS CIRCULACIONES Y FLUJOS ENTRE LAS ZONAS PRIVADAS Y PUBLICAS. SE ENVIO LA SOLICITUD A LA SDSCJ PARA LOS PODERES DE LOS TRAMITES DE SOLCITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ACUEDUCTO - ALCANTARRILLADO, ENERGIA Y GAS A NOMBRE DE ALEXANDRA ROSERO. SE TERMINARON EN CAMPO LAS ACTIVIDADES DE GEOTECNIA Y TOPOGRAFIA .

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES	
 <p>LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO</p>	 <p>ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO - SOTANO</p>
