

juez competente. En consecuencia, la parte contratante queda habilitada para disponer de los recursos del contrato y acometer las contrataciones futuras, así como las acciones legales que considere pertinente en aras a dar cabal cumplimiento al objeto del contrato y garantizar la conservación de los recursos públicos comprometidos y los intereses de la población perjudicada.

5. ORDENAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Con soporte en lo anterior y en plena consonancia con lo acordado por las partes en el acuerdo, se ordenara la liquidación del contrato en los términos allí planteados, de suerte que a partir del día siguiente a la notificación de la presente comunicación se empezaran a contar los términos para la misma. De igual manera se le ordenara a la supervisor y a la interventoría realizar todas las acciones, actividades y tareas permitidas dentro de su competencia para liquidar el contrato a la mayor brevedad posible y con todas las precisiones técnicas que se establezcan, y si hay lugar a ello, la magnitud del daño, el establecimiento de los perjuicios tanto materiales como inmateriales y poner en orden las cuentas patrimoniales, financieras y económicas de la extinta relación comercial.

No obstante lo anterior, se informa que, honrando la lealtad contractual y los postulados de la buena fe, se continuará aplicando el contrato y se procederá a liquidarlo, si es posible de común acuerdo, al tenor de las estipulaciones contractuales o, si es menester, de forma unilateral.

Todo lo anterior con fundamento en lo contractualmente pactado y, por otra parte, en aras de honrar el debido proceso, y permitir al contratista participar en la liquidación, finiquito y paz y salvo del contrato, en donde se establecerán los saldos a favor o en contra de las partes.

6. ORDENAR LAS ACCIONES JUDICIALES QUE CORRESPONDAN Y PARA ELLO ACUDIR AL JUEZ DEL CONTRATO SI HAY LUGAR A ELLO: Se informa que con base en el grave, directo y esencial incumplimiento de que trata este escrito y en procura de preservar el patrimonio público y el interés general, se darán las instrucciones conducentes a efectos de revisar la necesidad y viabilidad de adelantar las demandas civiles, comerciales y penales a que haya lugar ante la jurisdicción competente.

7. ORDENAR LIQUIDAR LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA EN FAVOR DE LA PARTE CONTRATANTE: De conformidad con lo estipulado en la cláusula vigésima del contrato PAF-JU02-G02DC-2015, se estipula que en caso de resolución o terminación del contrato por incumplimiento total, parcial o defectuoso del CONTRATISTA, éste debe pagar a nombre de la CONTRATANTE, a título de indemnización, una



suma equivalente al 20% del valor total del contrato⁶. Una vez se conozca el documento que profiera la interventoría del contrato en el que se evidencie el monto de la indemnización por TODO concepto de TODO perjuicio causado a la contratante con ocasión del grave incumplimiento del contratista, se procederá a aplicar la cláusula vigésima primera del acuerdo en lo que arroje la tasación anticipada de perjuicios y su respectivo pago, en el marco de la cláusula penal pecuniaria a favor del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica -Findeter-.

Con fundamento en lo expuesto en el presente documento y los documentos soporte del mismo, se entiende notificada la decisión de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria con la radicación del presente escrito y su cuantificación dependerá exclusivamente del informe que, como lo ordena la regla contractual, deberá presentar el Interventor del contrato.

Todo ello se efectuará en virtud de las instrucciones impartidas por el comité fiduciario del fideicomiso y no podrá exceder de 4 meses contados a partir de la notificación de la presente declaración.

8. NOTIFICAR AL INTERVENTOR DEL CONTRATO: Comunicar la presente Acta de Cierre al señor CARLOS ESPITIA PALOMINO representante legal o quien haga sus veces del CONSORCIO ECO - DAIMCO, Interventor del Contrato, en la dirección Calle 44B No. 57^a - 52, Bogotá D.C.


9. NOTIFICAR AL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA: Comunicar la presente acta a GUSTAVO SÁNCHEZ JIMENEZ Representante Legal de CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA o quien haga sus veces, en la dirección Carrera 11B No. 96-03 oficina 504 en la ciudad de Bogotá D.C.

⁶ CLÁUSULA VIGESIMA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO En caso de resolución o terminación del contrato por incumplimiento total, parcial o defectuoso del CONTRATISTA, éste debe pagar a nombre de la CONTRATANTE, a título de indemnización, una suma equivalente al 20% del valor total del contrato. El valor pactado en la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el pactado valor.



En los términos expuestos se entiende notificada a la firma CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA la decisión por parte de la FIDUCIARIA BOGOTA S.A., en su calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER de dar por terminado unilateralmente el CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 por el incumplimiento grave y sistemático de las obligaciones a su cargo.

Atentamente:




JULIÁN GARCÍA SUÁREZ


Representante Legal

FIDUCIARIA BOGOTA actuando como Vocera y

Administradora del PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

Fiduciaria Bogotá 
VICEPRESIDENCIA
JURIDICA 



Pólizas Contrato de Obra

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
09-04-2012-1317-P-06-RCE-01C-3

Amigos



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

No. POLIZA NE-100005275

No. ANEXO 2

No. CERTIFICADO 70456144

NO. 100

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
00 00 Horas del 26/11/2015	24 00 Horas del 25/02/2017

TECHNICAL EXPERTISE 187 1994

SAC ESPENBORG 07/23/74

DIRECCION CALLE 03 NO. 58-24 PISO:

TELEFONO 0113804

FORMADOR	CONSTRUCCIONES RUBAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900 567 304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 05 03 OF 504	TELEFONO	3208208514
ASEGURADO	CONSTRUCCIONES RUBAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900 567 304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 05 03 OF 504	TELEFONO	3208208514
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	NIT	
DIRECCION		TELEFONO	0000000

OBJETO DEL CONTRATO

[illegible][illegible]

MAPA 7: ESTUDIOS Y BIENESTAR

VIGILANCIA 25/06/2015 - 26/10/2016 VIGILANCIA ASSURIMENTO 8 3.000,00 561,20

2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818

2350

CONCLUSIONS

AMBIENTE BATTED - ESPINOS, LABORES Y OPERACIONES 19.00 Y SOBRE EL VALOR DE LA PRIMERA 10.00 SIM.

FOR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICANDO SE HAYE CONCORDANCIA A SOLICITUD DEL ANTERIORADO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE SESION 14 DE OCTUBRE DE 2019, SE ACTUO LA VIGENCIA DE LA POLICIA EN REFERENCIA.

145. BOMBA TERMICA Y/O CONDENSER NO SE MODIFICAN

APROBACIÓN DE

28/1/16

LOS VALORES ASSEGUARADOS ESTABLECIDOS COMO "LIMITE POR EVENTO" Y "LIMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA (LA EMPRESA) FORMAN PARTE DEL VALOR ASSEGUADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BASICO (PAGO QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASSEGUADORA) Y POR ESTO NO SON VALORES ASSEGUARADOS ADICIONALES.

LA POLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS ENTREPATRIOTALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA POLIZA (CONTRATISTA) HASTA UN MAXIMO DEL 20% DEL LIMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE FIANZAS, LABORES Y OPERACIONES -FAL-

[illegible]

VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE LAS 00:00 Horas del 26/11/2016 HASTA LAS 23:59 horas del 23/02/2017		TOTAL A SEGURO	3,135,826,283.70
--	--	----------------	------------------

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION	COSEGURO	POLIZA LIBER	CERTIF. LIBER	PRIMA BRUTA	\$	0.0
MULTIRESGOS DE COLO	AGENCIAS	100.00				DESCUENTOS		
			COSEGUROSORES	% PARTICIPACION		PRIMA NETA	\$	0.0
						OTROS	\$	

CONVENIO DE PAGO CREDITO EFECTIVO Fecha de Emisión: 10/11/2014

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

DE ACOPIADO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ANTEPROYECTO DE LEY DE 1990, LA MODALIDAD DE PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS SUPLEMENTOS O ANEXOS QUE SE PAGA CON FUNDAMENTO EN SU PRODUCCION LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y FORMA DEBEJIR A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA ECONOMIA DEL PAGO DE LA PRIMA O SEGURO Y DE LOS GASTOS CORRELATIVOS DE LA POLIZA.

SEGUROS DE CAPITAL - SEGUROS DE VIDA

El presente informe se elaboró en el marco de la actividad de monitoreo y evaluación del proyecto "Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Red de la Mujer y la Niñez de Colombia", financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Gobierno Nacional de Colombia.

Puedes consultar tu póliza en www.asseguramts.lleida.cat con...

COMPANIA MUNICIPAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 23 N. 100 - 24 PISO 2001

TELÉFONO: 2816500 FAX: 2811228
SOCIOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENCIONES

ASSEMBLED

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES 13-08-2013-1317-P-06-CU-13C-2

Afiliados



CANAL COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA-CAPF
Asociación Promotora de Asegurados
Participantes en Seguros de Asegurados

HOJA No 1

No. POLIZA NB-100047322 No. ANEXO 2

No. CERTIFICADO 70456145

VIGENCIA DESDE 00:00 Horas del 26/10/2015 VIGENCIA HASTA 24:00 Horas del 25/06/2021

FECHA EXPEDICION 18/11/2015

SUC. EXPEDIDORA BOGOTA

DIRECCION CALLE 33 NO 38-24 PISO 1

TELEFONO 6113304

TOMADOR	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900 987 364 2
DIRECCION	CARRERA 11 B NO 33 OF 504	TELEFONO	320268914
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830 055 897 7
DIRECCION	CALLE 7 N 7-37 PISO 3 - BOGOTA D.C.	TELEFONO	
BENEFICIARIO/PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.		NIT	830 055 897 7
DIRECCION	CALLE 7 N 7-37 PISO 3 BOGOTA D.C.	TELEFONO	

OBJETO DEL CONTRATO

EL OBJETO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SE HA EMITIDO EN LA CIUDAD DE BOGOTA A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

LAS OBRAS TIENEN LAS CONDICIONES NO SE MODIFICAN

PARANTZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 1317-P-06-CU-13C-2, CON OBJETO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRAL, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-URBANAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y VALLE DEL CAUCA GRUPO III.

NOTA 1: LA VIGENCIA DEL AMARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ETAPA 1 SERA DE TRES AÑOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECEPCION FINAL DE LA ETAPA 1.

NOTA 2: LA VIGENCIA DEL AMARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECEPCION FINAL DE LA OBRA POR PARTE DE LA INTERVENIENTE.

ETAPA 1: EMISION Y SEGUROS

AMARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
SEGURO DE VIDA	26/10/2015 - 25/06/2021	\$ 115.531.903,50
SEGURO DE ACCIDENTES	26/10/2015 - 25/06/2021	\$ 115.531.903,50
SEGURO DE ENFERMEDADES	26/10/2015 - 25/06/2021	\$ 115.531.903,50

ETAPA 2: EMISION DE OBRA

AMARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
SEGURO DE VIDA	26/10/2015 - 25/06/2021	\$ 1.020.294.983,50
SEGURO DE ACCIDENTES	26/10/2015 - 25/06/2021	\$ 1.020.294.983,50
SEGURO DE ENFERMEDADES	26/10/2015 - 25/06/2021	\$ 1.020.294.983,50

APROBACION DE PAGO
18/11/2015

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA \$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 25/06/2021	115.531.903,50	0,00
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 25/06/2021	3.020.294.983,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 25/06/2021	38.510.433,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 25/06/2021	1.006.784.994,50	0,00
ORIGINAL DEL SERVICIO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 25/06/2021	115.531.903,50	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 25/06/2021	3.020.294.983,50	0,00

TOTAL ASEGURADO 7.316.927.995,50

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION	COASEGURO	FOLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	PRIMA BRUTA	\$	0,00
MULTI-RIESGOS DE LUJO	ALF-NOVAS	100,00				DESCUENTOS	\$	0,00
						PRIMA NETA	\$	0,00
						OTROS	\$	0,00
						IVA	\$	0,00
						TOTAL A PAGAR	\$	0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/11/2015

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES OBLIGATORIO COMPLETAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, EN REGIMEN DE INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 225 DE 2010) DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA.

Puedes consultar tu póliza en www.seguros-mundial.com.co

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 88 - 24 PISO 2 Y 3
TELEFONO: 285250 FAX: 2851220

BOMBS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

- ASEGURADO -

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
13-08-2013-1317-P-06-CU-13C-2

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

HOJA No. 1



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

No. POLIZA NB-100047322	No. ANEXO 8
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 19/07/2022
FECHA EXPEDICION 10/02/2017	
SUC. EXPEDIDORA BOGOTA	

No. CERTIFICADO 70548340

DIRECCION CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1

TELEFONO 6113304

TOMADOR	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CALLE 67 NO 7-35 PISO 3.	TELEFONO	6852900
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CALLE 67 NO 7-35 PISO 3.	TELEFONO	6852900

OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CERTIFICA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSI N°6 AL CONTRATO PAF-JU02-602DC-2015 FIRMADO EL 28/10/2016 EL CUAL NO AFECTA EN VALOR NO VIGENCIA LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.PAF-JU02-602DC-2015, CUYO OBJETO ES ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS AJUSTES Y DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

NOTA 1: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ETAPA 1 SERA DE TRES AÑOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1.

NOTA 2: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	26/10/2015 - 18/05/2017	\$ 115.531.300,20
PRESTACIONES SOCIALES	26/10/2015 - 18/11/2016	\$ 38.510.433,40
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2016 - 18/11/2019	\$ 115.531.300,20

ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	19/11/2016 - 19/01/2018	\$ 3.020.294.983,50
PRESTACIONES SOCIALES	19/11/2016 - 19/07/2020	\$ 1.006.764.994,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/07/2017 - 19/07/2022	\$ 3.020.294.983,50

APROBACION DE POLIZAS

PA 20/02/2017

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 18/11/2016	24:00 Horas del 18/05/2017	115.531.300,20	0,00
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/01/2018	3.020.294.983,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 18/11/2016	24:00 Horas del 18/11/2019	38.510.433,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2020	1.006.764.994,50	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 18/11/2016	24:00 Horas del 18/11/2019	115.531.300,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2022	3.020.294.983,50	0,00

TOTAL ASEGURADO 7.316.927.995.30

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
MULTIRIESGOS DE COLO	AGENCIAS	100,00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER
COASEGURADORES	% PARTICIPACION	

PRIMA BRUTA	\$	0,00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	\$	0,00
OTROS	\$	0,00
IVA	\$	0,00
TOTAL A PAGAR	\$	0,00

CONVENIO DE PAGODIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 10/02/2017

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CICLO EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2016 SUPERINTENDENCIA)

Puedes consultar tu póliza en www.seguros-mundial.com.co

[Firma]

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855600 FAX: 2855220

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN - AUYO RETENEDORES



- ASEGURADO -

[Firma]
TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
13-08-2013-1317-P-06-CU-13C-2

Afiliados



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASAPAF
Asociación Panamericana de Finanzas
Panamerican Surety Association

HOJA No. 1

No. POLIZA NB-100047322

No. ANEXO 8

No. CERTIFICADO 70548340

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

00:00 Horas del 26/10/2015 24:00 Horas del 19/07/2022

FECHA EXPEDICION 10/02/2017

SUC. EXPEDIDORA BOGOTA

DIRECCION CALLE 33 NO.68-24 PISO 1

TELEFONO 6113304

TOMADOR	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CALLE 67 NO 7-35 PISO 3.	TELEFONO	6852900
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CALLE 67 NO 7-35 PISO 3.	TELEFONO	6852900

OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS CERTIFICA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSI N°6 AL CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 FIRMADO EL 28/10/2016 EL CUAL NO AFECTA EN VALOR NI VIGENCIA LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. PAF-JU02-G02DC-2015, CUYO OBJETO ES ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCHO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

NOTA 1: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ETAPA 1 SERA DE TRES AÑOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1.

NOTA 2: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	26/10/2015 - 18/05/2017	\$ 115.531.300,20
PRESTACIONES SOCIALES	26/10/2015 - 18/11/2019	\$ 38.510.433,40
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2016 - 18/11/2019	\$ 115.531.300,20

ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	19/11/2016 - 19/01/2018	\$ 3.020.294.983,50
PRESTACIONES SOCIALES	19/11/2016 - 19/07/2020	\$ 1.006.764.994,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/07/2017 - 19/07/2022	\$ 3.020.294.983,50

APROBACION DE POLIZAS

PJA 20/02/2017

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 18/11/2016	24:00 Horas del 18/05/2017	115,531,300.20	0.00
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/01/2018	3,020,294,983.50	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 18/11/2016	24:00 Horas del 18/11/2019	38,510,433.40	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2020	1,006,764,994.50	0.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 18/11/2016	24:00 Horas del 18/11/2019	115,531,300.20	0.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2022	3,020,294,983.50	0.00

TOTAL ASEGURADO 7,316,927,995.30

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
MULTIRIESGOS DE COLO	AGENCIAS	100.00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER
COASEGURADORES	% PARTICIPACION	

PRIMA BRUTA	\$	0.00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	\$	0.00
OTROS	\$	0.00
IVA	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	0.00

CONVENIO DE PAGODIRECTO EFECTIVO. Fecha de Pago: 10/02/2017

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2013 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA)

Puedes consultar tu póliza en www.segurosmondial.com.co

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855000 FAX: 2851229

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES



- TOMADOR - AFIANZADO -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES 13-08-2013-1317-P-06-CU-13C-2

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

HOJA No. 1



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

No. POLIZA NB-100047322 No. ANEXO 8 No. CERTIFICADO 70548340

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 19/07/2022

FECHA EXPEDICION 10/02/2017

SUC. EXPEDIDORA BOGOTA

DIRECCION CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1

TELEFONO 6113304

TOMADOR	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CALLE 67 NO 7-35 PISO 3.	TELEFONO	6852900
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CALLE 67 NO 7-35 PISO 3.	TELEFONO	6852900

OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS CERTIFICA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSI N°6 AL CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 FIRMADO EL 28/10/2016 EL CUAL NO AFECTA EN VALOR NO VIGENCIA LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. PAF-JU02-G02DC-2015, CUYO OBJETO ES ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCHO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

NOTA 1: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ETAPA 1 SERA DE TRES AÑOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1.

NOTA 2: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	26/10/2015 - 18/05/2017	\$ 115.531.300,20
PRESTACIONES SOCIALES	26/10/2015 - 18/11/2019	\$ 38.510.433,40
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2016 - 18/11/2019	\$ 115.531.300,20

ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	19/11/2016 - 19/01/2018	\$ 3.020.294.983,50
PRESTACIONES SOCIALES	19/11/2016 - 19/07/2020	\$ 1.006.764.994,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/07/2017 - 19/07/2022	\$ 3.020.294.983,50

APROBACION DE POLIZAS

PA 20/02/2017

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 18/11/2016	24:00 Horas del 18/05/2017	115.531.300,20	0,00
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 18/11/2016	24:00 Horas del 19/01/2018	3.020.294.983,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 18/11/2016	24:00 Horas del 18/11/2019	38.510.433,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2020	1.006.764.994,50	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 18/11/2016	24:00 Horas del 18/11/2019	115.531.300,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2022	3.020.294.983,50	0,00
TOTAL ASEGURADO			7.316.927.995,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
MULTIRIESGOS DE COLO	AGENCIAS	100,00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER
COASEGURADORES	% PARTICIPACION	

PRIMA BRUTA	\$	0,00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	\$	0,00
OTROS	\$	0,00
IVA	\$	0,00
TOTAL A PAGAR	\$	0,00

CONVENIO DE PAGODIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 10/02/2017

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CUENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERINTENDENCIA)

Puedes consultar tu póliza en www.segurosmundial.com.co

[Firma]

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855000 FAX: 2851220

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES



- INTERMEDIARIO -

[Firma]
TOMADOR

ULN-08-12/02

Afiliados



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

09-04-2012-1317-P-06-RCE-01C-3

CAMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA API

HOJA No. 1

No. POLIZA-NB-100005275

No. ANEXO 5

No. CERTIFICADO 70548339

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 19/11/2017

FECHA EXPEDICION 10/02/2017

SUC. EXPEDIDORA BOGOTA

DIRECCION CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1

TELEFONO 6113304

TOMADOR	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
ASEGURADO	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	NIT	
DIRECCION		TELEFONO	

OBJETO DEL CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
NO. PAF-J02-607DC-2015, CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCHO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS
VIGENCIA 26/10/2015 - 18/03/2017 VALOR ASEGURADO \$ 115.531.300,20

VIGENCIA 26/08/2015 - 18/11/2017 VALOR ASEGURADO \$ 3.020.294.983,50

DEDICIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLE
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 4.00 S.M.L.V.
--	--

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CERTIFICA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSÍ N° 6 AL CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015
 FIRMADO EL 28/10/2016 EL CUAL NO AFECTA EN VALOR NO VIGENCIA
 LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

APROBACION DE POLIZAS

PA 20/02/2017

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA POLIZA (CONTRATISTA) HASTA UN MÁXIMO DEL 20% DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO-

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	1,567,913,142.00	3,135,826,283.70	3,135,826,283.70	0.00
MAYORÍA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LAS 00-00 Horas del 26/01/2015		HASTA LAS 24-00 Horas del 19/11/2017	TOTAL ASEGURADO	3,135,826,283.70

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
MULTIRIESGOS DE COLO	AGENCIAS	100.00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER
COASEGURADORES	% PARTICIPACION	

PRIMA BRUTA	\$	0.00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	\$	0.00
OTROS	\$	0.00
IVA	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	0.00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 10/02/2017

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1008 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS, O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 S/ DIFINANCIERA)

Puedes consultar tu póliza en www.segurosmondial.com.co

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2853800 FAX: 2851220

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

• ASEGURADO •

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

09-04-2012-1317-P-06-RCE-01C-3

Afiliados



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA & APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

HOJA No. 1

No. POLIZA NB-100005275

No. ANEXO 5

No. CERTIFICADO 70548339

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 19/11/2017

FECHA EXPEDICION 10/02/2017

SUC. EXPEDIDORA BOGOTÁ

DIRECCION CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1

TELEFONO 6113304

TOMADOR	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
ASEGURADO	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	NIT	
DIRECCION		TELEFONO	

OBJETO DEL CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. PAF-JU02-G02DC-2015, CUYO OBJETO ES ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS

VIGENCIA 26/10/2015 - 18/03/2017 VALOR ASEGURADO \$ 115.531.300,20

ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA

VIGENCIA 26/09/2015 - 19/11/2017 VALOR ASEGURADO \$ 3.020.294.983,50.

DEDUCIBLES:

AMPARO DEDUCIBLE

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 4.00 SMLV

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CERTIFICA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSI N°6 AL CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 FIRMADO EL 28/10/2016 EL CUAL NO AFECTA EN VALOR NI VIGENCIA LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

APROBACION DE POLIZAS

PA 27/02/2017

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BASICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA POLIZA (CONTRATISTA) HASTA UN MÁXIMO DEL 20% DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO-

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	1,567,913,142.00	3,135,826,283.70	3,135,826,283.70	0.00

VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE LAS 00:00 Horas del 26/10/2015 HASTA LAS 24:00 Horas del 19/11/2017 TOTAL ASEGURADO 3,135,826,283.70

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION	COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	PRIMA BRUTA	\$	0.00
MULTIRIESGOS DE COLO	AGENCIAS	100.00				DESCUENTOS		
			COASEGURADORES	% PARTICIPACION		PRIMA NETA	\$	0.00
						OTROS	\$	0.00
						IVA	\$	0.00
						TOTAL A PAGAR	\$	0.00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/02/2017

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERINTENDENCIA)

Puedes consultar tu póliza en www.segurosmundial.com.co

[Firma]

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES



- TOMADOR - AFIANZADO -

[Firma]
TOMADOR



HOJA No. 1

No. CERTIFICADO 70548339

FECHA EXPEDICION 10/02/2017

SUC. EXPEDIDORA BOGOTA

DIRECCION CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1

TELEFONO 6113304

NIT
TELEFONO

DEFICIENCIES:

AMFARO

DEDUCIBLE

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 4.00 S.M.L.V.
--	--

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS CERTIFICA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL OTROSI N°6 AL CONTRATO PAF-JU/02-GO2DC-2015
FIRMADO EL 28/10/2016 EL CUAL NO AFECTA EN VALOR NI VIGENCIA
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

APROBACION DE POLIZAS

P2A 20/02/2017

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) HASTA UN MÁXIMO DEL 20% DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO-

VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE LAS	00:00 Horas del 26/10/2015	HASTA LAS	24:00 Horas del 19/11/2017	TOTAL ASEGURADO	3,135,826,283.70
------------------------------------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------------	------------------

PRIMA BRUTA	\$	0.00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	\$	0.00
OTROS	\$	0.00
IVA	\$	0.00
TOTAL A PAGAR	\$	0.00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/02/2017

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENSDADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008)
(SIBERFINANJERA)

Puedes consultar tu póliza en www.segurosmondial.com.co

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855600 FAX: 2851220

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

• INTERMEDIARIO •

SEP-08-1703



tu compañía siempre


LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT. 860.037.013-6

C E R T I F I C A

Que los Señores **CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA**, identificados con Nit. **900.567.304** se encuentran a PAZ Y SALVO con referencia al pago de las pólizas de Cumplimiento No. 100047322 y Responsabilidad Civil No. 100005275 emitidos a la fecha.

La presente se expide a solicitud del interesado a los (15) quince días del mes de Febrero de 2017.

Cordial saludo,



CLAUDIA PAOLA RÓZO
Subgerencia Nacional de Cartera y Recaudos
Elaboró: Katherine Bahamon

Líneas de Atención al Cliente:



Bogotá: 327 4712 / 327 4713
Nacional: 01 8000 111 935



Portal Web
www.segurosmondial.com.co



Seguros Mundial





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
09-04-2012-1317-P-06-RCE-01C-3

Afiliados



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA-APF
Asociación Panamericana de
Parametric Insurance Association

HOJA No. 1

No. POLIZA NB-100005275 No. ANEXO 6 No. CERTIFICADO 70566377

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 28/04/2018

FECHA EXPEDICION 10/05/2017

SUC. EXPEDIDORA BOGOTÁ

DIRECCION CALLE 33 NO 68-24 PISO 1

TELEFONO 6113304

TOMADOR	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
ASEGURADO	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	NIT	
DIRECCION		TELEFONO	1

OBJETO DEL CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. PAF-JUD-002DC-2015, CUYO OBJETO ES ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCHO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUCIARIO - ASISTENCIA TÉCNICA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑO
VIGENCIA 26/10/2015 - 23/08/2017 VALOR ASEGURADO \$ 145.531.300,20
ETAPA 2: EJECUCION DE OBRAS
VIGENCIA 28/04/2017 - 28/04/2018 VALOR ASEGURADO \$ 3.020.294.983,50.

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (DAÑO MORAL) PROVENIENTES DE UN DAÑO FÍSICO CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) HASTA UN MÁXIMO DEL 100% DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO-.

DEDUCIBLES:

AMPARO DEDUCIBLE
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 4.00 SMMLV

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE A SOLICITUD DEL ASEGURADO SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA EN REFERENCIA
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO SE MODIFICAN

APROBACION DE POLEAS

BA 22/05/2017

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BASICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.
LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) HASTA UN MÁXIMO DEL 20% DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO-.

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	1,567,913,142.00	3,135,826,283.70	3,135,826,283.70	2,199,374.00

VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE LAS 00:00 Horas del 26/10/2015 HASTA LAS 24:00 Horas del 28/04/2018 TOTAL ASEGURADO 3,135,826,283.70

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION	COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	PRIMA BRUTA	\$
MULTIRIESGOS DE COLO	AGENCIAS	100.00				DESCUENTOS	
			COASEGURADORES	% PARTICIPACION		PRIMA NETA	\$ 2,199,374.00
						OTROS	\$ 0.00
						IVA	\$ 417,881.00
						TOTAL A PAGAR	\$ 2,617,255.00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO. Fecha de Pago: 09/05/2017

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1003 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990 LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CUENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 206 DE JUNIO DE 2009 SUPERINTENDENCIA).

Puedes consultar tu póliza en www.seguros-mundial.com.co

[Firma]

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2655600 FAX: 2651220
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES



- TOMADOR - AFIANZADO -

[Firma]
TOMADOR

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES 13-08-2013-1317-P-06-CU-13C-2



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA & APF
Asociación Panamericana de Planos
Panamerican Surety Association

HOJA No. 1



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

No. POLIZA NB-100047322	No. ANEXO 9	No. CERTIFICADO 70566376
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas del 26/10/2015	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas del 28/12/2022	
FECHA EXPEDICION 10/05/2017		
SUC. EXPEDIDORA BOGOTA	DIRECCION CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1	TELEFONO 6113304

TOMADOR	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CALLE 67 NO 7-37 PISO 3	TELEFONO	3485400
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CALLE 67 NO 7-37 PISO 3	TELEFONO	3485400

OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN ACTA DE ENTREGA SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA EN REFERENCIA

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO SE MODIFICAN

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.PAF-JU02-602DC-2015, CUYO OBJETO ES ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

NOTA 1: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ETAPA 1 SERA DE TRES AÑOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1.

NOTA 2: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	26/10/2015 - 28/10/2017	\$ 115.531.300,20
PRESTACIONES SOCIALES	26/10/2015 - 28/04/2020	\$ 38.510.433,40
CALIDAD DEL SERVICIO	28/04/2017 - 28/04/2020	\$ 115.531.300,20

ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	28/04/2017 - 28/06/2018	\$ 3.020.294.983,50
PRESTACIONES SOCIALES	28/04/2017 - 28/12/2020	\$ 1.006.764.994,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/12/2017 - 28/12/2022	\$ 3.020.294.983,50

APROBACION DE POLIZA

POA 22/05/2017

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 28/10/2017	115.531.300,20	46.434,00
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 26/04/2017	24:00 Horas del 28/06/2018	3.020.294.983,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 28/04/2020	38.510.433,40	15.383,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 28/04/2017	24:00 Horas del 28/12/2020	1.006.764.994,50	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 28/04/2017	24:00 Horas del 28/04/2020	115.531.300,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 28/12/2017	24:00 Horas del 28/12/2022	3.020.294.983,50	0,00
TOTAL ASEGURADO			7.316.927.995,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
MULTIRIESGOS DE COLO	AGENCIAS	100,00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER
COASEGURADORES	% PARTICIPACION	

PRIMA BRUTA	\$	61.817,00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	\$	61.817,00
OTROS	\$	0,00
IVA	\$	11.745,00
TOTAL A PAGAR	\$	73.562,00

CONVENIO DE PAGODIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/05/2017

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2016 SI SE RENUELA).

Puedes consultar tu póliza en www.segurosmondial.com.co

[Firma]

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855600 FAX: 2851220

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES



- TOMADOR - AFIANZADO -

[Firma]
TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

La COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

QUE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTENIDA EN LA POLIZA NB-100047322, CUYO AFIANZADO ES: CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA Y ASEGURADO O BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA EN 10/05/2017, NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑÍA.

BOGOTÁ D.C. A LOS 10 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2017

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855600 FAX: 2851220
BOGOTÁ D.C.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES 13-08-2013-1317-P-06-CU-13C-2



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

Afiliados



HOJA No. 1

No. POLIZA NB-100047322	No. ANEXO 5	No. CERTIFICADO 70516036
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas del 26/10/2015	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas del 19/07/2022	
FECHA EXPEDICION 18/08/2016		
SUC. EXPEDIDORA BOGOTA	DIRECCION CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1	TELEFONO 6113304

TOMADOR CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT 900.567.304-2
DIRECCION CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO 3208268514
ASEGURADO PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT 830.055.897-7
DIRECCION CLL 67 # 7 - 37	TELEFONO 3485400
BENEFICIARIOPATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT 830.055.897-7
DIRECCION CLL 67 # 7 - 37	TELEFONO 3485400

OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN OTROSI NO. 4 AL CONTRATO SE AMPLIA DE LA POLIZA EN REFERENCIA

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.PAF-JU02-G02DC-2015, CUYO OBJETO ES ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCHO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

NOTA 1: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ETAPA 1 SERA DE TRES AÑOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1.
NOTA 2: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	26/10/2015 - 18/05/2017	\$ 115.531.300,20
PRESTACIONES SOCIALES	26/10/2015 - 18/11/2019	\$ 38.510.433,40
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2016 - 18/11/2019	\$ 115.531.300,20

ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	19/11/2016 - 19/01/2018	\$ 3.020.294.983,50
PRESTACIONES SOCIALES	19/11/2016 - 19/07/2020	\$ 1.006.764.994,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/07/2017 - 19/07/2022	\$ 3.020.294.983,50

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/05/2017	115.531.300,20	75.776,00
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/01/2018	3.020.294.983,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/11/2019	38.510.433,40	25.259,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2020	1.006.764.994,50	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/03/2017	115.531.300,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2022	3.020.294.983,50	0,00
TOTAL ASEGURADO			7,316,927,995.30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
MULTIRIESGOS DE COLO	AGENCIAS	100.00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER
COASEGURADORES	% PARTICIPACION	

PRIMA BRUTA	\$ 101,034.00
DESCUENTOS	
PRIMA NETA	\$ 101,034.00
OTROS	\$ 0.00
IVA	\$ 16,166.00
TOTAL A PAGAR	\$ 117,200.00

CONVENIO DE PAGODIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/08/2016

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERINTENDENCIA)

Puedes consultar tu póliza en www.segurosmundial.com.co

[Firma]

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855600 FAX: 2851220
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEADORES



- ASEGURADO -

[Firma]
TOMADOR

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
13-08-2013-1317-P-06-CU-13C-2

Afiliados

CAMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Aseguradoras
Panamerican Surety Association

HOJA No. 1



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

No. POLIZA NB-100047322	No. ANEXO 5
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 19/07/2022
FECHA EXPEDICION 18/08/2016	
SUC. EXPEDIDORA BOGOTA	

No. CERTIFICADO 70516036

DIRECCION CALLE 33 NO.68-24 PISO 1

TELEFONO 6113304

TOMADOR	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CLL 67 # 7 - 37	TELEFONO	3485400
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CLL 67 # 7 - 37	TELEFONO	3485400

OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN OTROSI NO. 4 AL CONTRATO SE AMPLIA DE LA POLIZA EN REFERENCIA

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. PAF-JU02-G02DC-2015, CUYO OBJETO ES ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCHO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

NOTA 1: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ETAPA 1 SERA DE TRES AÑOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1.

NOTA 2: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	26/10/2015 - 18/05/2017	\$ 115.531.300,20
PRESTACIONES SOCIALES	26/10/2015 - 18/11/2019	\$ 38.510.433,40
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2016 - 18/11/2019	\$ 115.531.300,20
ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	19/11/2016 - 19/01/2018	\$ 3.020.294.983,50
PRESTACIONES SOCIALES	19/11/2016 - 19/07/2020	\$ 1.006.764.994,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/07/2017 - 19/07/2022	\$ 3.020.294.983,50

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/05/2017	115.531.300,20	75.776,00
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/01/2018	3.020.294.983,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/11/2019	38.510.433,40	25.259,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2020	1.006.764.994,50	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/03/2017	115.531.300,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2022	3.020.294.983,50	0,00
TOTAL ASEGURADO			7,316,927,995.30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
MULTIRIESGOS DE COLO	AGENCIAS	100.00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER
COASEGURADORES	% PARTICIPACION	

PRIMA BRUTA	\$ 101,034.00
DESCUENTOS	
PRIMA NETA	\$ 101,034.00
OTROS	\$ 0,00
IVA	\$ 16,166.00
TOTAL A PAGAR	\$ 117,200.00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO: Fecha de Pago: 18/08/2016

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERFINANCIERA)

Puedes consultar tu póliza en www.segurosmundial.com.co

[Firma]

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2655609 FAX: 2651220

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEODRES



- TOMADOR - AFIANZADO -

[Firma]
TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

13-08-2013-1317-P-06-CU-13C-2



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

Afiliados

PASA BAPF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

HOJA No. 1

No. POLIZA NB-100047322	No. ANEXO 5	No. CERTIFICADO 70516036
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas del 26/10/2015	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas del 19/07/2022	
FECHA EXPEDICION 18/08/2016		
SUC. EXPEDIDORA BOGOTA	DIRECCION CALLE 33 NO.58-24 PISO 1	TELEFONO 6113304

TOMADOR	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CLL 67 # 7 - 37	TELEFONO	3485400
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CLL 67 # 7 - 37	TELEFONO	3485400

OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN OTROSI NO. 4 AL CONTRATO SE AMPLIA DE LA POLIZA EN REFERENCIA

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. PAF-JU02-602DC-2015, CUYO OBJETO ES ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

NOTA 1: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ETAPA 1 SERA DE TRES AÑOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1.

NOTA 2: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	26/10/2015 - 18/05/2017	\$ 115.531.300,20
PRESTACIONES SOCIALES	26/10/2015 - 18/11/2019	\$ 38.510.433,40
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2016 - 18/11/2019	\$ 115.531.300,20

ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	19/11/2016 - 19/01/2018	\$ 3.020.294.983,50
PRESTACIONES SOCIALES	19/11/2016 - 19/07/2020	\$ 1.006.764.994,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/07/2017 - 19/07/2022	\$ 3.020.294.983,50

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/05/2017	115.531.300,20	75.776,00
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/01/2018	3.020.294.983,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/11/2019	38.510.433,40	25.259,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2020	1.006.764.994,50	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/03/2017	115.531.300,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2022	3.020.294.983,50	0,00
TOTAL ASEGURADO			7.316.927.995,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
MULTIRIESGOS DE COLO	AGENCIAS	100,00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER
COASEGURADORES	% PARTICIPACION	

PRIMA BRUTA	\$	101.034,00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	\$	101.034,00
OTROS	\$	0,00
IVA	\$	16.166,00
TOTAL A PAGAR	\$	117.200,00

CONVENIO DE PAGODIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/08/2016

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERINTENDENCIA)

Puedes consultar tu póliza en www.segurosmondial.com.co

[Firma]

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 2 Y 3
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851220

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES



- INTERMEDIARIO -

[Firma]
TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
13-08-2013-1317-P-06-CU-13C-2

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASAPAF
Asociación Panamericana de Finanzas
Panamerican Surety Association

HOJA No. 1



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

No. POLIZA NB-100047322	No. ANEXO 5	No. CERTIFICADO 70516036
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	
00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 19/07/2022	
FECHA EXPEDICION	18/08/2016	
SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA	DIRECCION CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1
		TELEFONO 6113304

TOMADOR	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CLL 67 # 7 - 37	TELEFONO	3485400
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CLL 67 # 7 - 37	TELEFONO	3485400

OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN OTROSI NO. 4 AL CONTRATO SE AMPLIA DE LA POLIZA EN REFERENCIA
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. PAF-JU02-G02DC-2015, CUYO OBJETO ES ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

NOTA 1: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ETAPA 1 SERA DE TRES AÑOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1.

NOTA 2: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	26/10/2015 - 18/05/2017	\$ 115.531.300,20
PRESTACIONES SOCIALES	26/10/2015 - 18/11/2019	\$ 38.510.433,40
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2016 - 18/11/2019	\$ 115.531.300,20
ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	19/11/2016 - 19/01/2018	\$ 3.020.294.983,50
PRESTACIONES SOCIALES	19/11/2016 - 19/07/2020	\$ 1.006.764.994,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD	19/07/2017 - 19/07/2022	\$ 3.020.294.983,50
DE LA OBRA		

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/05/2017	115.531.300,20	75,776.00
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/01/2018	3,020,294,983.50	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/11/2019	38,510,433.40	25,259.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2020	1,006,764,994.50	0.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/03/2017	115,531,300.20	0.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2022	3,020,294,983.50	0.00
TOTAL ASEGURADO			7,316,927,995.30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
MULTIRIESGOS DE COLO	AGENCIAS	100.00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER
COASEGURADORES	% PARTICIPACION	

PRIMA BRUTA	\$	101,034.00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	\$	101,034.00
OTROS	\$	0.00
IVA	\$	16,166.00
TOTAL A PAGAR	\$	117,200.00

CONVENIO DE PAGODIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/08/2016

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERFINANCIERA)

Puedes consultar tu póliza en www.segurosmondial.com.co

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855600 FAX: 2851229

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

ASEGURADO -



TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

13-08-2013-1317-P-06-CU-13C-2



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

Afiliados

PASA APF
Asociación Panamericana de Trazas
Parametric Surety Association

HOJA No. 1

No. POLIZA NB-100047322	No. ANEXO 5	No. CERTIFICADO 70516036
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas del 26/10/2015	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas del 19/07/2022	
FECHA EXPEDICION 18/08/2016		
SUC. EXPEDIDORA BOGOTA	DIRECCION CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1	TELEFONO 6113304

TOMADOR	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CLL 67 # 7 - 37	TELEFONO	3485400
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CLL 67 # 7 - 37	TELEFONO	3485400

OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN OTROSI NO. 4 AL CONTRATO SE AMPLIA DE LA POLIZA EN REFERENCIA
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. PAF-JU02-G02DC-2015, CUYO OBJETO ES ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

NOTA 1: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ETAPA 1 SERA DE TRES AÑOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1.

NOTA 2: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	26/10/2015 - 18/05/2017	\$ 115.531.300,20
PRESTACIONES SOCIALES	26/10/2015 - 18/11/2019	\$ 38.510.433,40
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2016 - 18/11/2019	\$ 115.531.300,20
ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	19/11/2016 - 19/01/2018	\$ 3.020.294.983,50
PRESTACIONES SOCIALES	19/11/2016 - 19/07/2020	\$ 1.006.764.994,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/07/2017 - 19/07/2022	\$ 3.020.294.983,50

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/05/2017	115.531.300,20	75.776,00
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/01/2018	3.020.294.983,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/11/2019	38.510.433,40	25.259,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2020	1.006.764.994,50	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/03/2017	115.531.300,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2022	3.020.294.983,50	0,00

TOTAL ASEGURADO 7,316,927,995.30

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
MULTIRIESGOS DE COLO	AGENCIAS	100.00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER
COASEGURADORES	% PARTICIPACION	

PRIMA BRUTA	\$	101,034.00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	\$	101,034.00
OTROS	\$	0,00
IVA	\$	16,166.00
TOTAL A PAGAR	\$	117,200.00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/08/2016

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERINTENDENCIA)

Puedes consultar tu póliza en www.segurosmondial.com.co

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2655600 FAX: 2651220
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDEORES



- TOMADOR - AFIANZADO -

[Signature]
TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
13-08-2013-1317-P-06-CU-13C-2

Afiliados



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA & APF
Asociación Panamericana de Finanzas
Parametrizan Society Association

HOJA No. 1



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

No. POLIZA NB-100047322	No. ANEXO 5	No. CERTIFICADO 70516036
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas del 26/10/2015	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas del 19/07/2022	
FECHA EXPEDICION 18/08/2016		
SUC. EXPEDIDORA BOGOTA	DIRECCION CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1	TELEFONO 6113304

TOMADOR	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CLL 67 # 7 - 37	TELEFONO	3485400
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	NIT	830.055.897-7
DIRECCION	CLL 67 # 7 - 37	TELEFONO	3485400

OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN OTROSI NO. 4 AL CONTRATO SE AMPLIA DE LA POLIZA EN REFERENCIA

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. PAF-JU02-G02DC-2015, CUYO OBJETO ES ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

NOTA 1: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ETAPA 1 SERA DE TRES AÑOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA ETAPA 1.

NOTA 2: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	26/10/2015 - 18/05/2017	\$ 115.531.300,20
PRESTACIONES SOCIALES	26/10/2015 - 18/11/2019	\$ 38.510.433,40
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2016 - 18/11/2019	\$ 115.531.300,20
ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	19/11/2016 - 19/01/2018	\$ 3.020.294.983,50
PRESTACIONES SOCIALES	19/11/2016 - 19/07/2020	\$ 1.006.764.994,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/07/2017 - 19/07/2022	\$ 3.020.294.983,50

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/05/2017	115.531.300,20	75.776,00
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/01/2018	3.020.294.983,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/11/2019	38.510.433,40	25.259,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2020	1.006.764.994,50	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 18/03/2017	115.531.300,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 19/11/2016	24:00 Horas del 19/07/2022	3.020.294.983,50	0,00

TOTAL ASEGURADO 7.316.927.995,30

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
MULTIRIESGOS DE COLO	AGENCIAS	100,00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER
COASEGURADORES	% PARTICIPACION	

PRIMA BRUTA	\$	101.034,00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	\$	101.034,00
OTROS	\$	0,00
IVA	\$	16.166,00
TOTAL A PAGAR	\$	117.200,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/08/2016

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERINTENDENCIA)

Puedes consultar tu póliza en www.seguros-mundial.com.co

[Firma]

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855600 FAX: 2851220

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES



- INTERMEDIARIO -

TOMADOR

ISBN 0018-1297



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
09-04-2012-1317-P-06-RCE-01C-3

Afiliados



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASAPAF
Asociación Panamericana de Planos
Panamerican Surety Association

HOJA No. 1

No. POLIZA NB-100005275	No. ANEXO 3
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
00:00 Horas del 26/10/2015	24:00 Horas del 19/11/2017
FECHA EXPEDICION 17/08/2016	
SUC. EXPEDIDORA BOGOTÁ	

No. CERTIFICADO 70515758

DIRECCION CALLE 33 NO.68-24 PISO 1

TELEFONO 6113304

TOMADOR	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
ASEGURADO	CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA	NIT	900.567.304-2
DIRECCION	CARRERA 11 B 96 03 OF 504	TELEFONO	3208268514
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	NIT	
DIRECCION		TELEFONO	

OBJETO DEL CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. PAF-JU02-602DC-2015, CUYO OBJETO ES ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCHO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS
VIGENCIA 26/10/2015 - 18/03/2017 VALOR ASEGURADO \$ 115.531.300,20.
ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA
VIGENCIA 26/09/2015- 19/11/2017 VALOR ASEGURADO \$ 3.020.294.983,50.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLE
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 4.00 SMLV

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN OTROSI NO.3 AL CONTRATO SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA POLIZA EN REFERENCIA

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO SE MODIFICAN

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BASICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA POLIZA (CONTRATISTA) HASTA UN MÁXIMO DEL 20% DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO-

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	1,567,913,142.00	3,135,826,283.70	3,135,826,283.70	3,670,205.00

VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE LAS 00:00 Horas del 26/10/2015 HASTA LAS 24:00 Horas del 19/11/2017 TOTAL ASEGURADO 3,135,826,283.70

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
MULTIRIESGOS DE COLO	AGENCIAS	100.00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER
COASEGURADORES		% PARTICIPACION

PRIMA BRUTA	\$	3,670,205.00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	\$	3,670,205.00
OTROS	\$	0.00
IVA	\$	587,233.00
TOTAL A PAGAR	\$	4,257,438.00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/08/2016

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 025 DE JUNIO DE 2009 SUPERINTENDENCIA).

Puedes consultar tu póliza en www.segurosmundial.com.co

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855600 FAX: 2851220

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES



- TOMADOR - AFIANZADO -

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

La COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTENIDA EN LA POLIZA NB-100047322, CUYO AFIANZADO ES: CONSTRUCCIONES RUBAU S.A SUCURSAL COLOMBIA Y ASEGURADO O BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA EN 18/08/2016, NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACIÓN UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑÍA.

BOGOTÁ, D.C. A LOS 18 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851220
BOGOTÁ D.C.

CAPÍTULO III.

ASPECTO FINANCIERO

Balance Presupuestal

- Inicial
- Final

Inicial

ITEM	ÁREAS INICIALES				CONTRATO				BALANCE DE ÁREAS				ÁREAS FINALES		DIFERENCIA
	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PROPUESTO CONTRATISTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL				
						MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)						
10	Circulación cubiertas abiertas	m2	363,48	298,01	371,222	134.931.759	-	-	65,47	-	-24.303,902	298,01	110.827.867	-24.303.902	
NP	ESCALERA ELEVADA	m2	-	20,70	1.240.741	-	-	20,70	-	25.683.339	-	20,70	25.683.339	25.683.339	
NP	ANDEN	m2	-	181,36	152.500	-	-	181,36	-	27.657.148	-	181,36	27.657.148	27.657.148	
NP	RAMPA ELEVADA	m2	-	102,58	683.500	-	-	102,58	-	70.113.430	-	102,58	70.113.430	70.113.430	
NP	CUARTO TECNICO	m2	-	34,24	1.157.138	-	-	34,24	-	39.620.403	-	34,24	39.620.403	39.620.403	
	ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA	m2	1.211,59	1.383,61		1.138.278.497	253,27	-81,25	-	303.538.988	-42.563.539	1.383,61	1.399.253.947	260.975.450	
	ÁREA CONSTRUIDA DESCUBIERTA	m2	654,00	283,94		165.678.315	283,94	-654,00	-	97.770.578	-165.678.315	283,94	97.770.578	-67.907.737	
	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS					1.303.956.812	537,21	-735,25	-	401.309.566	-208.241.854	1.687,55	1.497.024.525	193.067.713	
ALFONSO LOPEZ PUIMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO 1 piso															
1	Aulas de clase	m2	260,12	210,78	1.157.138	300.994.719	-	-	49,34	-	57.093.106	210,78	243.901.533	-57.093.186	
2	Baileños sanitarios	m2	30,42	38,75	1.178.513	35.850.350	-	-	8,33	-	9.817.009	38,75	45.667.359	9.817.009	
3	Comedor y cocina (Aula Múltiple)	m2	173,60	274,60	1.240.741	215.992.724	101,00	-	-	125.314.891	-	274,60	340.707.615	126.314.091	
4	Áreas recreativas y canchas deportivas	m2	540,00	-	246.179	132.936.538	-	-	540,00	-	-	-	-	-132.936.538	
5	Rampas	m2	94,00	65,34	287.209	26.997.606	-	-	28,66	-	-9.231.389	65,34	18.766.208	-8.231.398	
6	Escaleras	m2	20,00	-	287.209	5.744.171	-	-	20,00	-	-5.744.171	-	-	-5.744.171	
7	Circulación cubiertas abiertas	m2	198,92	100,25	371.222	73.843.473	-	-	98,67	-	-36.628.471	100,25	37.215.002	-36.628.471	
-	ANDEN	m2	-	84,95	152.500	-	-	84,95	-	12.954.875	-	84,95	12.954.875	12.954.875	
	ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA	m2	663,06	624,38		626.081.266	108,33	-148,01	-	135.131.900	-93.721.657	824,38	687.491.509	41.410.243	
	ÁREA CONSTRUIDA DESCUBIERTA	m2	654,00	150,29		165.678.315	84,95	-588,66	-	12.954.875	-146.912.107	150,29	31.721.083	-133.957.232	
	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS					791.759.581	194,28	-736,67	-	148.086.775	-240.633.784	774,67	699.217.592	-82.546.989	
IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE 2 pisos															
1	Aulas de clase	m2	195,09	45,07	1.164.465	227.176.506	-	-	150,02	-	-174.593.061	45,07	52.482.444	-174.693.062	
2	Baileños sanitarios	m2	22,81	72,97	1.179.118	26.095.606	50,16	-	-	59.144.568	-	72,97	86.040.254	59.144.568	
3	Laboratorios Física Química	m2	87,50	199,33	1.231.167	107.727.148	111,83	-	-	137.679.741	-	199,33	245.406.889	137.679.741	
4	Biblioteca escolar	m2	90,30	116,11	1.182.511	104.974.733	25,81	-	-	30.004.406	-	116,11	134.979.138	30.004.405	
5	Comedor y cocina (Aula Múltiple)	m2	173,60	259,45	1.240.741	215.392.642	85,95	-	-	105.517.617	-	259,45	321.910.259	105.517.617	
6	Áreas recreativas y canchas deportivas	m2	540,00	-	132.036.538	-	-	540,00	-	-	-	-	-	-132.036.538	
7	Circulación cubiertas abiertas	m2	243,99	134,00	374.483	91.370.098	-	-	108,99	-	-41.189.381	134,00	50.180.717	-41.189.381	
NP	ANDEN	m2	-	101,46	152.500	-	-	101,46	-	15.472.650	-	101,46	15.472.650	15.472.650	
	ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA	m2	813,29	826,93		773.535.813	273,65	-260,01	-	333.346.332	-215.882.442	826,93	890.999.701	117.463.888	
	ÁREA CONSTRUIDA DESCUBIERTA	m2	540,00	101,46		132.936.538	101,46	-540,00	-	15.472.650	-132.936.538	101,46	15.472.650	-117.463.888	
	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS					906.472.351	375,11	-800,01	-	348.818.982	-348.818.980	928,39	906.472.351	-	
IE LA MERCED SEDE PRINCIPAL 3 pisos															
	Aulas de clase	m2	875,00	849,80	1.149.479	1.005.994.516	-	-	25,20	-	-28.966.882	849,80	976.827.634	-28.966.882	
	Baileños sanitarios	m2	106,47	94,87	1.170.713	124.645.861	-	-	11,80	-	-13.580.276	94,87	111.055.595	-13.580.276	
	Laboratorios Física Química	m2	105,00	-	1.223.019	128.417.042	-	-	105,00	-	-128.417.042	-	-	-128.417.042	
	Laboratorios Tecnología	m2	87,50	-	1.223.019	107.014.201	-	-	87,50	-	-107.014.201	-	-	-107.014.201	
	Biblioteca escolar	m2	135,80	239,48	1.149.479	156.099.309	103,68	-	-	118.178.029	-	239,48	275.277.338	118.178.029	
	Comedor y cocina (Aula Múltiple)	m2	231,70	459,45	1.232.529	285.577.069	227,75	-	-	280.708.578	-	459,45	566.286.647	280.708.578	
	Zona Administrativa	m2	60,90	-	1.149.479	70.003.288	-	-	60,90	-	-70.003.288	-	-	-70.003.288	
	Áreas recreativas y canchas deportivas	m2	540,00	-	130.945.223	-	-	540,00	-	-130.945.223	-	-	-	-130.945.223	
	Rampas	m2	40,00	-	285.308	11.417.308	-	-	40,00	-	-11.417.308	-	-	-11.417.308	
	Escaleras	m2	188,00	-	53.637.846	-	-	188,00	-	-53.637.846	-	-	-	-53.637.846	
	Circulación cubiertas abiertas	m2	696,73	296,59	366.145	251.442.604	-	-	390,14	-	-142.847.768	296,59	108.594.906	-142.847.750	
NP	ESCALERAS ELEVADAS	m2	-	44,64	1.240.741	-	-	44,64	-	55.386.678	-	44,64	55.386.678	55.386.678	
NP	RAMPAS ELEVADAS	m2	-	204,59	683.500	-	-	204,59	-	139.837.265	-	204,59	139.837.265	139.837.265	
NP	ANDEN	m2	-	153,67	152.500	-	-	153,67	-	23.435.205	-	153,67	23.435.205	23.435.205	
NP	CUARTO TECNICO	m2	-	59,40	1.149.479	-	-	59,40	-	68.279.079	-	59,40	68.279.079	68.279.079	
	ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA	m2	2.289,10	2.044,23		2.128.993.960	435,47	-680,34	-	523.552.364	-490.829.467	2.044,23	2.161.716.867	32.722.907	
	ÁREA CONSTRUIDA DESCUBIERTA	m2	768,00	368,26		195.995.377	368,26	-768,00	-	163.272.470	-195.995.377	368,26	163.272.470	-32.722.907	
	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS					2.324.998.337	793,73	-1.448,34	-	686.824.834	-686.824.834	402,49	2.324.998.337	-	

ITEM	AREAS INICIALES				CONTRATO				BALANCE DE AREAS				AREAS FINALES		DIFERENCIA
	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PROPUESTO CONTRATISTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL				
						MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)						
IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI 1 piso															
1	Aulas de clase	m2	520.24	1,746.781	903,745.278		170.40	-	-297,651.460	349.84	611,093.818	-297,651.460			
2	Baterías sanitarias	m2	60.78	1,779.047	108,130.484		5.21	-	-9,268.836	55.57	98,861.648	-9,268.836			
3	Áreas recreativas y canchas deportivas	m2	940.00	368.508	198,994.277		540.00	-	-198,994.277			-198,994.277			
4	Rampas	m2	94.00	433.561	40,754.776		94.00	-	-40,754.776			-40,754.776			
5	Escaleras	m2	20.00	433.561	8,671.229		20.00	-	-8,671.229			-8,671.229			
6	Circulación cubiertas abiertas	m2	249.01	556.404	138,550.123			4.14	2,303.512	244.87	136,246.611	-2,303.512			
NP	Comedor y cocina (Aula Multiple)	m2		1,779.047		305.49			543,476.839	305.49	543,476.839	543,476.839			
NP	ANDEN	m2		152.500		92.90				92.90	14,167.250	14,167.250			
	AREA CONSTRUIDA CUBIERTA	m2	1,370.03	955.77	1,354,420.162	305.49	-719.75		-508,218.084	955.77	1,389,678.916	35,258.754			
	AREA CONSTRUIDA DESCUBIERTA	m2	114.00	92.90	49,426.004	92.90	-114.00		-49,426.005	92.90	14,167.250	-35,258.754			
	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS				1,403,846.166	398.39	833.75		-557,644.089	1,048.67	1,403,846.166				
	VALOR TOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS				7,835,986.644										
	VALOR TOTAL OBRAS COSTOS INDIRECTOS				2,231,683.301				-8,180.397.191		7,835,986.644				
	ADMINISTRACIÓN	22%			1,723,912.662				-2,324,081.121		2,231,683.301				
	IMPREVISTOS	3%			235,079.000				-1,795,287.382		1,723,912.662				
	UTILIDAD	3%			235,078.999				-244,811.916		235,078.999				
	IVA 18% SOBRE UTILIDAD	16%			37,612.640				-244,811.916		235,078.999				
	VALOR TOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				10,067,649.945				-30,169.907		37,612.640				
										</					

DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS

Valor Negativo Indica (VALOR) por debajo del contrato valor del inicial
Valor Positivo Indica (VALOR) por encima del contrato valor del inicial

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre:

REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Idreosa, 24 de marzo de 2017

FECHA DE ELABORACIÓN

Vo.Bo. SUPERVISOR:

Firma:


Nombre:

Nota:


Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto (esto hacia referencia a valores y no a cantidades).

Original FINDETER
Copias: Contratista, Interventor

LA MERCED

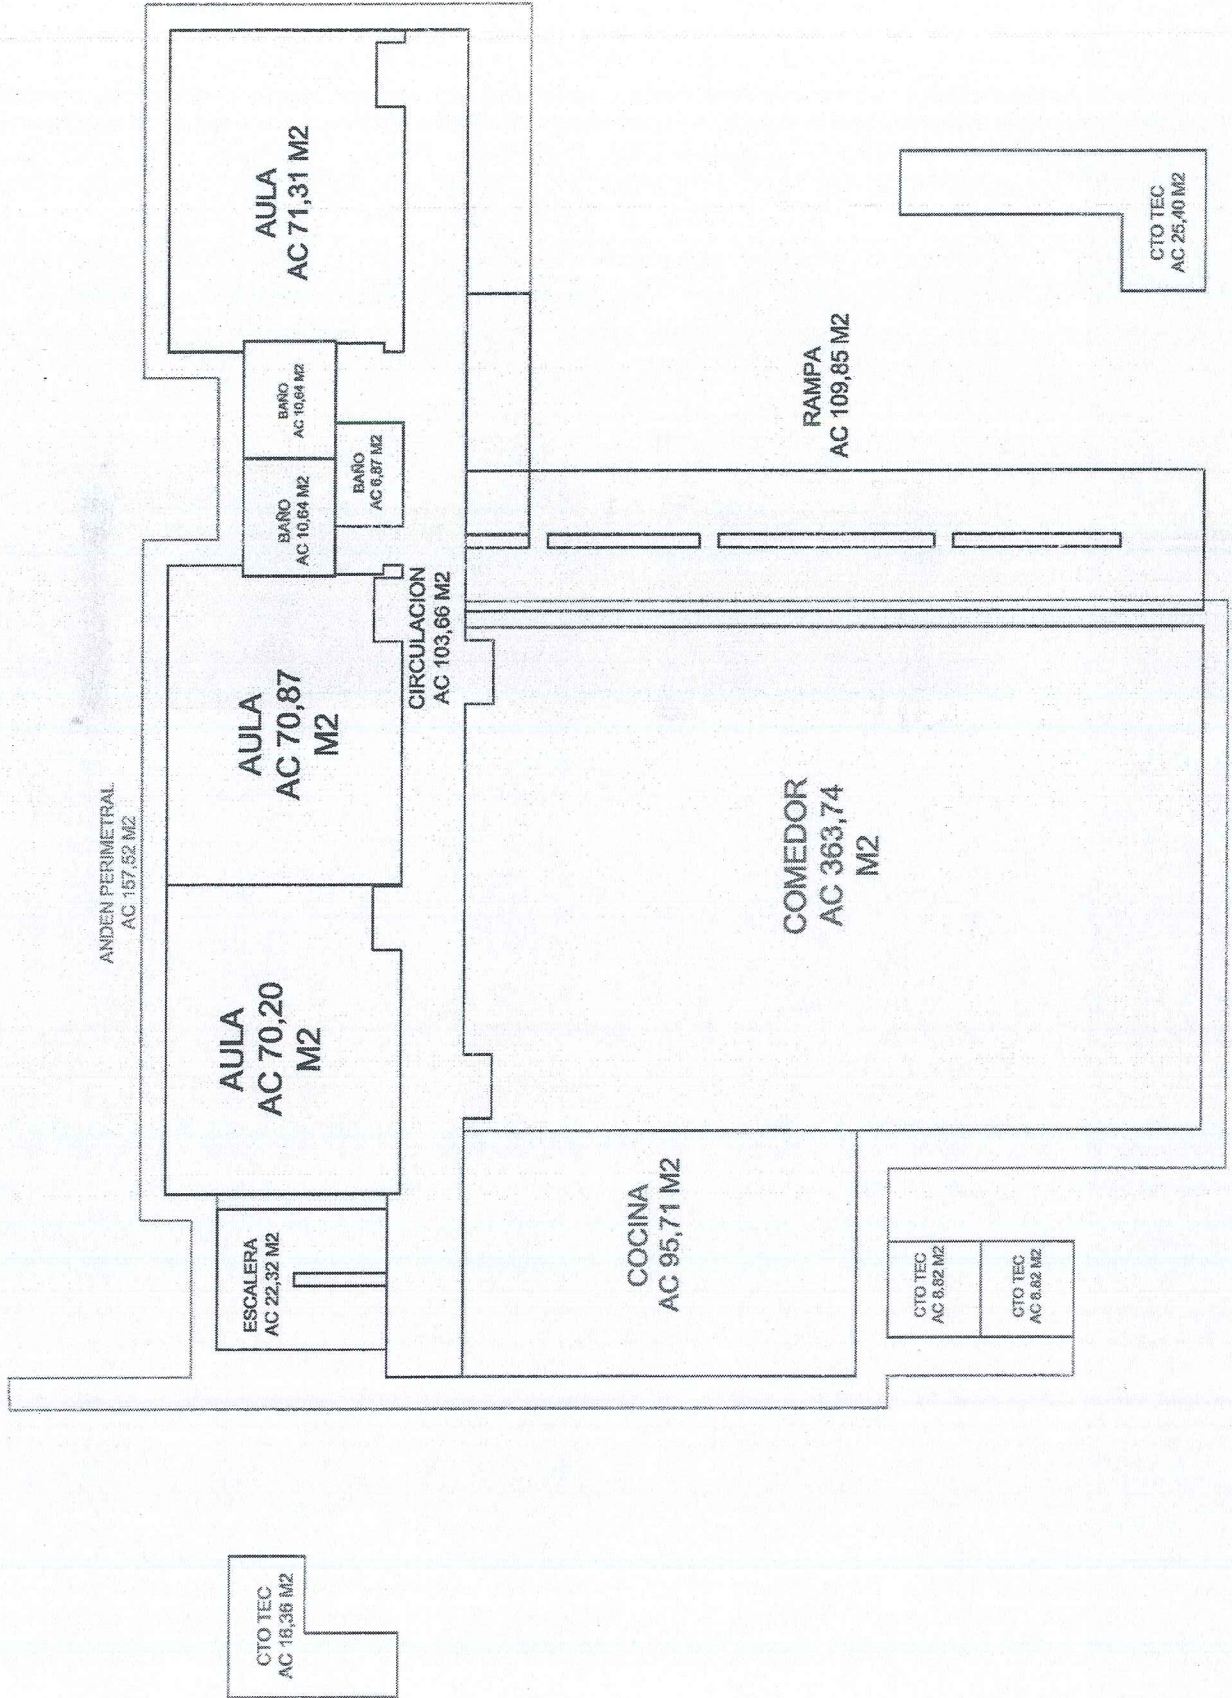


LA MERCED

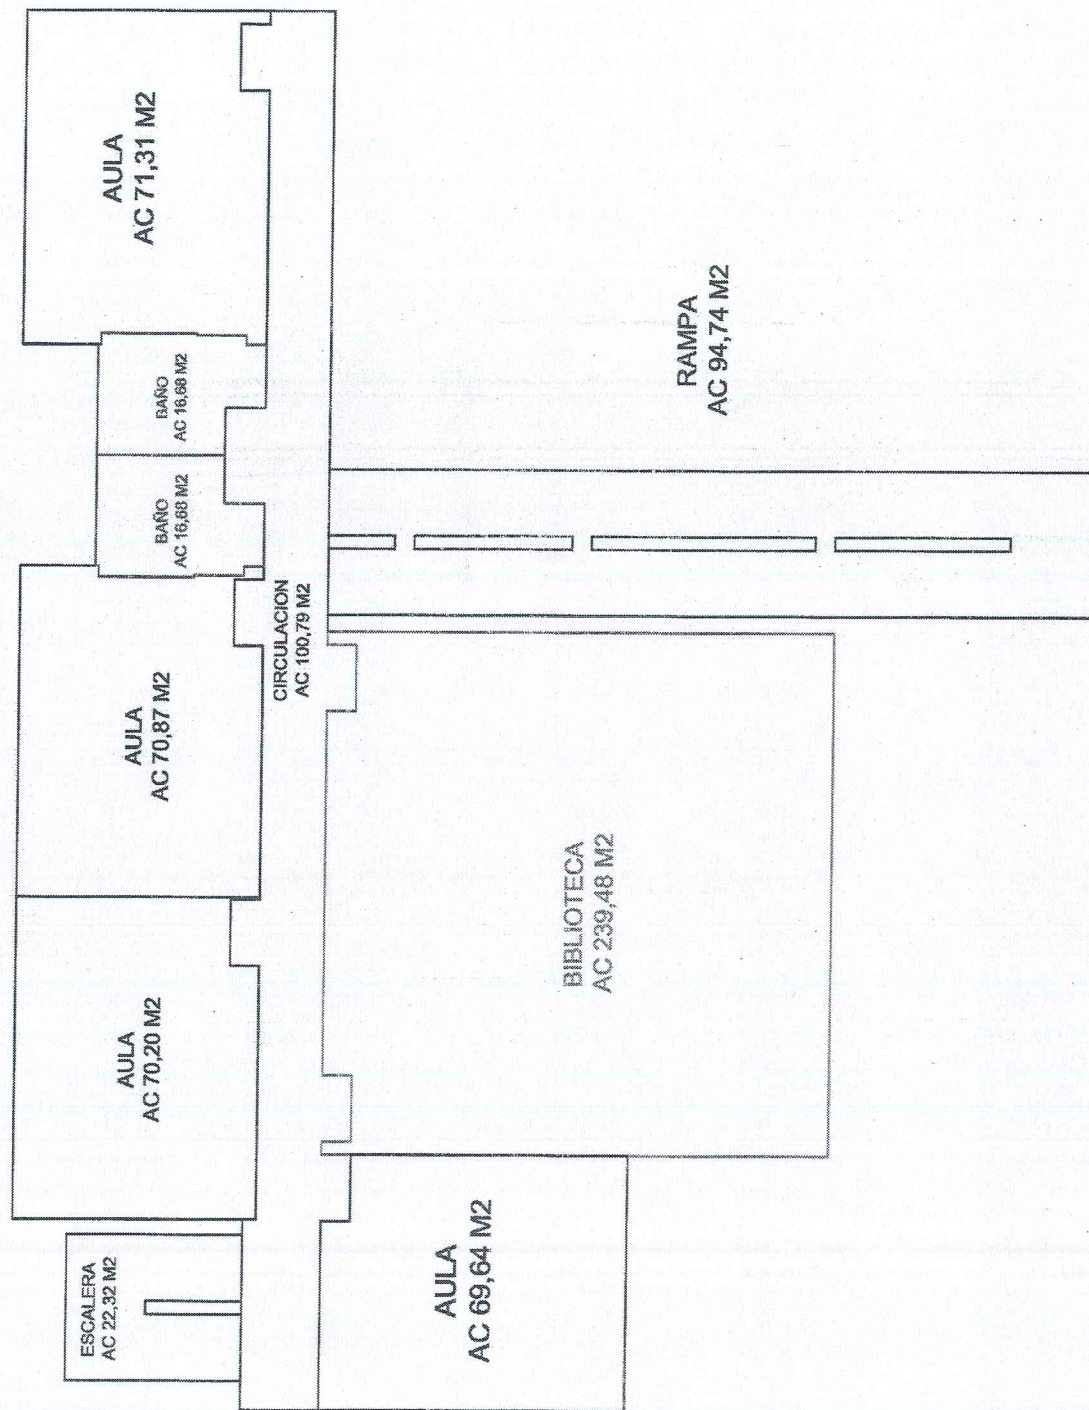


AS

LA MERCED

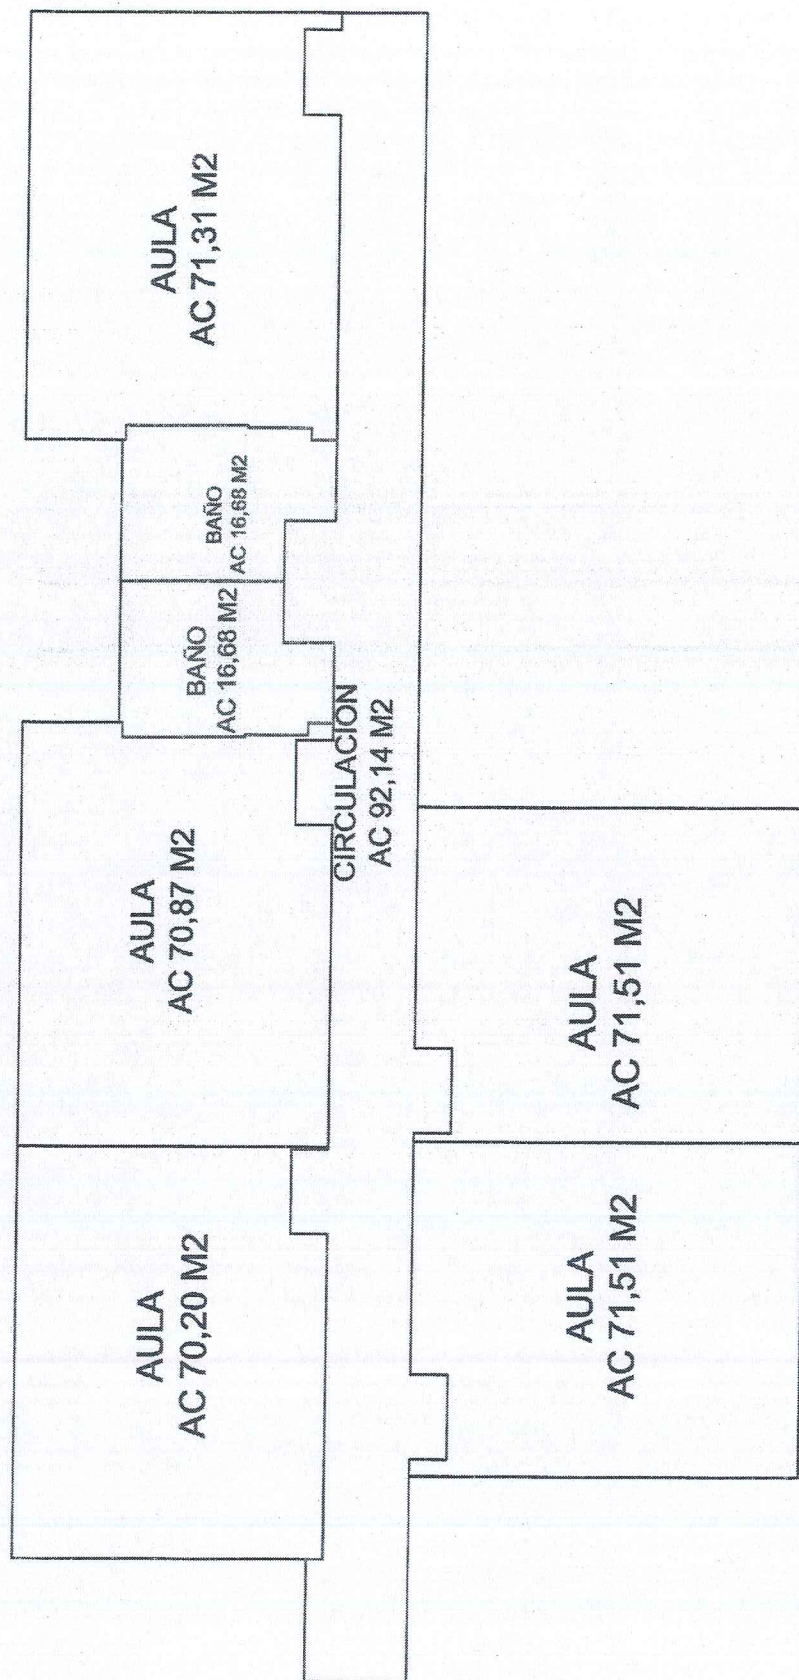

AS


JULIO CESAR ARCE

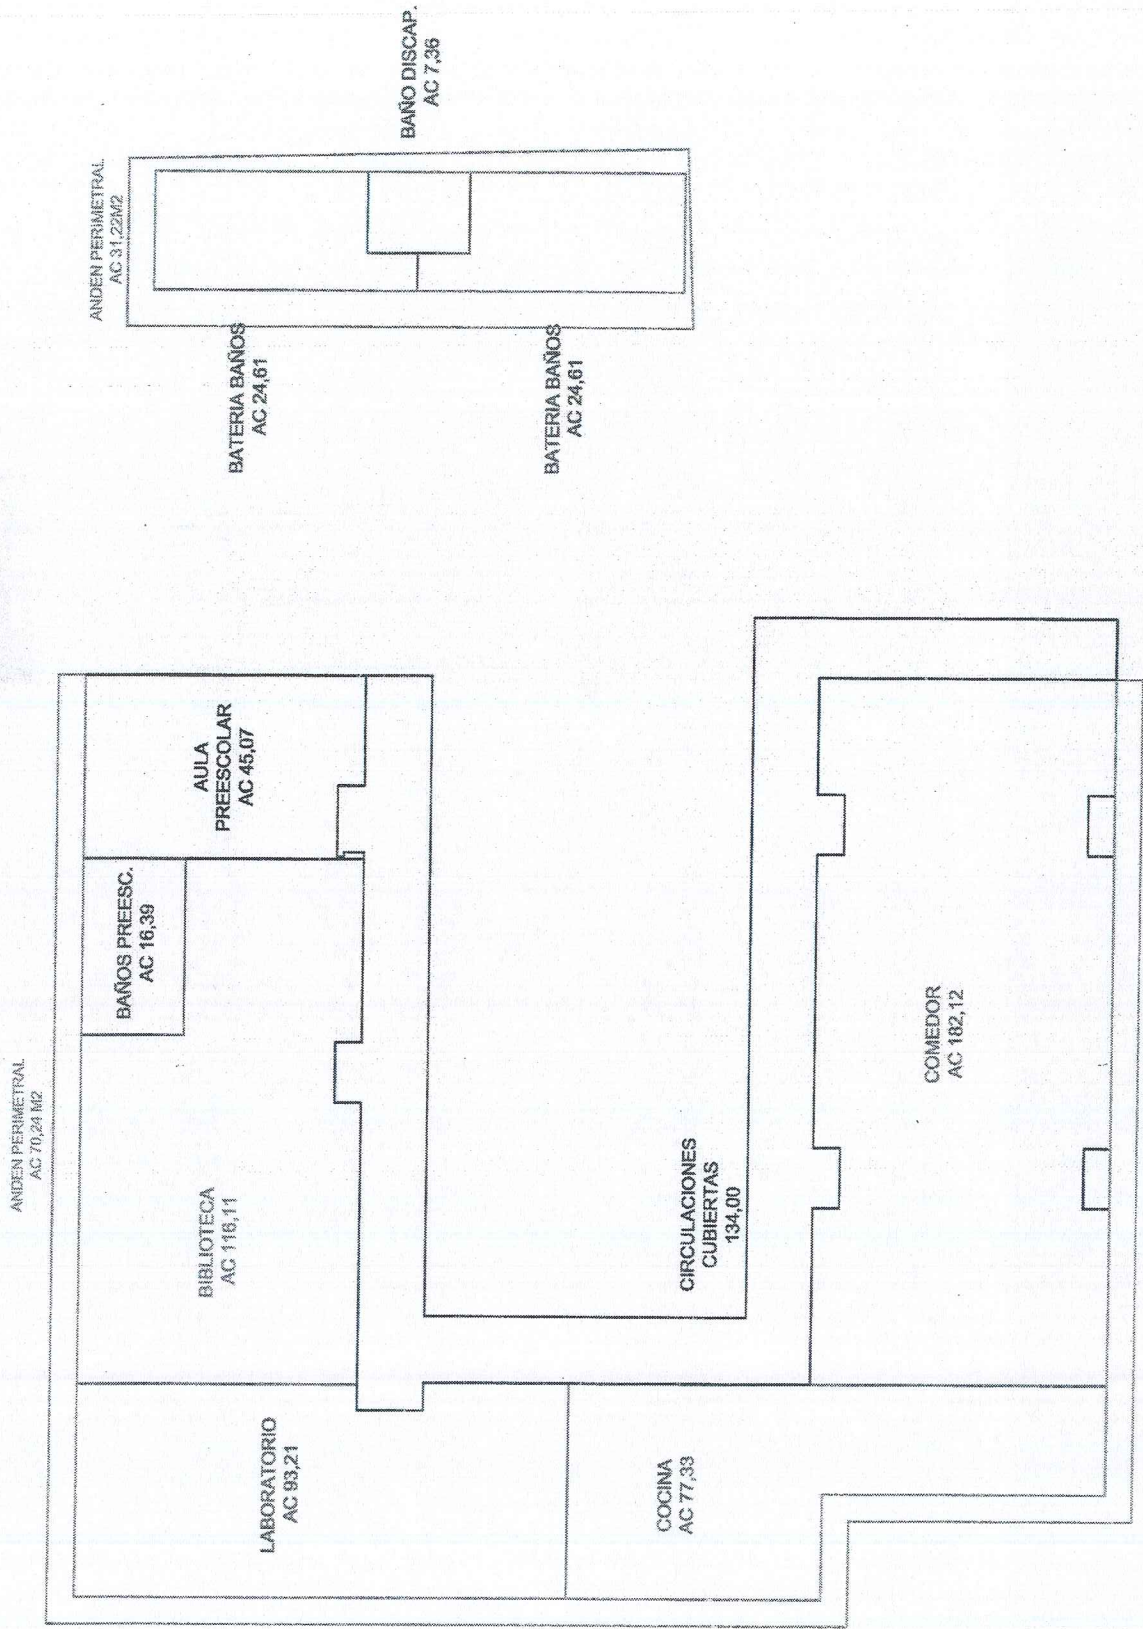

Handwritten signature or initials.

MERCEDES ABREGO

ANDEN PERIMETRAL
AC 42,54 M2

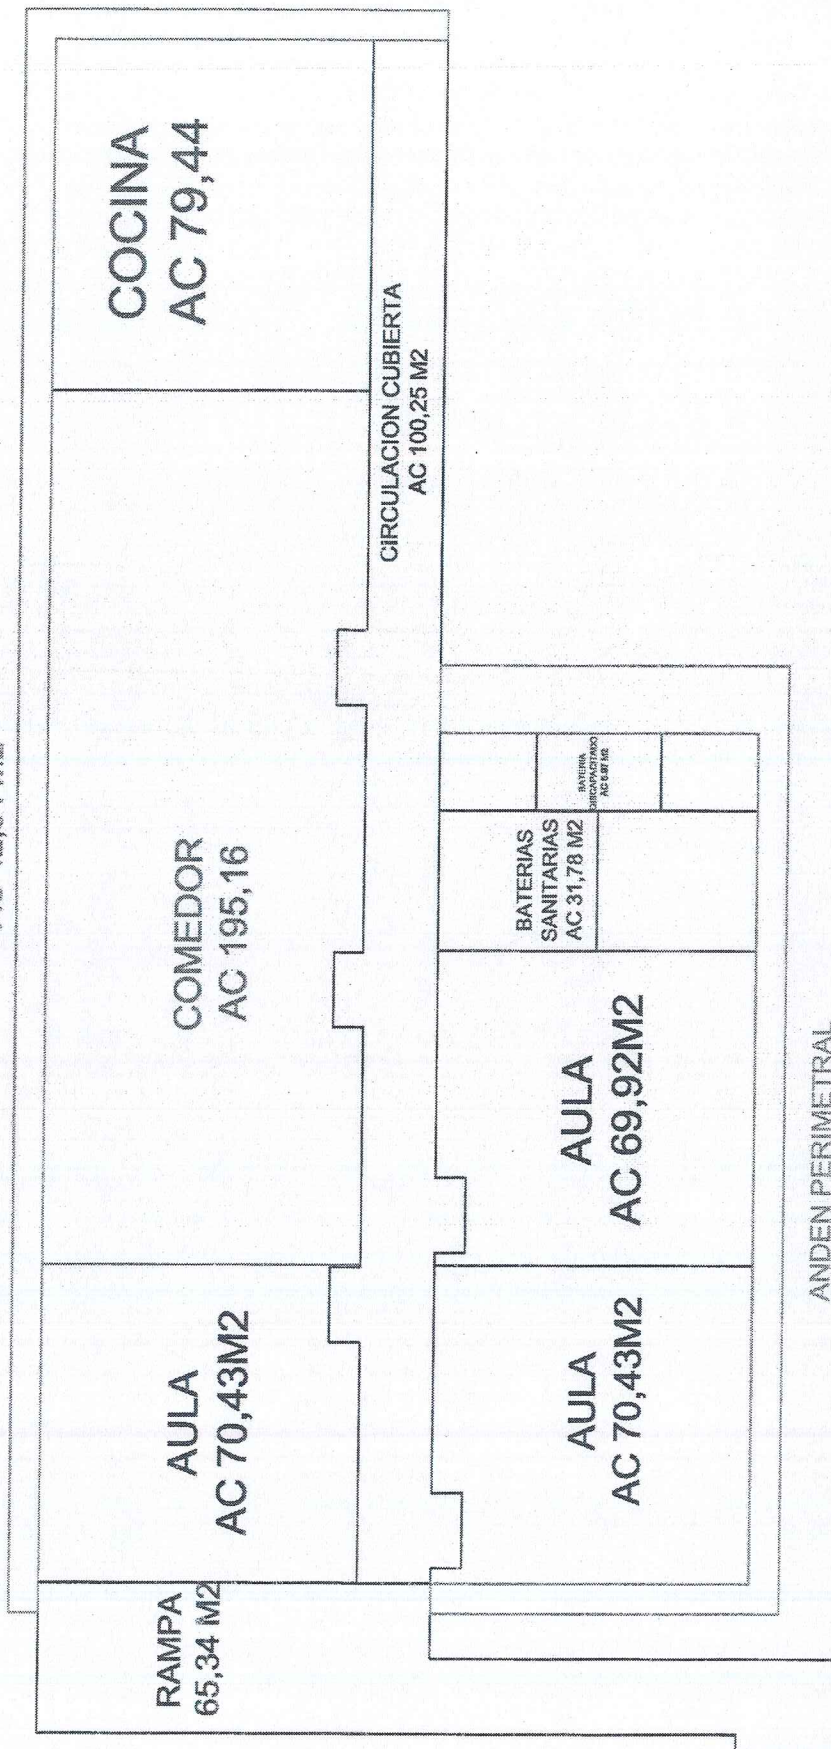


ANDEN PERIMETRAL
AC 42,41 M2


Handwritten signature or initials.

MARIA INMACULADA


ANDEN PERIMETRAL
AC 33,52 M2

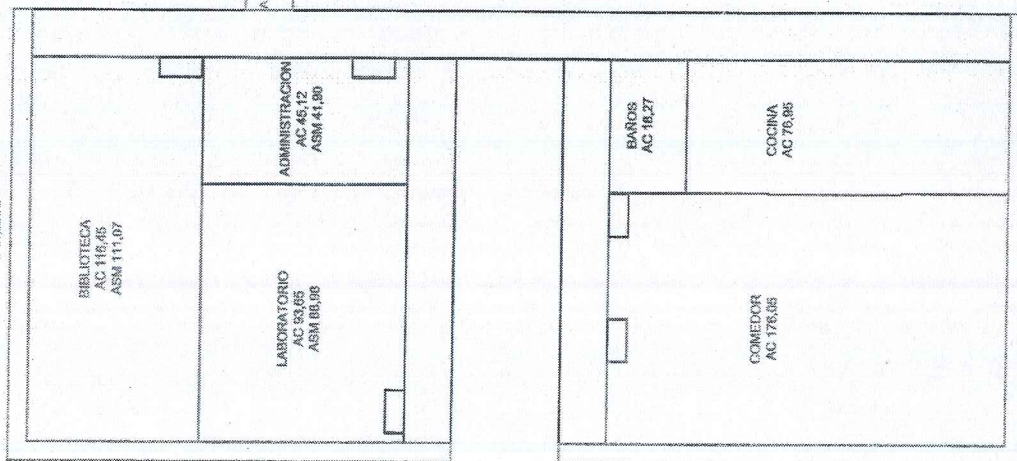

ANDEN PERIMETRAL
AC 39,28 M2



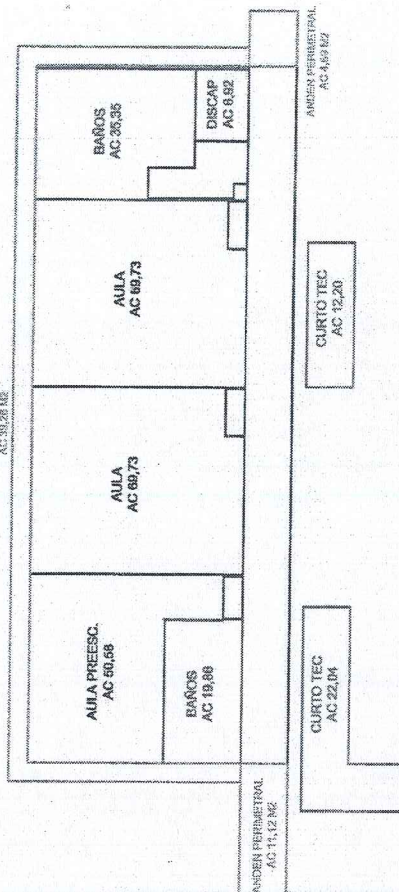


CIRCULACIONES CUBIERTAS
226,53

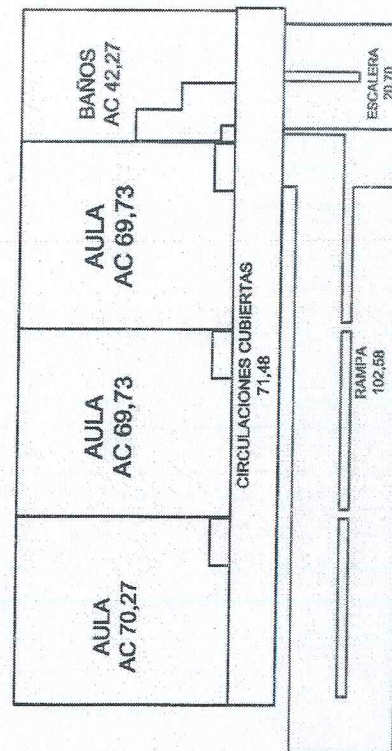




Handwritten signature or initials.

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '8' with an arrow pointing right.

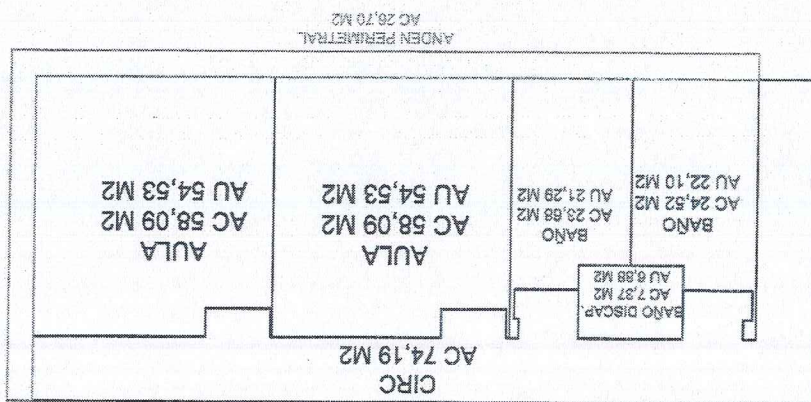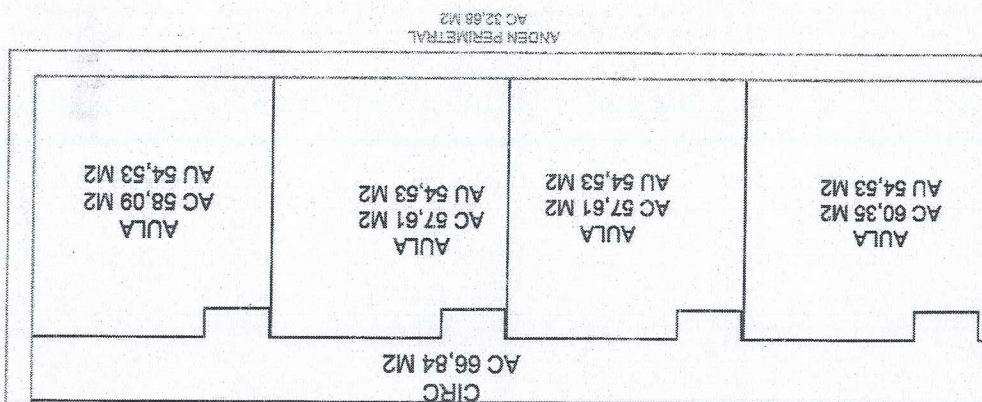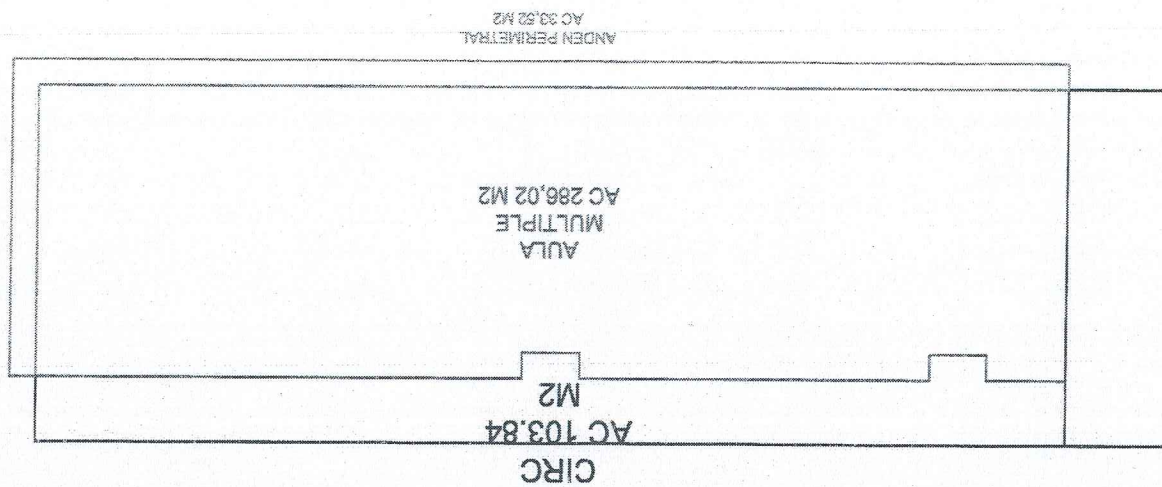


NUON

SIXTO MARIA ROJAS

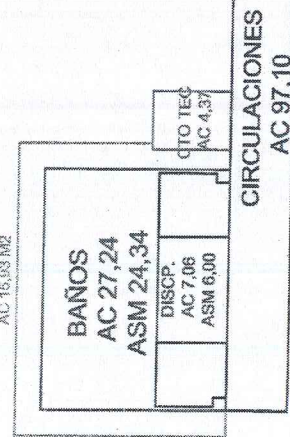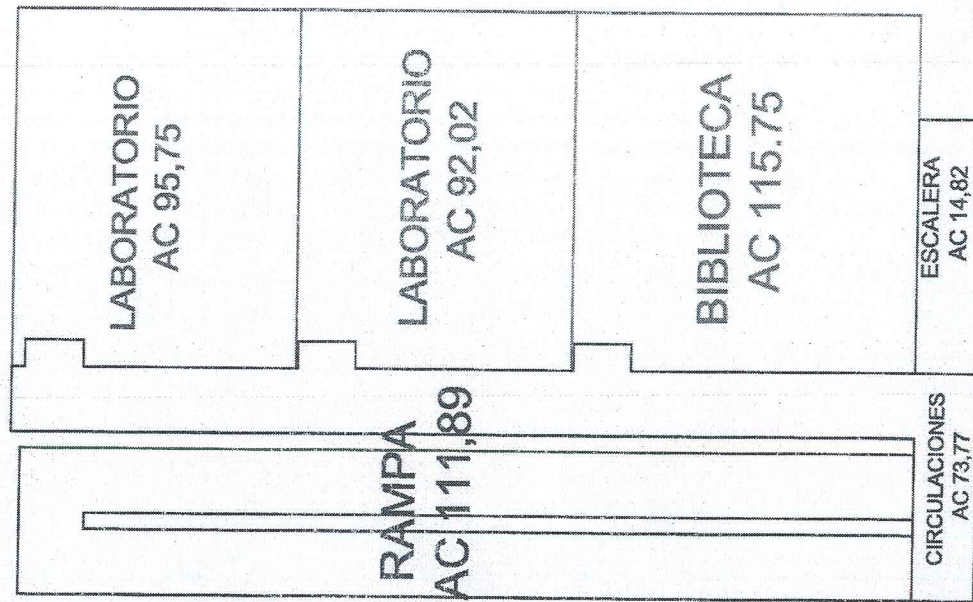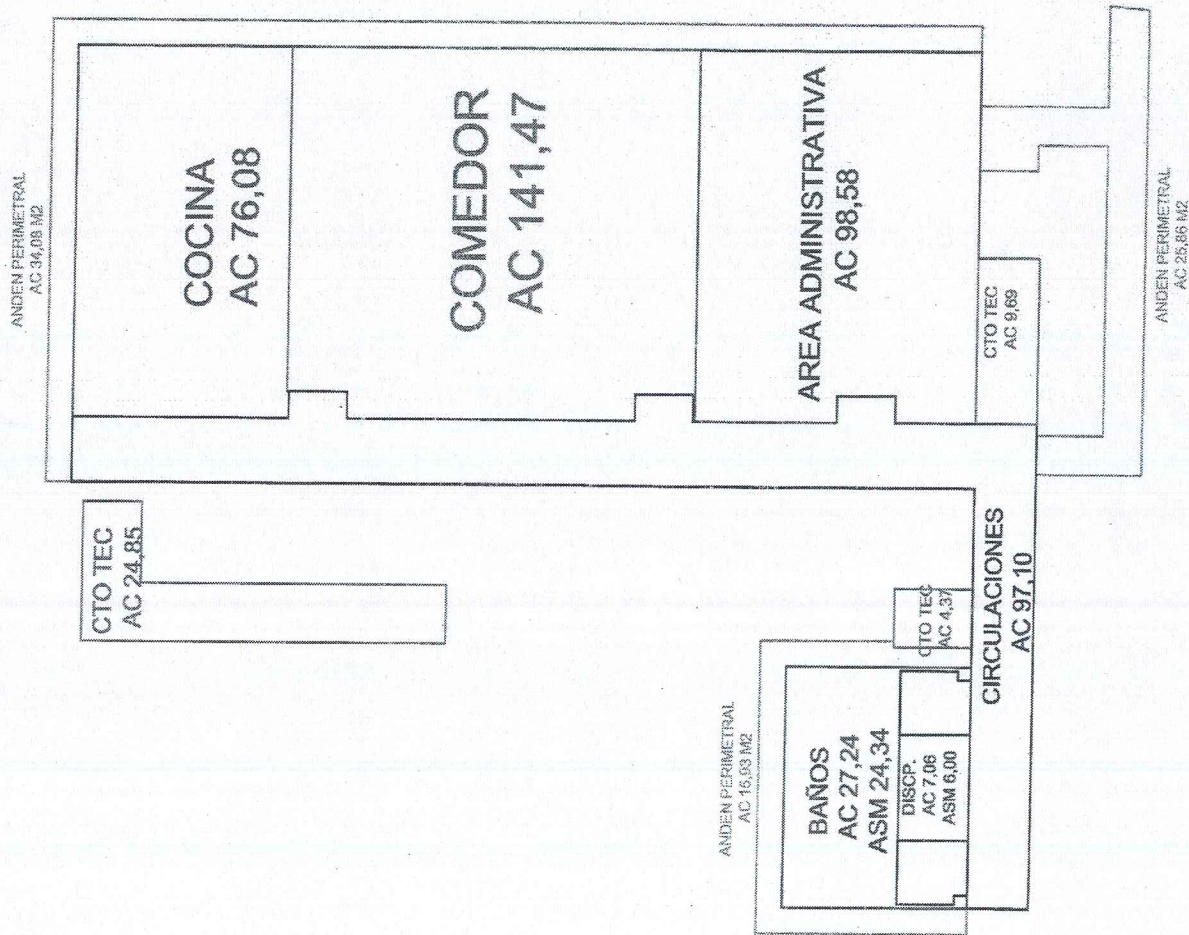

ANDEN PERIMETRAL
AC 16,93 M2

Final



CONSORCIO ECO-DAIMCO
NIT. 900.888.894-3

G02-FINDETER-2015-595

Bogotá D.C. 02 de febrero de 2018

Señores

CONSTRUCCIONES RUBAU COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA

Contralista de Obra

Atn. JULIO PEREZ REDONDO

Representante Legal

Carrera 11B No. 96-03 Of. 504

Edificio Zürich

Teléfono: 57 (1) 7550979

Bogotá D.C.



Referencia: Contrato PAF-JU02-G02DC-2015. ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

Asunto: Balance Presupuestal por Áreas Contrato.


Respetados Señores:

En cumplimiento de nuestras obligaciones y atendiendo la solicitud de Findeter en reunión llevada a cabo el 02 de febrero de 2018 frente a la entrega de la documentación tendiente a la liquidación del Contrato de Obra No. PAF-JU02-G02DC-2015, se remite el Balance Presupuestal del Contrato, el cual, contempla la Etapa 1 de Estudios y Diseños y las áreas ejecutadas en total funcionamiento para la Etapa II de ejecución de las obras.

Lo anterior, para revisión y firma del Representante Legal de CONSTRUCCIONES RUBAU SUCURSAL COLOMBIA.

Cordialmente,

ING. JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TÉCNICO
CONSORCIO ECO-DAIMCO



Anexos:	Lo enunciado
Elaboro:	Carolina Melgarejo Márquez
Vo. Bo.	Arq. Paola Pérez Álvarez - Coordinadora de proyectos
Vo. Bo.	Ing. O. Pertuz / C. Espitia - Representante Legal
Copia 1.	Archivo - Convocatoria N° PAF-JU13-G02IDC-2015
Copia 2.	FINDETER, FINANCIERA DEL DESARROLLO. Atn. Arq. Gloria Rodríguez. Supervisor de Contrato. Calle 103 No. 19-20 Pbx: (1) 6230311/6230388

presente Accla, GUSTAVO SANCHEZ JIMENEZ Rep. Legal del Contratista y CA

condiciones que se detallan a continuación:

[illegible]

AREAS INICIALES				BALANCE DE AREAS 1-03-2017						AREAS FINALES CONTRATADAS PARA LA ETAPA II DE EJECUCION DE OBRAS		DIFERENCIA	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ETAPA I II DEL CONTRATO PAF-JU09-G01DC-2015	VALOR TOTAL EJECUTADO ETAPA I II DEL CONTRATO PAF-JU09-G01DC-2015	
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PROPUESTO CONTRASTA	CONTRATO		CANTIDADES			VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL			
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MEJORES (-)	MAYORES (+)	MEJORES (-)						
4	Biblioteca escolar	90,30	116,45	1.157,138	104.463,555	26,15	-	30.293,157	-	116,45	134.748,712	30.293,157	0,00		
5	Comedor y cocina (Aula Multi- uso)	173,60	233,00	1.240,741	215.392,675	79,40	-	93.514,832	-	233,00	313.907,527	93.514,832	0,00		
6	Zona administrativa	60,90	45,12	1.157,138	70.469,700	-	15,78	-	-18.259,637	45,12	52.210,063	-18.259,637	0,00		
7	Áreas recreativas y canchas deportivas	540,00	-	246,179	132.936,538	-	540,00	-	-132.936,538	-	-	-132.936,538	-		
8	Rampas	94,00	-	281,209	26.597,695	-	94,00	-	-26.597,695	-	-	-26.597,695	-		
9	Escaleras	20,00	-	287,209	5.744,171	-	20,00	-	-5.744,171	-	-	-5.744,171	-		
10	Circulación cubiertas abiertas	363,48	238,01	371,222	134.931,759	-	65,47	-	-24.903,592	238,01	110.627,857	-24.303,902	0,00		
11P	ESCALERA ELEVADA	-	20,70	1.240,741	-	20,70	-	25.680,339	-	20,70	25.683,339	25.683,339	0,00		
11P	ANDÉN	-	181,36	152,500	-	181,36	-	27.657,148	-	181,36	27.657,148	27.657,148	0,00		
11P	RANPA ELEVADA	-	102,58	683,500	-	102,58	-	70.113,430	-	102,58	70.113,430	70.113,430	0,00		
11P	CUARTO TÉCNICO	-	34,24	1.157,138	-	34,24	-	39.620,403	-	34,24	39.620,403	39.620,403	0,00		
	ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA	1.211,59	1.333,61	-	1.138.278,497	253,27	-81,25	300.538,988	-42.563,539	1.383,61	1.399.253,947	260.975,450	0,00		
	ÁREA CONSTRUIDA DESCUBIERTA	654,00	233,94	-	165.678,315	233,94	-454,00	97.770,578	-165.678,315	233,94	97.770,578	-67.907,737	-		
	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS				1.303.956,812	537,21	-735,25	401.309,566	-208.341,854	1.667,55	1.497.024,525	-193.067,713	-		
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO 1 piso															
1	Áreas de clase	260,12	210,78	1.157,138	300.991,719	-	49,34	-	-57.090,186	210,78	243.901,533	-57.090,186	0,00		
2	Baterías sanitarias	30,42	38,75	1.178,513	35.650,350	8,33	-	45.817,009	-	38,75	45.867,359	9.817,009	0,00		
3	Comedor y cocina (Aula Multi- uso)	173,60	274,60	1.240,741	215.392,724	101,00	-	1.534,891	-	274,60	340.707,615	125.314,891	0,00		
4	Áreas recreativas y canchas deportivas	540,00	-	246,179	132.936,538	-	540,00	-	-132.936,538	-	-	-132.936,538	-		
5	Rampas	94,00	-	281,209	26.597,695	-	28,66	-	-8.231,358	65,34	10.766,208	-8.231,358	0,00		
6	Escaleras	20,00	-	287,209	5.744,171	-	20,00	-	-5.744,171	-	-	-5.744,171	-		
7	Circulación cubiertas abiertas	193,92	100,25	371,222	73.413,473	-	93,67	-	-36.628,471	100,25	37.215,002	-36.628,471	0,00		
8P	ANDÉN	-	84,95	152,500	-	84,95	-	12.954,075	-	84,95	12.954,075	12.954,075	0,00		
9P	ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA	643,05	624,38	-	628.081,255	109,33	-148,01	133.131,000	-93.721,657	624,38	667.491,599	-41.410,243	0,00		
	ÁREA CONSTRUIDA DESCUBIERTA	654,00	150,29	-	165.678,315	84,95	-498,66	17.354,075	-146.912,107	150,29	31.721,083	-133.957,232	-		
	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS				791.759,581	191,28	-756,67	146.346,775	-240.633,764	774,67	699.212,592	-92.546,939	-		
IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE 2 pisos															
1	Áreas de clase	195,09	45,07	1.164,465	227.175,506	-	150,02	-	-174.993,061	-	-	-174.993,062	-		
2	Baterías sanitarias	22,81	72,97	1.179,118	26.895,886	50,16	-	31.444,558	-	72,97	86.040,254	59.144,568	0,00		
3	Laboratorio Física, Química	87,50	109,33	1.231,167	107.727,148	111,83	-	13.579,741	-	109,33	245.406,889	137.679,741	0,00		
4	Biblioteca escolar	90,30	116,11	1.162,511	104.974,733	25,81	-	30.004,405	-	116,11	134.979,138	30.004,405	0,00		
5	Comedor y cocina (Aula Multi- uso)	173,60	299,45	1.240,741	215.392,642	83,85	-	108.517,617	-	299,45	321.910,259	106.517,617	0,00		
6	Áreas recreativas y canchas deportivas	540,00	-	246,179	132.936,538	-	540,00	-	-132.936,538	-	-	-132.936,538	-		
7	Circulación cubiertas abiertas	243,99	134,00	374,483	91.370,098	-	109,99	-	-41.189,381	134,00	50.180,717	-41.189,381	0,00		
8P	ANDÉN	-	101,46	152,500	-	101,46	-	1.472,650	-	101,46	15.472,650	15.472,650	0,00		
9P	ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA	813,29	826,93	-	773.535,813	273,65	-260,01	333.446,332	-215.832,442	826,93	890.999,701	117.463,888	0,00		
	ÁREA CONSTRUIDA DESCUBIERTA	540,00	101,46	-	132.936,538	101,46	-540,00	172.650	-132.936,538	101,46	15.472,650	-117.463,888	-		
	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS				906.472,351	375,11	-800,01	333.18,932	-348.818,930	928,39	906.472,351	-	-		
IE LA MERCED SEDE PRINCIPAL 3 pisos															
1	Áreas de clase	875,00	849,89	1.149,179	1.005.794,516	-	25,20	-	-28.956,882	849,89	976.827,634	-28.956,882	0,00		
2	Baterías sanitarias	106,47	94,87	1.170,713	124.645,881	-	11,60	-	-13.580,276	94,87	111.065,585	-13.580,276	0,00		
3	Laboratorio Física, Química	105,00	-	1.223,019	128.417,042	-	105,00	-	-128.417,042	-	-	-128.417,042	-		
4	Laboratorio Tecnología	87,50	-	1.223,019	107.014,201	-	87,50	-	-107.014,201	-	-	-107.014,201	-		
5	Biblioteca escolar	135,80	239,48	1.149,179	156.090,309	103,68	-	119.178,029	-	239,48	275.277,338	119.178,029	0,00		
	Comedor y cocina (Aula Multi- uso)	231,70	459,45	1.232,929	285.577,059	227,75	-	280.708,578	-	459,45	566.285,647	280.708,578	0,00		

AREAS INICIALES				BALANCE DE AREAS 14-03-2017				AREAS FINALES CONTRATADAS PARA LA ETAPA II DE EJECUCIÓN DE OBRAS		DIFERENCIA	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ETAPA II DEL CONTRATO PAF-1009-0020C-2015	VALOR TOTAL EJECUTADO ETAPA II DEL CONTRATO PAF-1009-0020C-2015
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PROYECTO CONTRATISTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		VALORES				
						MAYORES (+)	MEYORES (-)	MAYORES (+)	MEYORES (-)			
SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS												
1	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE INUQUI 1 piso											
1	Aulas de clase	520.21	349.84	1,746.781	908,745.278	-	170.40	-	-297,651.462	-	349.84	811,093.918
2	Balnearios esclusivos	60.78	55.57	1,779.047	108,130.484	-	5.21	-	-9,798.835	-	55.57	99,881.548
3	Áreas recreativas y canchas deportivas	540.00	-	368.509	198,994.277	-	540.00	-	-193,934.277	-	-	-198,994.277
4	Rampas	94.00	-	433.561	40,754.776	-	94.00	-	-40,754.776	-	-	-40,754.776
5	Escaleras	20.00	-	433.561	8,671.229	-	20.00	-	-8,671.229	-	-	-8,671.229
6	Circulación cubiertas abiertas	241.01	244.87	556.404	138,550.123	-	4.14	-	-2,303.512	-	244.87	136,246.611
HP	Comedero y cocina (Aula Moquea)	-	305.49	1,779.047	-	305.49	-	-	-	-	305.49	543,476.839
HP	ANDEH	-	92.90	152.500	-	92.90	-	-	-	-	92.90	14,167.250
	AREA CONSTRUIDA CUBIERTA	1,370.03	955.77		1,354,420.162	305.49	-719.75	541,476.839	-508,218.084	14,167.250	543,476.839	0.00
	AREA CONSTRUIDA DESCUBIERTA	114.00	92.90		49,426.004	92.90	-114.00	14,167.250	-49,426.005	35,298.754	14,167.250	0.00
	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS				1,403,846.166	398.39	833.75	551,144.089	-557,644.089	1,403,846.166	-	-
SUBTOTAL OBRAS COSTOS INDIRECTOS												
	VALOR TOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS				7,835,966.644			8,160,397.191	-8,160,397.191	7,835,966.644		385,164.334
	VALOR TOTAL OBRAS COSTOS INDIRECTOS				2,231,883.301			2,332,181.121	-2,332,181.121	2,231,883.301		-
	ADMINISTRACIÓN	22%			1,723,912.662			1,795,372.382	-1,795,287.382	1,723,912.662		-
	IMPREVISTOS	3%			235,079.000			244,811.916	-244,811.916	235,079.000		-
	UTILIDAD	3%			235,078.999			244,811.916	-244,811.916	235,078.999		-
	IVA 18% SOBRE UTILIDAD	18%			37,612.640			37,189.907	-37,189.907	37,612.640		-
	VALOR TOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				10,067,649.945			10,484,473.312	-10,484,473.312	10,067,649.945		385,164.334

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre:


REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

FECHA DE ELABORACION

Vo.Bo. SUPERVISOR:

Firma:

Nombre:

EL INTERVENIENTO
Firma: 
Nombre: REP. LEGAL INTERVENIENTO O DIRECTOR DE INTERVENIENTORIA

Balance de porcentaje ejecutados por Hitos

**I.E ECOTURISTICA LITORAL
PACIFICO DE NUQUI**

CONTRATO PAF JU02-G02DC-2016 INSTITUCION EDUCATIVA ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI								
ITEM	DESCRIPCION (Contenido de los ítems y productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACION AL VALOR DEL CAPÍTULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPÍTULO CON RELACION AL ÍTEM	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL
1	HITO: PRELIMINARES				\$ 35.450.000,00	86,91%	2,53%	2,19%
1.00	PRELIMINARES							
1.1	Limpieza y descompactación de terreno	m2	1.020,00	100,00%	25,90%	25,90%		
1.2	Localización y Replanteo de terreno	m2	1.020,00	100,00%	13,75%	13,75%		
1.3	Campañetas de obra	m2	30,00	100,00%	42,91%	42,91%		
1.4	Caseta Sanitaria	mes	8,00	0,00%	13,09%	0,00%		
2	HITO: EXCAVACION CIMENTACION Y RELLENOS				\$ 445.011.971,75	0,00%	31,70%	0,00%
2.00	EXCAVACIONES							
2.1	Excavación Manual de Vigas de cimentación < 1.5 m	m3	137,55	0,00%	0,61%	0,00%		
2.2	Excavación Manual de Dados (Excavación Manual de Zapatas de cimentación < 1.5 m)	m3	524,47	0,00%	3,92%	0,00%		
2.3	Excavación para nivelación de terreno	m3	424,44	0,00%	2,77%	0,00%		
2.4	Excavación para pilotes	m3	137,55	0,00%	0,61%	0,00%		
2.4	Retiro material de Excavación	m3	1.020,72	0,00%	5,84%	0,00%		
2.00	MEDICAMENTOS PARA CIMENTACION							
2.3	Malpaso en material seleccionado bajo placa contrapisa	m3	343,12	0,00%	3,60%	0,00%		
4.0	CIMENTACION SUPERFICIAL							
4.2	Concreto de Dados (Concreto de Zapatas)	m3	11,43	0,00%	1,22%	0,00%		
4.3	Concreto de Vigas de Cimentación	m3	63,53	0,00%	7,36%	0,00%		
4.4	Concreto de Placa Contrapisa	m2	1.039,53	0,00%	12,22%	0,00%		
4.4a	Concreto pilotes	m3	234,68	0,00%	33,45%	0,00%		
4.5	Acera de Dados (Acera de Zapatas)	kg	1.670,62	0,00%	1,16%	0,00%		
4.6	Acera de Vigas de Cimentación	kg	9.418,07	0,00%	8,70%	0,00%		
4.7	Malpaso en concreto Placa de Contrapisa	kg	4.434,53	0,00%	3,13%	0,00%		
4.8a	Acera pilotes	kg	25.152,65	0,00%	17,80%	0,00%		
5	HITO: ESTRUCTURA APORTICADA				\$ 138.707.330,04	0,00%	9,88%	0,00%
5.00	ESTRUCTURA							
5.1	Concreto Columnas	m3	55,71	0,00%	14,31%	0,00%		
5.3	Concreto Vigas de Cubierta	m3	54,64	0,00%	29,66%	0,00%		
5.4	Concreto Placa Maciza en Cubierta	m2	193,73	0,00%	11,14%	0,00%		
5.5	Acero Columnas	kg	10.858,12	0,00%	24,79%	0,00%		
5.6	Acero Vigas de Cubierta	kg	7.064,10	0,00%	18,13%	0,00%		
5.0	Meta electrolítica Placa Maciza de Cubierta	kg	1.815,77	0,00%	2,80%	0,00%		
6	HITO: MUROS Y PINTURAS				\$ 127.039.228,73	0,00%	9,05%	0,00%
6.00	MAMPOSTERIA							
6.1	Muro en bloque de concreto Liso 12x16x30 color gris con Aditivo al exterior	m2	632,27	0,00%	38,93%	0,00%		
6.2	Muro en bloque en Arcilla No. 4 e-iforma	m2	310,27	0,00%	14,96%	0,00%		
6.5	Muro Celado En Bloque Liso De Concreto texturizado Color Gris Con Hidrorepelente Al Exterior	m	75,52	0,00%	4,50%	0,00%		
6.10	Columnetas en Concreto incluye refuerzos y anclajes	m	213,51	0,00%	4,40%	0,00%		
6.11	Dorsales muro en bloque de concreto incluye refuerzos y anclajes	m	333,60	0,00%	8,06%	0,00%		
6.13	Cinta de Remate Antipechos incluye refuerzos y anclajes	m	158,35	0,00%	2,00%	0,00%		
6.14	Dorsales en Concreto incluye refuerzos y anclajes	m	18,39	0,00%	0,31%	0,00%		
7.00	PAVIMENTOS							
7.1	Pavimento en concreto 1:4 Sobre Mampostería	m2	568,60	0,00%	13,42%	0,00%		
7.2	Pavimento en concreto 1:4 Impermeabilizado Sobre Mampostería	m2	141,64	0,00%	3,60%	0,00%		
8	HITO: PISOS ANDENES ENCHAPES Y ACABADOS				\$ 148.757.783,68	0,00%	10,60%	0,00%
8.00	ALISTADO DE PISO							
8.1	Afinado de Piso 1:4 e-iforma	m2	1.020,20	0,00%	13,14%	0,00%		
9.00	ENCHAPES DE PISO							
9.1	Piso en Cerámica Nacional 30x30cm Color Blanco Tráfico 4	m2	59,54	0,00%	1,69%	0,00%		
9.2	Piso en Tablita de Gres Sanara Formato 20 x 20cm o similar	m2	643,47	0,00%	23,66%	0,00%		
9.3	Malla Cera en Grisito Color Blanco	m	55,18	0,00%	0,42%	0,00%		
9.4	Zocalo De Gres Sanara 30 X 7.5 Cm O Similar similar	m	477,82	0,00%	8,51%	0,00%		
9.5	Enchape en Cerámica Nacional 30x30 para Muro Color Blanco con vin de Remate de Aluminio o Pastoso en Espigas Verticales	m2	68,55	0,00%	2,41%	0,00%		
10.00	PINTURAS							
10.1	Estuco y pintura vinilo lavable tipo 1 para interiores	m2	705,15	0,00%	9,19%	0,00%		
11.00	MESONES							
11.1	Módulo en Concreto acabado en Grisito Banco Fondo en obra incluye aplicación de bordes dilatadores y muestreo de apoyo enchapes de laminado conido	m	21,12	0,00%	1,51%	0,00%		
12	HITO: CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES				\$ 241.125.643,27	0,00%	17,18%	0,00%
12.00	CUBIERTA							
12.1	Teja Termocollada en fibra de carbono UPVC incluye estructura metálica, anticorrosivo y pintura	m2	694,97	0,00%	63,29%	0,00%		
12.2	Canal en Lámina Galvalume Cal 18	m	174,30	0,00%	6,18%	0,00%		
12.3	Plancho en Lámina Galvalume Cal 20	m	79,21	0,00%	1,51%	0,00%		
13.00	VENTANERIA							
13.1	Ventaneria de Fachada en Aluminio, cristal y película de seguridad 4 mm. Incluye marcos con alija	m2	209,00	0,00%	25,20%	0,00%		
14.00	PUERTAS							
14.1	Puerta en acero CP cal. 18, con panela, molde en cristal y película de seguridad 4 mm. Incluye anticorrosivo y remate	un	15,00	0,00%	8,84%	0,00%		
14.3	Puerta para sanitario en acero inoxidable cal 18	un	5,00	0,00%	1,88%	0,00%		
15.00	APARATOS Y ACCESORIOS							
15.1	Sanitario de tanque color blanco linea institucional tipo corona similar para discapacitados	un	1,00	0,00%	0,55%	0,00%		
15.2	Sanitario de tanque color blanco linea institucional tipo corona similar	un	5,00	0,00%	1,56%	0,00%		
15.3	Lavamanos de color color blanco linea institucional tipo corona similar para discapacitados incluye grifo	un	1,00	0,00%	0,25%	0,00%		
15.4	Grifo tipo push antirretroceso de pared linea institucional	un	12,00	0,00%	2,25%	0,00%		
15.5	Orinal mediano de color color blanco linea institucional	un	3,00	0,00%	0,72%	0,00%		
15.6	Juego de barras de apoyo para personas con movilidad reducida	un	2,00	0,00%	0,13%	0,00%		
15.10	Dispensador DE TOALLAS DE PAPEL EN ACCESO INOCUABLE	un	8,00	0,00%	0,79%	0,00%		
15.11	Dispensador de Jabón en acero inoxidable	un	3,00	0,00%	0,38%	0,00%		
16.00	ESPEJOS							
16.1	Espejo 4mm varios bloques y pulidos	m2	9,78	0,00%	0,58%	0,00%		

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 INSTITUCION EDUCATIVA ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI									
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítem y sub ítem contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	EJECUTADO ÍTEM	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACION AL VALOR DEL CAPÍTULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPÍTULO CON RELACION AL ÍTEM	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL	
17	HITO: REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				\$ 229.171.770,35	0,00%	16,32%	0,00%	
17.00	INSTALACIONES ELECTRICAS, DE VOZ Y DATOS								
17.1	Instalaciones Eléctricas, de voz y datos (Ver presupuesto Anexo A Anexo)	g	1,00	0,00%	48,68%	0,00%			
18.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RFO DE INCENDIO								
18.1	Instalaciones Hidrosanitarias, gas y refectorio incendio (Ver presupuesto Anexo A Anexo)	g	1,00	0,00%	51,31%	0,00%			
19	HITO: OBRAS EXTERIORES				\$ 29.858.604,76	0,00%	2,13%	0,00%	
19.00	UPPERVENIO								
19.1	Andén Perimetral en plaza de concreto reforzado de 2.000 psf	m2	111,68	0,00%	92,82%	0,00%			
19.2	Sanera de Abonos	un	10,00	0,00%	8,50%	0,00%			
20.00	IMPERMEABILIZACION								
20.1	Impermeabilización plaza de cubierta	m2	148,70	0,00%	2,61%	0,00%			
20.2	Impermeabilización Hidrólogo en Fachada	m2	452,19	0,00%	3,60%	0,00%			
21	HITO: ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS				\$ 8.723.833,15	0,00%	0,62%	0,00%	
21.00	ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS								
21.1	Acta de obra a 3 meses	m2	1.055,53	0,00%	63,56%	0,00%			
21.2	Carga y retiro de Escombros	m3	132,60	0,00%	36,52%	0,00%			
							100,00%	2,19%	

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 INSTITUCION EDUCATIVA ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI									
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítem o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO ÍTEM	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACION AL VALOR DEL CAPÍTULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPÍTULO CON RELACION AL HITO	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL /CONTEMPLADO PARA PAGO
1	HITO : PRELIMINARES			%	\$ 35.450.000,00	86,91%	2,53%	2,19%	1,72%
1,00	PRELIMINARES								
1.1	Limpieza y desapeste de Terreno	m2	1.020,00	100,00%		25,90%			
1.2	Localización y Replanteo de terreno	m2	1.020,00	100,00%		18,70%			
1.3	Campamento de obra	m2	30,30	100,00%		42,31%			
1.4	Cavata Sanitaria	mes	9,00	0,00%		13,09%			
2	HITO : EXCAVACION CIMENTACION Y RELLENOS			%	\$ 445.011.971,75	0,00%	31,70%	0,00%	0,00%
2,00	EXCAVACIONES								
2.1	Excavación Manual de Vigas de cimentación < 1.5 m	m3	107,58	0,00%		0,61%			
2.2	Excavación Manual de Dado (Excavación Manual de Zapatas de cimentación > 1.5 m)	m3	325,40	0,00%		3,00%			
2.3	Excavación para instalación de terreno	m3	484,44	0,00%		2,77%			
	Excavación para pilotes	m3	107,00	0,00%		0,81%			
2.4	Redir material de Excavación	m3	1.009,73	0,00%		5,84%			
3,00	MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION								
3.3	Mejoramiento en material seleccionado bajo placa contrapiso	m3	348,19	0,00%		3,80%			
4,00	CIMENTACION SUPERFICIAL								
4.2	Concreto de Dado (Concreto de Zapatas)	m3	11,48	0,00%		1,28%			
4.3	Concreto de Vigas de Cimentación	m3	62,08	0,00%		7,38%			
4.4	Concreto de Placa Contrapiso	m2	1.098,59	0,00%		12,22%			
4.4a	Concreto pilotes	m3	294,00	0,00%		33,45%			
4.5	Acero de Dado (Acero de Zapatas)	kg	1.870,82	0,00%		1,18%			
4.6	Acero de Vigas de Cimentación	kg	9.416,07	0,00%		6,70%			
4.7	Malla electrosoldada Placa de Contrapiso	kg	4.464,50	0,00%		3,18%			
4.8a	Acero pilotes	kg	25.152,88	0,00%		17,90%			
5	HITO : ESTRUCTURA APORTICADA			%	\$ 138.707.330,04	0,00%	9,88%	0,00%	0,00%
5,00	ESTRUCTURA								
5.1	Concreto Columnas	m3	38,71	0,00%		14,31%			
5.3	Concreto Vigas de Cubierta	m3	54,94	0,00%		29,68%			
5.4	Concreto Placa Maciza en Cubierta	m2	158,73	0,00%		11,14%			
5.5	Acero Columnas	kg	10.856,19	0,00%		24,79%			
5.8	Acero Vigas de Cubierta	kg	7.084,16	0,00%		16,13%			
5.9	Malla electrosoldada Placa Maciza de Cubierta	kg	1.615,77	0,00%		3,69%			
6	HITO: MUROS Y PINTURAS			%	\$ 127.039.228,73	0,00%	9,05%	0,00%	0,00%
6,00	MAMPOSTERIA								
6.1	Muros en bloque de concreto Liso 12x19x39 color gris con hidrófugo al exterior	m2	832,97	0,00%		38,93%			
6.2	Muros en bloque en Arcilla No. 4 e-6cm	m2	310,07	0,00%		14,96%			
6.5	Muro Calado En Bloque Liso De Concreto 12x19x39 Color Gris Con Hidrófugo Al Exterior	m	75,52	0,00%		4,80%			
6.10	Columnetas en Concreto incluye refuerzos y anclajes.	m	213,91	0,00%		4,49%			
6.11	Dovelas muro en bloque de concreto incluye refuerzos y anclajes.	m	393,60	0,00%		8,08%			
6.13	Cinta de Remate Antipechos incluye refuerzos y anclajes.	m	156,35	0,00%		2,03%			
6.14	Dinteles en Concreto incluye refuerzo y anclajes	m	16,38	0,00%		0,81%			
7,00	PAÑETER								
7.1	Pañete en mortero 1:4 Sobre Mampostería	m2	566,00	0,00%		13,42%			
7.2	Pañete en mortero 1:4 Impugnabilizado Sobre Mampostería	m2	141,64	0,00%		3,90%			
8	HITO: PISOS ANDENES ENCHAPES Y ACABADOS			%	\$ 148.757.783,66	0,00%	10,60%	0,00%	0,00%
8,00	ALISTADO DE PISO								
8.1	Afinado de Pisos 1:4 a=4cm	m2	1.003,89	0,00%		15,74%			
9,00	ENCHAPES DE PISO								
9.1	Piso en Cerámica Nacional 30x30cm Color Blanco Tráfico 4	m2	58,54	0,00%		1,69%			
9.2	Piso en Tablita de Gres Sahara Formato 20 x 20cm o similar	m2	945,47	0,00%		23,99%			
9.3	Meda Caña en Granito Color Blanco	m	55,18	0,00%		0,82%			
9.4	Zocalo De Gres Sahara 30 X 7,5 Cms O Similar similar	m	477,82	0,00%		5,61%			
9.5	Enchape en Ceramica Nacional 30x30 para Muro Color Blanco con vin de Remate de Aluminio o Plastico en Esquinas Verticales	m2	99,55	0,00%		2,44%			
10,00	PINTURAS								
10.1	Estuco y pintura vinilo lavable tipo 1 para interiores	m2	705,15	0,00%		9,13%			
11,00	MESONES								
11.1	Mesón en Concreto acabado en Granito Blanco Fundido en obra incluye salpicadero bordes ditaciones y muretes de apoyo enchapados, lavamanos cortido	m	21,12	0,00%		1,54%			
12	HITO: CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES			%	\$ 241.125.643,27	0,00%	17,18%	0,00%	0,00%
12,00	CUBIERTA								
12.1	Tela Termoelectica en fibra de carbono UPVC incluye estructura metálica , anticorrosivo y pintura	m2	994,97	0,00%		85,22%			
12.2	Canal en Lámina Galvanizada Cal 18	m	174,30	0,00%		6,18%			
12.3	Fianche en Lámina Galvanizada Cal 20	m	78,21	0,00%		1,91%			
13,00	VENTANERIA								
13.1	Ventaneta de Fachadas en Aluminio, cristal y película de seguridad 4 micras. Incluye marco con alijia	m2	209,00	0,00%		25,29%			
14,00	PUERTAS								
14.1	Puerta en lamina CR cal. 18, con persiana, malla en cristal y película de seguridad 4 micras, incluye anticorrosivo y smalta.	un	16,00	0,00%		6,94%			
14.3	Puerta para sanitario en acero inoxidable cal 18	un	9,00	0,00%		1,88%			
15,00	APARATOS Y ACCESORIOS								
15.1	Sanitario de tanque color blanco linea institucional tipo corona o similar para discapacitados	un	1,00	0,00%		0,53%			
15.2	Sanitario de tanque color blanco linea institucional tipo corona o similar	un	9,00	0,00%		1,06%			
15.3	Lavamanos de colgar color blanco linea institucional tipo corona o similar para discapacitados incluye griferia	un	1,00	0,00%		0,25%			
15.4	Griferia tipo push antivandalia de pared linea institucional	un	12,00	0,00%		2,25%			
15.6	Orinal mediano de colgar color blanco linea institucional	un	3,00	0,00%		0,72%			
15.9	Juego de barras de apoyo para personas con movilidad reducida	un	2,00	0,00%		0,15%			
15.10	Dispensador DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	un	9,00	0,00%		0,79%			
15.11	Dispensador de Jabón en acero inoxidable	un	3,00	0,00%		0,38%			
16,00	ESPEJOS								
16.1	Espejo 4mm cantos biselados y pulidos	m2	6,76	0,00%		0,82%			
17	HITO: REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS			%	\$ 229.171.770,35	0,00%	16,32%	0,00%	0,00%
17,00	INSTALACIONES ELECTRICAS, DE VOZ Y DATOS								
17.1	Instalaciones Eléctricas, de voz y datos (Ver presupuesto eléctrico anexo)	gf	1,00	0,00%		46,96%			
18,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED DE CENDIO								
18.1	Instalaciones Hidrosanitarias, gas y red contra incendio (Ver presupuesto hidrosanitario anexo)	gf	1,00	0,00%		53,04%			

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 INSTITUCION EDUCATIVA ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI									
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD					HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL /CONTEMPLADO PARA PAGO
			CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO ÍTEM	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACIÓN AL VALOR DEL CAPÍTULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPÍTULO CON RELACIÓN AL ÍTEM			
19	HITO: OBRAS EXTERIORES				\$ 29.858.604,76	0,00%	2,13%	0,00%	0,00%
19,00	URBANISMO								
19,1	Andén Perimetral en placa de concreto reforzado de 3.000 psi	m2	111,86	0,00%	90,62%	0,00%			
19,2	Siembra de Árboles	un	10,00	0,00%	9,98%	0,00%			
20,00	IMPERMEABILIZACION								
20,1	Impermeabilización placa de cubierta	m2	146,70	0,00%	3,61%	0,00%			
20,2	Impermeabilización Hidrotujo en Fachada	m2	452,10	0,00%	3,00%	0,00%			
21	HITO: ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS			%	\$ 8.723.833,15	0,00%	0,62%	0,00%	0,00%
21,00	ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS								
21,1	Aseo de obra a 3 manos	m2	1.035,53	0,00%	63,08%	0,00%			
21,2	Cargue y retiro de Escombros	m3	132,00	0,00%	38,92%	0,00%			
							100,00%	2,19%	1,72%

I.E ALFREDO BONILLA MONTAÑO
SEDE SIXTO MARIA ROJAS

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2016 I.E. SIXTO MARIA ROJAS-JAMUNDI								
ITEM	DESCRIPCION (Código de obra y base o productos con planda)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO ITEMS	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ITEMS CON RELACION AL VALOR DEL CANTIDATO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CANTIDATO CON RELACION AL HITO	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL
HITO PRELIMINARES					\$ 28,035,668.51	100.00%	2,79%	2,79%
1.0	PRELIMINARES							
1.1	Limpieza y Desacoste	m2	549.95	100%	17.53%	17.53%		
1.2	Localización Trámite y Radante	m2	545.35	100%	12.66%	12.66%		
1.3	Campamento de Obra	m2	92.21	100%	67.41%	67.41%		
1.4	Caseta Sanitaria	m3	6.00	100%	12.40%	12.40%		
HITO EXCAVACION CIMENTACION Y RELLENOS					\$ 104,889,404.59	98.63%	10,44%	10,30%
2.0	EXCAVACIONES							
2.1	Excavación Manual de Vigas de cimentación < 1.5 m	m3	57.00	100%	1.22%	1.22%		
2.2	Excavación Manual de Zapatas de cimentación > 1.5 m	m3	321.53	100%	6.89%	6.89%		
2.3	Excavación para nivelación de terreno	m3	171.29	100%	3.67%	3.67%		
2.4	Refrío material de Excavación	m3	333.18	100%	7.02%	7.02%		
3.0	MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION							
3.1	Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas	m3	71.04	100%	3.12%	3.12%		
3.2	Mejoramiento en material seleccionado en vigas de cimentación	m3	24.45	100%	1.01%	1.01%		
3.3	Mejoramiento en material seleccionado bajo placa contrapiso	m3	127.62	100%	6.02%	6.02%		
4.0	CIMENTACION SUPERFICIAL							
4.1	Concreto de Limpieza	m3	13.60	100%	4.51%	4.51%		
4.2	Concreto de Zapatas	m3	21.35	100%	14.02%	14.02%		
4.3	Concreto de Vigas de Cimentación	m3	27.45	100%	15.76%	15.76%		
4.4	Concreto de Placa Contrapiso	m2	425.40	55%	23.36%	19.23%		
4.5	Acero de Zapatas	kg	1,181.74	100%	3.42%	3.42%		
4.6	Acero de Vigas de Cimentación	kg	2,658.75	100%	7.47%	7.47%		
4.7	Malla electrosoldada Placa Contrapiso	kg	1,227.02	55%	5.53%	5.24%		
HITO ESTRUCTURA APORTICADA					\$ 281,311,745.64	7.51%	28,02%	2,10%
5.0	CONCRETO ESTRUCTURA							
5.1	Concreto Columnas	m3	18.53	65.5%	4.1%	2.87%		
5.2	Concreto Placa Alérea	m2	370.44	0.0%	23.7%	0.0%		
5.3	Concreto Vigas de Cubierta	m3	12.97	0.0%	3.5%	0.0%		
5.4	Concreto Placa Mezcla de Cubierta	m2	92.05	0.0%	4.3%	0.0%		
5.5	Acero Columnas	kg	6,660.75	87.5%	7.1%	4.84%		
5.6	Malla electrosoldada Placa Alérea entrapado	kg	1,536.42	0.0%	1.6%	0.0%		
5.7	Acero Vigas Alérea	kg	8,648.19	0.0%	9.3%	0.0%		
5.8	Acero Vigas de Cubierta	kg	1,753.83	0.0%	1.5%	0.0%		
5.9	Malla electrosoldada Placa Mezcla de Cubierta	kg	381.72	0.0%	0.4%	0.0%		
HITO MUROS Y PINTURA					\$ 140,713,856.55	0.00%	14,01%	0,00%
6.0	MAMPOSTERIA							
6.1	Muro en Bloque de concreto Liso 12x12x24 color gris con hidrófugo al exterior	m2	224.88	0.0%	12.63%	0.00%		
6.2	Muro en Bloque en Ancha No. 4 e-60ms	m2	436.70	0.0%	19.20%	0.00%		
6.3	Muro Calado En Bloque Liso De Concreto 12x12x24 Color Gris Con Hidrófugo Al Exterior	m	132.08	0.0%	7.38%	0.00%		
6.10	Columnas en Concreto incluye refuerzos y anclajes	m	1,818.31	0.0%	30.24%	0.00%		
6.11	Dovelas muro en Bloque de concreto incluye refuerzos y anclajes	m	646.29	0.0%	10.63%	0.00%		
6.12	Cinta de Remate Antiproyectos incluye refuerzos y anclajes	m	74.44	0.0%	0.38%	0.00%		
6.13	Difusores en Concreto incluye refuerzos y anclajes	m	14.02	0.0%	0.97%	0.00%		
7.0	PAÑETES							
7.1	Pañeta Liso 1.4 Sobre Mampostería	m2	351.75	0.0%	7.63%	0.00%		
7.2	Pañeta Impermeabilizado 1.4 Sobre mampostería	m2	322.65	0.0%	6.88%	0.00%		
HITO PISOS ANDENES ENCHAPES Y ACABADOS					\$ 133,380,495.10	0.00%	13,28%	0,00%
8.0	ALUSTADO DE PISO							
8.1	Afinado de Pisos 1.4 e-4 cm	m2	501.89	0.0%	13.29%	0.00%		
9.0	ENCHAPES							
9.1	Piso en cerámica Nacional 30x30cm color Blanco Tráfico 4	m2	87.43	0.0%	2.65%	0.00%		
9.2	Piso en baldosa de gres Sahara formato 20 x 20 cm o similar	m2	114.41	0.0%	2.54%	0.00%		
9.3	Malla café en Granito color Blanco	m	82.27	0.0%	0.93%	0.00%		
9.4	Zocalo De Gres Sahara 50 X 7.5 Oms O Similar	m	534.54	0.0%	9.34%	0.00%		
9.5	Enchape En Cerámica Nacional 50 X 50 Color Blanco Con Vin De Remate De Aluminio O Puesteo En Esquinas Verticales	m2	122.20	0.0%	3.10%	0.00%		
10.0	PINTURAS							
10.1	Espos y Pintura vinilo lavable tipo 1 para interiores	m2	493.59	0.0%	5.77%	0.00%		
10.2	Espos y Pintura epóxica para interiores	m2	25.30	0.0%	0.54%	0.00%		
11.0	MESONES							
11.1	Meson en concreto acabado en granito blanco fundido en obra incluye sellos/corona bordes, aberturas y mureles de apoyo enchapados, lavamanos corrido	m	27.32	0.0%	2.21%	0.00%		
HITO CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES					\$ 104,497,716.25	0.00%	10,40%	0,00%
12.0	CUBIERTA							
12.1	Tela Tarmacónica en obra de concreto UPVC. Incluye estructura metálica, anticorrosivo y pintura	m2	407.00	0.0%	40.81%	0.00%		
12.2	Canal en Lámina Galvanizada Cal 18	m	55.43	0.0%	4.82%	0.00%		
12.3	Fancho en lámina galvanizada cal 20	m	26.68	0.0%	1.81%	0.00%		
13.0	VENTANERIA							
13.1	Ventana en aluminio cristal y pelfoy de seguridad 4 mms incluye mano con alfaja	m2	198.55	0.0%	25.15%	0.00%		
14.0	PUERTAS							
14.1	Puerta en lámina OR cal 18, con perilla, mirilla en cristal y pelfoy de seguridad 4 mms incluye anticorrosivo y estuche	un	14.00	0.0%	6.97%	0.00%		
14.2	Puerta para sanitario en acero inoxidable cal 18	un	4.00	0.0%	0.93%	0.00%		
15.0	APARATOS Y ACCESORIOS							
15.1	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar para discapacitados	un	1.00	0.0%	0.80%	0.00%		
15.2	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar	un	7.00	0.0%	0.62%	0.00%		
15.3	Lavamanos de color color blanco línea institucional tipo corona o similar para discapacitados incluye grifería	un	1.00	0.0%	0.28%	0.00%		
15.4	Lavamanos Blanco de color tipo corona o similar	un	2.00	0.0%	0.54%	0.00%		
15.5	Grifería tipo push activada de color línea institucional	un	6.00	0.0%	1.25%	0.00%		
15.6	Orinal mediano de color color blanco línea institucional	un	2.00	0.0%	0.54%	0.00%		
15.7	Juego de barras de apoyo para personas con movilidad reducida	un	2.00	0.0%	0.17%	0.00%		
15.8	Lavaplatos en acero inoxidable tipo institucional 0.60x0.60x0.30 incluye grifería cuello de ganso institucional	m2	12.00	0.0%	0.87%	0.00%		
15.9	Dispensador DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	un	3.00	0.0%	0.55%	0.00%		
15.10	Dispensador de Jabón en acero inoxidable	un	5.00	0.0%	0.70%	0.00%		
15.11	Quinta Lavaplatos De Emergencia	un	2.00	0.0%	2.16%	0.00%		
15.12	Juego de lavaplatos de baño	un	2.00	0.0%	0.13%	0.00%		
15.13	Lavamanos Blanco de sobreponer tipo corona o similar - incluye grifería	un	7.00	0.0%	0.63%	0.00%		
16.0	ESPEJOS							
16.1	Espejo 4mm cantos biselados y pulidos	m2	3.35	0.0%	0.45%	0.00%		
HITO REDES HIDROVANTARIAS Y ELECTRICAS					\$ 191,083,539.85	7.64%	19,02%	1,45%
17.0	INSTALACIONES ELECTRICAS, DE VOZ Y DATOS							

ITEM	DESCRIPCION (Correlativo a los ítems e presupuesto contratados)	UNIDAD	CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 I.E. SIXTO MARIA ROJAS-JAMUNDI				HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO ÍTEM	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACION AL VALOR DEL CANTILLO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CANTILLO CON RELACION AL ÍTEM		
17.1ELEC	Instalaciones Eléctricas de voz y datos (Ver presupuesto eléctrico anexo)	g	1	0,0%	45,4%	0,00%		
18.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED DE INCENDIO							
18.1HIDRO	Instalaciones Hidrosanitarias, gas y red contra incendio (Ver presupuesto Hidrosanitario anexo)	g	1	14,0%	34,6%	7,64%		
HITO OBRAS EXTERIORES					\$ 13.447.023,60	0,00%	1,34%	0,00%
19	URBANISMO							
19.1	Andén Perimetral en placa de concreto reforzado de 3.000 psi	m2	69,82	0,00%	79,2%	0,00%		
19.2	Sombra de 6'x6'x6'	un	10	0,00%	20,8%	0,00%		
20.0	IMPERMEABILIZACIÓN							
20.1	Impermeabilización placa de cubierta	m2	81,94	0,00%	4,66%	0,00%		
20.2	Impermeabilización de Fachadas	m2	888,47	0,00%	9,71%	0,00%		
HITO ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS					\$ 6.982.212,90	0,00%	0,69%	0,00%
21.0	ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS							
21.1	Aseo de obra	m2	783,60	0,00%	69,90%	0,00%		
21.2	Campa y retiro sacos de obra	m3	114,77	0,00%	43,10%	0,00%		
22.0	RANPA ELEVADA EN CONCRETO							
22.1	Rampa elevada en concreto reforzado 3000 psi, incluye barandas en tubular de acero y pintura esmalte blanco	m2	124,82	0,00%	30,4%	0,00%		
23.0	ESCALERA ELEVADA EN CONCRETO							
23.1	Escalera elevada en concreto reforzado 3000 psi, incluye barandas en tubular de acero y pintura esmalte blanco	m2	20	0,00%	8,8%	0,00%		
							100,00%	16,65%

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 I.E. SIXTO MARIA ROJAS-JAMUNDI									
ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítem o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO ÍTEM	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACION AL VALOR DEL CAPÍTULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPÍTULO CON RELACION AL HITO	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL /CONTEMPLADO PARA PAGO
HITO PRELIMINARES					\$ 28.055.668,51	100,00%	2,79%	2,79%	0,84%
1.0	PRELIMINARES								
1.1	Limpieza y Descapote	m2	546,36	100%	17,53%	17,53%			
1.2	Localización Trazado y Replanteo	m2	546,36	100%	12,66%	12,66%			
1.3	Campamento de Obra	m2	32,21	100%	57,41%	57,41%			
1.4	Caseta Sanitaria	mes	6,00	100%	12,40%	12,40%			
HITO EXCAVACION CIMENTACION Y RELLENOS					\$ 104.869.404,59	98,63%	10,44%	10,30%	10,30%
2.0	EXCAVACIONES								
2.1	Excavación Manual de Vigas de cimentación < 1.5 m	m3	57,00	100%	1,22%	1,22%			
2.2	Excavación Manual de Zapatas de cimentación > 1.5 m	m3	321,58	100%	6,88%	6,88%			
2.3	Excavación para nivelación de terreno	m3	171,29	100%	3,67%	3,67%			
3.5	Retiro material de Excavación	m3	303,18	100%	7,02%	7,02%			
3.0	MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION								
3.1	Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas	m3	71,04	100%	3,12%	3,12%			
3.2	Mejoramiento en material seleccionado en vigas de cimentación	m3	24,45	100%	1,01%	1,01%			
3.3	Mejoramiento en material seleccionado bajo placa contrapiso	m3	127,62	100%	6,02%	6,02%			
4.0	CIMENTACION SUPERFICIAL								
4.1	Concreto de Limpieza	m3	13,60	100%	4,51%	4,51%			
4.2	Concreto de Zapatas	m3	24,36	100%	14,02%	14,02%			
4.3	Concreto de Vigas de Cimentación	m3	27,45	100%	15,76%	15,76%			
4.4	Concreto de Placa Contrapiso	m3	425,40	95%	29,38%	19,28%			
4.5	Acero de Zapatas	kg	1.181,74	100%	3,40%	3,40%			
4.6	Acero de Vigas de Cimentación	kg	2.558,79	100%	7,47%	7,47%			
4.7	Malla electrosoldada Placa de Contrapiso	kg	1.827,06	95%	5,53%	5,24%			
HITO ESTRUCTURA APORICADA					\$ 281.411.745,64	7,51%	28,02%	2,10%	2,10%
5.0	CONCRETO ESTRUCTURA								
5.1	Concreto Columnas	m3	19,53	65,9%	4,1%	2,67%			
5.2	Concreto Placa Aérea	m2	370,44	0,0%	26,7%	0,00%			
5.3	Concreto Vigas de Cubierta	m3	12,97	0,0%	3,5%	0,00%			
5.4	Concreto Placa Maciza de Cubierta	m2	92,06	0,0%	4,3%	0,00%			
5.5	Acero Columnas	kg	6.660,75	67,8%	7,1%	4,94%			
5.6	Malla electrosoldada Placa Aérea entrepiso	kg	1.535,40	0,0%	1,6%	0,00%			
5.7	Acero Vigas Aéreas	kg	8.645,19	0,0%	9,3%	0,00%			
5.8	Acero Vigas de Cubierta	kg	1.783,83	0,0%	1,8%	0,00%			
5.9	Malla electrosoldada Placa Maciza de Cubierta	kg	381,78	0,0%	0,4%	0,00%			
HITO MUROS Y PINTURA					\$ 140.713.866,56	0,00%	14,01%	0,00%	0,00%
6.0	MAMPOSTERIA								
6.1	Muros en bloque de concreto Liso 12x19x39 color gris con hidrófugo al exterior	m2	224,88	0,0%	12,57%	0,00%			
6.2	Muros en bloque en Arcilla No. 4 e/6cms	m2	436,70	0,0%	16,20%	0,00%			
6.5	Muro Calado En Bloque Liso De Concreto 12x19x39 Color Gris Con Hidrófugo Al Exterior	m	132,08	0,0%	7,38%	0,00%			
6.10	Columnetas en Concreto incluye refuerzos y anclajes.	m	1.818,31	0,0%	30,64%	0,00%			
6.11	Dovelas muro en bloque de concreto incluye refuerzos y anclajes.	m	646,39	0,0%	10,88%	0,00%			
6.13	Cinta de Remate Antepederos incluye refuerzos y anclajes.	m	74,44	0,0%	0,88%	0,00%			
6.14	Dinteles en Concreto incluye refuerzo y anclajes	m	14,02	0,0%	0,57%	0,00%			
7.0	PAÑETES								
7.1	Pañete Liso 1:4 Sobre Mampostería	m2	391,75	0,0%	7,69%	0,00%			
7.2	Pañete Impermeabilizado 1:4 sobre mampostería	m2	322,85	0,0%	6,38%	0,00%			
HITO PISOS ANDENES ENCHAPES Y ACABADOS					\$ 133.390.495,10	0,00%	13,28%	0,00%	0,00%
8.0	ALISTADO DE PISO								
8.1	Afinado de Pisos 1:4 e= 4 cm	m2	901,89	0,0%	13,29%	0,00%			
9.0	ENCHAPES								
9.1	Piso en cerámica Nacional 30x30cm color blanco Tráfico 4	m2	87,48	0,0%	2,85%	0,00%			
9.2	Piso en tabletas de gres Sahara formato 20 x 20 cm o similar	m2	814,41	0,0%	25,54%	0,00%			
9.3	Medio celda en Granito color Blanco	m	83,27	0,0%	0,83%	0,00%			
9.4	Zocalo De Gres Sahara 30 X 7.5 Cms O Similar	m	534,54	0,0%	9,34%	0,00%			
9.5	Enchape En Ceramica Nacional 30 X 30 Color Blanco Con Win De Remate De Aluminio O Plastico En Esquinas Verticales	m2	122,20	0,0%	3,10%	0,00%			
10.0	PINTURAS								
10.1	Estuco y Pintura vinilo lavable tipo 1 para interiores	m2	483,99	0,0%	5,77%	0,00%			
10.2	Estuco y Pintura epóxica para interiores	m2	25,30	0,0%	0,54%	0,00%			
11.0	MESONES								
11.1	Meson en concreto acabado en granito blanco fundido en obra incluye salpicadero bordes dilataciones y muretes de apoyo enchapados, lavamanos corrido	m	27,32	0,0%	2,21%	0,00%			
HITO CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES					\$ 104.497.716,25	0,00%	10,40%	0,00%	0,00%
12.0	CUBIERTA								
12.1	Teja Termocústica en fibra de carbono UPVC incluye estructura metálica, anticorrosivo y pintura	m2	407,03	0,0%	80,51%	0,00%			
12.2	Canal en Lámina Galvanizada Cal. 18	m	56,43	0,0%	4,62%	0,00%			
12.3	Flanchar en lámina galvanizada cal.20	m	26,63	0,0%	1,51%	0,00%			
13.0	VENTANERIA								
13.1	Ventanería en aluminio, cristal y película de seguridad 4 micras. incluye marco con afeja	m2	186,56	0,0%	25,16%	0,00%			
14.0	PUERTAS								
14.1	Puerta en lamina CR cal. 18, con persiana, mirilla en cristal y película de seguridad 4 micras, incluye anticorrosivo y esmalte.	un	14,00	0,0%	6,67%	0,00%			
14.3	Puerta para sanitario en acero inoxidable cal 18	un	4,00	0,0%	0,90%	0,00%			
15.0	APARATOS Y ACCESORIOS								
15.1	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar para discapacitados	un	1,00	0,0%	0,60%	0,00%			
15.2	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar	un	7,00	0,0%	0,92%	0,00%			
15.3	Lavamanos de colgar color blanco línea institucional tipo corona o similar para discapacitados incluye grifería	un	1,00	0,0%	0,28%	0,00%			
15.3a	Lavamanos Blanco de colgar tipo corona o similar	un	2,00	0,0%	0,54%	0,00%			
15.4	Grifería tipo push antivandalica de pared línea institucional	un	6,00	0,0%	1,26%	0,00%			
15.6	Orinal mediano de colgar color blanco línea institucional	un	2,00	0,0%	0,54%	0,00%			
15.8	Juego de barras de apoyo para personas con movilidad reducida	un	2,00	0,0%	0,17%	0,00%			
15.9	Lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial 0.60x0.60x0.30 incluye grifería cuello de ganso institucional	m2	12,00	0,0%	0,87%	0,00%			
15.10	Dispensador DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	un	3,00	0,0%	0,29%	0,00%			
15.11	Dispensador de Jabón en acero inoxidable	un	5,00	0,0%	0,70%	0,00%			
15.12	Ducha Lavapies De Emergencia	un	2,00	0,0%	2,16%	0,00%			
15.12a	Juego Inclinaciones de baño	un	2,00	0,0%	0,18%	0,00%			
15.13	Lavamanos Blanco de sobrepasar tipo corona o similar - Incluye Grifería	un	7,00	0,0%	0,85%	0,00%			
16.0	ESPEJOS								
16.1	Espejo 4mm cantos biselados y pulidos	m2	9,95	0,0%	0,45%	0,00%			
HITO REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS					\$ 191.083.539,85	7,64%	19,02%	1,45%	1,45%
17.0	INSTALACIONES ELECTRICAS, DE VOZ Y DATOS								
17.1ELEC	Instalaciones Eléctricas, de voz y datos (Ver presupuesto eléctrico anexo)	gl	1	0,0%	45,4%	0,00%			
18.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED DE INCENDIO								
18.1HIDRO	Instalaciones Hidrosanitarias, gas y red contra incendio (Ver presupuesto hidrosanitario anexo)	gl	1	14,0%	54,6%	7,64%			
HITO OBRAS EXTERIORES					\$ 13.447.023,60	0,00%	1,34%	0,00%	0,00%
19	URBANISMO								
19.1	Andén Perimetral en placa de concreto reforzado de 3.000 psi	m2	69,82	0,00%	79,2%	0,00%			
19.2	Siembra de árboles	un	10	0,00%	20,6%	0,00%			
20.0	IMPERMEABILIZACION								

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 I.E. SIXTO MARIA ROJAS-JAMUNDI				HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL /CONTEMPLADO PARA PAGO
			CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO/ITEMS	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ITEMS CON RELACION AL VALOR DEL CAPITULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPITULO CON RELACION AL HITO			
20.1	Impermeabilización placa de cubierta	m2	81.94	0.00%	4.65%	0.00%			
20.2	Impermeabilizante de Fachadas	m2	568.41	0.00%	8.71%	0.00%			
HITO ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS							0.69%	0.00%	0.00%
21.0	ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS				\$ 6.952.212.90	0.00%			
21.1	Aseo de obra	m2	783.68	0.00%	59.80%	0.00%			
21.2	Cargue y retiro escombros de obra	m3	114.77	0.00%	40.10%	0.00%			
22.0	RAMPA ELEVADA EN COCRETO								
22.1	Rampa elevada en concreto reforzado 3000 psi, incluye barandas en tubular de acero y pintura esmalte blanco	m2	124.82	0.00%	30.4%	0.00%			
23.0	ESCALERA ELEVADA EN COCRETO								
23.1	Escalera elevada en concreto reforzado 3000 psi, incluye barandas en tubular de acero y pintura esmalte blanco	m2	20	0.00%	8.8%	0.00%			
							100.00%	16.65%	14.69%

I.E ALFREDO BONILLA MONTAÑO
SEDE MARIA INMACULADA

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2016 INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA- JAMUNDI								
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a las obras a ejecutarse contratadas)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	EJECUTADO/ITEMS	INDEBENCIA PORCENTUAL DEL ITEM CON RELACION AL VALOR DEL CARTELLO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CARTELLO CON RELACION AL RITO	MITO PROGRAMADO TOTAL	MITO EJECUTADO TOTAL
1	HITO: PRELIMINARES				\$ 33.987.500,00	96,65%	2,27%	2,19%
1.00	PRELIMINARES							
1.1	Limpias y Descapote	m2	1.020,00	100,00%	27,01%	27,01%		
1.2	Localización Trazado y Replanteo	m2	228,00	100,00%	18,25%	18,25%		
1.3	Campamento de Obra	m2	30,00	100,00%	44,13%	44,13%		
1.4	Caseta Sanitaria	mca	8,00	75,00%	13,65%	10,94%		
2	HITO: EXCAVACIONES				\$ 147.190.872,01	100,00%	9,83%	9,83%
2.00	EXCAVACIONES							
2.1	Excavación Manual de Vigas de cimentación < 1.5 m.	m3	17,40	100,00%	0,27%	0,27%		
2.2	Excavación Manual de Zapatas de cimentación > 1.5 m.	m3	221,63	100,00%	3,36%	3,36%		
2.3	Excavación para nivelación de terreno	m3	254,45	100,00%	4,04%	4,04%		
2.4	Retiro material de Excavación	m3	558,81	100,00%	8,98%	8,98%		
3.00	MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION							
3.1	Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas	m3	33,25	100,00%	1,04%	1,04%		
3.2	Mejoramiento en material seleccionado en vigas de cimentación	m3	20,51	100,00%	0,80%	0,60%		
3.3	Mejoramiento en material seleccionado bajo placa contrapié	m3	253,55	100,00%	8,84%	8,84%		
4.00	CIMENTACION SUPERFICIAL							
4.1	Concreto de Limpieza	m3	13,28	100,00%	2,42%	2,42%		
4.2	Concreto de Zapatas	m3	28,13	100,00%	11,63%	11,63%		
4.3	Concreto de Vigas de Cimentación	m3	30,76	100,00%	12,58%	12,58%		
4.4	Concreto de Placa contrapié	m2	841,55	100,00%	28,62%	28,62%		
4.5	Acero de Zapatas	kg	1.145,80	100,00%	2,35%	2,35%		
4.6	Acero de Vigas de Cimentación	kg	4.055,05	100,00%	6,92%	6,92%		
4.7	Varilla electrosoldada Placa de Contrapié	kg	3.505,53	100,00%	7,56%	7,56%		
5	HITO: ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO				\$ 400.973.089,89	13,28%	26,78%	3,56%
5.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO							
5.1	Concreto Columnas	m3	59,40	68,66%	9,15%	5,37%		
5.2	Concreto Placa Alínea	m2	543,01	0,00%	18,82%	0,00%		
5.3	Concreto Vigas de Cubierta	m3	65,69	0,00%	12,41%	0,00%		
5.4	Concreto Placa Manta de Cubierta	m2	134,75	0,00%	4,05%	0,00%		
5.5	Acero Columnas	kg	15.173,23	68,00%	12,16%	7,92%		
5.6	Varilla electrosoldada Placa Alínea en trapezo	kg	6.912,65	0,00%	5,20%	0,00%		
5.7	Acero Vigas Alínea	kg	8.848,79	0,00%	5,15%	0,00%		
5.8	Acero Vigas de Cubierta	kg	8.755,68	0,00%	8,81%	0,00%		
5.9	Varilla electrosoldada Placa Manta de Cubierta	kg	1.288,93	0,00%	0,97%	0,00%		
6	HITO: MAMPOSTERIA				\$ 122.789.189,48	0,00%	8,20%	0,00%
6.00	MAMPOSTERIA							
6.1	Muros en bloque de concreto Liso 12x15x30 color gris con 150 gr/gm al exterior	m2	842,18	0,00%	21,80%	0,00%		
6.2	Muros en bloque en Acolla No. 4 e-6mm	m2	322,14	0,00%	13,65%	0,00%		
6.3	Muro Cebado En Bloque Liso De Concreto 12x15x30 Color Gris Con 150 gr/gm Al Exterior	m2	42,79	0,00%	2,61%	0,00%		
6.10	Columnas en Concreto incluye refuerzos y anclajes	m	305,51	0,00%	5,90%	0,00%		
6.11	Dovelas muros en bloque de concreto incluye refuerzos y anclajes	m	506,37	0,00%	7,68%	0,00%		
6.13	Cinta de Rameta Antepedcho incluye refuerzos y anclajes	m	125,20	0,00%	1,72%	0,00%		
6.14	Cintales en Concreto incluye refuerzos y anclajes	un	15,08	0,00%	0,70%	0,00%		
7.00	HITO: PINTES							
7.1	Palera Liso 1:4 Sobre Mampostería	m2	1.172,59	0,00%	26,37%	0,00%		
7.2	Palera Impermeabilizado 1:4 sobre mampostería	m2	215,24	0,00%	5,28%	0,00%		
8	HITO: AJUSTADO PARA PISOS				\$ 192.009.882,37	0,00%	12,83%	0,00%
8.00	AJUSTADO PARA PISOS							
8.1	Mina de Pisos 1:4 e-4 cm	M2	1.299,06	0,00%	13,29%	0,00%		
9.00	HITO: ENGRUPE DE PISO							
9.1	Piso en cerámica Nacional 30x30cm color blanco Trafo 4	m2	194,82	0,00%	5,28%	0,00%		
9.2	Piso en tabletas de gres Sahara formato 20 x 20 cm o similar	m2	1.147,30	0,00%	25,39%	0,00%		
9.3	Medio caña en Grano color Blanco	m	201,18	0,00%	1,58%	0,00%		
9.4	Zoclo De Gres Sahara 50 X 7,5 Cms O Similar	m	535,55	0,00%	6,50%	0,00%		
9.5	Engrape En Ceramica Nacional 50 X 10 Color Blanco Con Vin de Ramete de Aluminio o Plastico En Esquinas Variables	m2	329,81	0,00%	5,74%	0,00%		
10.00	HITO: PINTURAS							
10.1	Estuco y Pintura vinilo lavable tipo I para interiores	m2	1.070,83	0,00%	14,34%	0,00%		
10.2	Estuco y Pintura epóxica para interiores	m2	21,63	0,00%	0,54%	0,00%		
11.00	HITO: MUEBLES							
11.1	Meson en concreto acabado en gramo blanco fundido en obra incluye salpicadero bordes dilatadores y muretas de apoyo enchapados lavamanos conido	M2	27,82	0,00%	1,66%	0,00%		
12	HITO: CUBIERTA				\$ 257.711.681,20	0,00%	17,21%	0,00%
12.00	CUBIERTA							
12.1	Tapa Termosolable en fibra de carbono LPVC incluye estructura metálica, anclajes y pintura	m2	1.113,53	0,00%	89,48%	0,00%		
12.2	Sanal en Lámina Galvanizada Cal. 13	m	83,58	0,00%	2,32%	0,00%		
12.3	Pancho en lámina galvanizada cal 20	m	72,41	0,00%	1,82%	0,00%		
13.00	HITO: VENTANAS							

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARÍA INMACULADA- JAMUNDI								
ITEM	DESCRIPCION (Responde a los ítems o productos contratados)	CANTIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO ITEMS	INGENIERIA PORCENTUAL DEL ITEM CON RELACION AL VALOR DEL CAPITULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPITULO CON RELACION AL HITO	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL
13.1	Ventana en aluminio, cristal y película de seguridad 4 milímetros. Incluye marco con alféiz	m2	293.50	0.00%	21.65%	0.00%		
13.00	HITO: PUERTAS							
14.1	Puerta en lamina CR col. 18, con persiana, mita en cristal y película de seguridad 4 milímetros. Incluye anticoncavo y esmalte	un	20.00	0.00%	6.62%	0.00%		
14.3	Puerta para sanitario en acero inoxidable col 18	un	18	0.00%	3.07%	0.00%		
15.00	HITO: APARATOS Y ACCESORIOS							
15.1	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar para discapacitados	un	2.00	0.00%	0.53%	0.00%		
15.2	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar	un	15.00	0.00%	1.64%	0.00%		
15.3	Levanamios de colgar color blanco línea institucional tipo corona o similar para discapacitados incluye grifería	un	2.00	0.00%	0.26%	0.00%		
15.3a	Levanamios blancos de colgar tipo corona o similar	un	1.00	0.00%	0.12%	0.00%		
15.4	Oriferia tipo push antirresaca de pared línea institucional	LN	24.00	0.00%	3.42%	0.00%		
15.6	Orinel mediano de colgar color blanco línea institucional	un	5.00	0.00%	0.29%	0.00%		
15.8	Juego de barras de apoyo para personas con movilidad reducida	un	4.00	0.00%	0.24%	0.00%		
15.9	Levanilla en acero inoxidable tipo industrial 60x60x60x30 incluye grifería puño de gancho institucional	un	6.00	0.00%	0.30%	0.00%		
15.10	Dispensador dispensador de toallas de papel en acero inoxidable	un	7.00	0.00%	0.43%	0.00%		
15.11	Dispensador de jabón en acero inoxidable	un	14.00	0.00%	1.37%	0.00%		
15.12	Ducha Lavaglo De Emergencia	un	1.00	0.00%	0.72%	0.00%		
15.12a	Juego de nonataciones de baño	un	2.00	0.00%	0.06%	0.00%		
16.00	HITO: ESPEJOS							
16.1	Espejo 4mm cantos biselados y pulidos	m2	4.80	0.00%	0.45%	0.00%		
17	HITO: INSTALACIONES ELECTRICAS, DE VOZ Y DATOS			%	\$ 311,947,394.03	4.68%	20.84%	0.96%
17.00	ELECTRICAS							
17.10.50	Instalaciones Eléctricas, de voz y datos (Ver presupuesto eléctrico ítem 5)		1.00	0.00%	35.42%	0.00%		
18.00	NOBOMBANTARIAS							
18.10.00	Instalaciones hidrosanitarias, de gas y red incendio		1.00	7.17%	64.59%	4.62%		
19	HITO: URBANISMO			%	\$ 18,907,045.43	0.00%	1.26%	0.00%
19.00	URBANISMO							
19.1	Acera Parimetal en placa de concreto reforzado de 3,000 psi	m2	158.62	0.00%	35.16%	0.00%		
19.2	Siembras de árboles	un	10.00	0.00%	14.81%	0.00%		
20.00	HITO: IMPERMEABILIZACIONES							
20.1	Impermeabilización plana de cubierta	m2	122.43	0.00%	2.82%	0.00%		
20.2	Impermeabilización Hidrófuga en Fachada	m2	574.06	0.00%	3.57%	0.00%		
21	HITO: ENTREGA Y RECEPCION FINAL DE OBRAS			%	\$ 11,507,891.06	0.00%	0.77%	0.00%
21.1	Asa de Ocm	m2	\$ 1,424.62	0.00%	68.57%	0.00%		
21.2	Carga y retiro de Escombros	m3	\$ 143.90	0.00%	51.43%	0.00%		
22.00	HITO: RAMPA ELEVADA EN CONCRETO							
22.1	Rampa elevada en concreto reforzado 3000 psi, incluye barandas en tubular de acero y pintura esmalte blanco	Cl	114.21	0.00%	12.51%	0.00%		
23.00	HITO: ESCALERA ELEVADA EN CONCRETO							
23.1	Escalera elevada en concreto reforzado 3000 psi, incluye barandas en tubular de acero y pintura esmalte blanco	m2	20	0.00%	6.12%	0.00%		
							100,00%	16,55%

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARÍA INMACULADA- JAMUNDÍ									
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO/ITEMS	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACION AL VALOR DEL CAPÍTULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPÍTULO CON RELACION AL ÍTEM	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL /CONTEMPLADO PARA PAGO
1	HITO : PRELIMINARES			%	\$ 33.987.500,00	96,59%	2,27%	2,19%	0,96%
1,00	PRELIMINARES								
1.1	Limpieza y Descapote	m2	1.020,00	100,00%	27,01%	27,01%			
1.2	Localización Trazado y Replanteo	m2	796,00	100,00%	15,20%	15,20%			
1.3	Campamento de Obra	m2	30,00	100,00%	44,13%	44,13%			
1.4	Caseta Sanitaria	mes	2,00	75,00%	10,65%	10,24%			
2	HITO : EXCAVACIONES			%	\$ 147.190.872,01	100,00%	9,83%	9,83%	9,83%
2,00	EXCAVACIONES								
2.1	Excavación Manual de Vigas de cimentación < 1.5 m	m3	17,40	100,00%	0,27%	0,27%			
2.2	Excavación Manual de Zapatas de cimentación > 1.5 m	m3	221,63	100,00%	3,38%	3,38%			
2.3	Excavación para nivelación de terreno	m3	284,48	100,00%	4,04%	4,04%			
2.4	Retiro material de Excavación	m3	508,61	100,00%	8,36%	8,36%			
3,00	MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION								
3.1	Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas	m3	33,25	100,00%	1,04%	1,04%			
3.2	Mejoramiento en material seleccionado en Vigas de cimentación	m3	20,51	100,00%	0,60%	0,60%			
3.3	Mejoramiento en material seleccionado bajo placa contrapiso	m3	283,38	100,00%	8,84%	8,84%			
4,00	CIMENTACION SUPERFICIAL								
4.1	Concreto de Limpieza	m3	10,28	100,00%	2,42%	2,42%			
4.2	Concreto de Zapatas	m3	28,13	100,00%	11,53%	11,53%			
4.3	Concreto de Vigas de Cimentación	m3	30,78	100,00%	12,58%	12,58%			
4.4	Concreto de Placa contrapiso	m2	841,55	100,00%	28,69%	28,69%			
4.5	Acero de Zapatas	kg	1.148,60	100,00%	2,35%	2,35%			
4.6	Acero de Vigas de Cimentación	kg	4.055,06	100,00%	8,32%	8,32%			
4.7	Malla electrosoldada Placa de Contrapiso	kg	3.505,53	100,00%	7,56%	7,56%			
5	HITO : ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO			%	\$ 400.973.089,89	13,28%	26,78%	3,56%	3,56%
5,00	ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO								
5.1	Concreto Columnas	m3	59,40	58,88%	9,13%	5,37%			
5.2	Concreto Placa Alérea	m2	343,01	0,00%	18,62%	0,00%			
5.3	Concreto Vigas de Cubierta	m3	65,69	0,00%	12,41%	0,00%			
5.4	Concreto Placa Maciza de Cubierta	m2	124,75	0,00%	4,05%	0,00%			
5.5	Acero Columnas	kg	18.178,23	65,00%	12,18%	7,80%			
5.6	Malla electrosoldada Placa Alérea entrapiso	kg	6.912,65	0,00%	5,20%	0,00%			
5.7	Acero Vigas Alérea	kg	6.846,78	0,00%	5,15%	0,00%			
5.8	Acero Vigas de Cubierta	kg	6.735,68	0,00%	6,61%	0,00%			
5.9	Malla electrosoldada Placa Maciza de Cubierta	kg	1.286,93	0,00%	0,97%	0,00%			
6	HITO: MAMPOSTERIA			%	\$ 122.789.189,48	0,00%	8,20%	0,00%	0,00%
6,00	MAMPOSTERIA								
6.1	Muros en bloque de concreto Liso 12x19x39 color gris con hidrolugo al exterior	m2	340,18	0,00%	21,80%	0,00%			
6.2	Muros en bloque en Antilla No. 4 e=4cm	m2	322,14	0,00%	13,69%	0,00%			
6.3	Muro Celado En Bloque Liso De Concreto 12x19x39 Color Gris Con Hidrolugo Al Exterior	m2	40,79	0,00%	2,61%	0,00%			
6.10	Columnetas en Concreto incluye refuerzos y anclajes.	m	305,31	0,00%	5,90%	0,00%			
6.11	Dovelas muro en bloque de concreto incluye refuerzos y anclajes.	m	366,37	0,00%	7,08%	0,00%			
6.13	Cinta de Remate Antapachos incluye refuerzos y anclajes.	m	126,20	0,00%	1,72%	0,00%			
6.14	Dinteles en Concreto incluye refuerzo y anclajes	un	15,08	0,00%	0,70%	0,00%			
7,00	HITO: PANETES								
7.1	Pañete Liso 1/4 Sobre Mamposteria	m2	1.172,69	0,00%	28,37%	0,00%			
7.2	Pañete impermeabilizado 1/4 sobre mamposteria	m2	218,24	0,00%	5,28%	0,00%			
8	HITO: ALISTADO PARA PISOS			%	\$ 192.009.882,37	0,00%	12,83%	0,00%	0,00%
8,00	ALISTADO PARA PISOS								
8.1	Alfomado de Pisos 1/4 e= 4 cm	M2	1.295,08	0,00%	13,25%	0,00%			
9,00	HITO: ENCHAPE DE PISO								
9.1	Piso en cerámica Nacional 30x30cm color blanco Trafico 4	m2	154,82	0,00%	3,28%	0,00%			
9.2	Piso en tablata de gres Sahara formato 20 x 20 cm o similar	m2	1.147,33	0,00%	25,30%	0,00%			
9.3	Media caña en Granito color Blanco	m	201,16	0,00%	1,58%	0,00%			
9.4	Zocalo De Gres Sahara 90 X 7.5 Cms O Similar	m	535,55	0,00%	6,50%	0,00%			
9.5	Enchape En Ceramica Nacional 30 X 30 Color Blanco Con Win de Remate de Aluminio o Plastico En Esquinas Verticales	m2	325,61	0,00%	5,74%	0,00%			
10,00	HITO: PINTURAS								
10.1	Estuco y Pintura vinilo lavable tipo 1 para interiores	m2	1.070,83	0,00%	14,34%	0,00%			
10.2	Estuco y Pintura epóxica para interiores	m2	21,83	0,00%	0,54%	0,00%			
11,00	HITO: MESONES								
11.1	Meson en concreto acabado en granito blanco fundido en obra incluye salpicadero bordes dilataciones y muretes de apoyo enchapados lavamanos corrido	M2	27,82	0,00%	1,56%	0,00%			
12	HITO: CUBIERTA			%	\$ 257.711.661,20	0,00%	17,21%	0,00%	0,00%
12,00	CUBIERTA								
12.1	Teja Termoclastica en fibra de carbono UPVC incluye estructura metálica, anticorrosivo y pintura	m2	1.115,58	0,00%	89,48%	0,00%			
12.2	Canal en Lámina Galvanizada Cal. 18	m	69,88	0,00%	2,32%	0,00%			
12.3	Rancho en lámina galvanizada cal.20	m	79,41	0,00%	1,82%	0,00%			
13,00	HITO: VENTANARIA								
13.1	Ventanaria en aluminio, cristal y película de seguridad 4 micras. incluye marco con alfeiza	M2	233,50	0,00%	21,89%	0,00%			
14,00	HITO: PUERTAS								
14.1	Puerta en lamina CR cal. 18, con pensilina, milla en cristal y película de seguridad 4 micras, incluye anticorrosivo y esmalte.	un	20,00	0,00%	6,62%	0,00%			
14.3	Puerta para sanitario en acero inoxidable cal.18	un	19	0,00%	3,07%	0,00%			
15,00	HITO: APARATOS Y ACCESORIOS								

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARÍA INMACULADA- JAMUNDI									
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO/ITEMS	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACION AL VALOR DEL CAPÍTULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPÍTULO CON RELACION AL HITO	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL /CONTEMPLADO PARA PAGO
15.1	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar para discapacitados	un	2.00	0.00%	0.83%	0.00%			
15.2	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar	un	18.00	0.00%	1.64%	0.00%			
15.3	Lavamanos de coger color blanco línea institucional tipo corona o similar para discapacitados incluye grifería	un	2.00	0.00%	0.39%	0.00%			
15.3a	Lavamanos Blanco de coger tipo corona o similar	un	1.00	0.00%	0.19%	0.00%			
15.4	Grifería tipo push antivandálica de pared línea institucional	UN	24.00	0.00%	3.49%	0.00%			
15.6	Orinal mediano de coger color blanco línea institucional	un	5.00	0.00%	0.93%	0.00%			
15.8	Juego de barras de apoyo para personas con movilidad reducida	un	4.00	0.00%	0.24%	0.00%			
15.9	Lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial 0.60x0.60x0.30 incluye grifería cuello de ganso institucional	un	6.00	0.00%	0.30%	0.00%			
15.10	Dispensador dispensador de toallas de papel en acero inoxidable	un	7.00	0.00%	0.48%	0.00%			
15.11	Dispensador de Jabón en acero inoxidable	un	14.00	0.00%	1.37%	0.00%			
15.12	Ducha Lavajete De Emergencia	un	1.00	0.00%	0.75%	0.00%			
15.12a	Juego de incrustaciones de baño	un	2.00	0.00%	0.09%	0.00%			
16.00	HITO: ESPEJOS								
16.1	Espejo 4mm cantos biselados y pulidos	m2	4.80	0.00%	0.45%	0.00%			
17	HITO: INSTALACIONES ELECTRICAS, DE VOZ Y DATOS			%	\$ 311.947.394.03	4.63%	20,84%	0,96%	0,96%
17.00	ELECTRICAS								
17.1ELEC	Instalaciones Eléctricas, de voz y datos (Ver presupuesto eléctrico anexo)		1.00	0.00%	35.42%	0.00%			
18.00	HIDROSANITARIAS								
18.1HIDRO	Instalaciones hidrosanitarias, de gas y red incendio		1.00	7.17%	64.58%	4.63%			
19	HITO: URBANISMO			%	\$ 18.907.045.43	0.00%	1,26%	0,00%	0,00%
19.00	URBANISMO								
19.1	Andén Perimetral en placa de concreto reforzado de 8.000 psi	m2	105.82	0.00%	85.19%	0.00%			
19.2	Siembra de árboles	un	10.00	0.00%	14.81%	0.00%			
20.00	HITO: IMPERMEABILIZACIONES								
20.1	Impermeabilización placa de cubierta	m2	122.40	0.00%	2.82%	0.00%			
20.2	Impermeabilización Hidrólogo en Fachada	m2	574.06	0.00%	9.57%	0.00%			
21	HITO: ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS			%	\$ 11.507.891.06	0.00%	0,77%	0,00%	0,00%
21	ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS								
21.1	Asso de Obra	m2	\$ 1.484.92	0.00%	68.57%	0.00%			
21.2	Cargue y retiro de Escombros	m3	\$ 148.90	0.00%	31.43%	0.00%			
22.00	HITO: RAMPA ELEVADA EN CONCRETO								
22.1	Rampa elevada en concreto reforzado 3000 psi, incluye barandas en tubular de acero y pintura esmalte blanco	Cl	114.21	0.00%	19.51%	0.00%			
23.00	HITO: ESCALERA ELEVADA EN CONCRETO								
23.1	Escala elevada en concreto reforzado 3000 psi, incluye barandas en tubular de acero y pintura esmalte blanco	m2	20	0.00%	6.19%	0.00%			
							100,00%	16,55%	15,31%

I.E ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
SEDE MERCEDES ABREGO

CONTRATO PAE JU02-G02DC-2015 I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO- SEDE MERCEDES ABREGO- JAMUNDI								
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los Bienes o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO/ITEMS	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ITEMS CON RELACION AL VALOR DEL CAPITULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPITULO CON RELACION AL HITO	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL
1	HITO PRELIMINARES			%	\$ 30.260.000,00	100,00%	4,33%	4,33%
1,00	PRELIMINARES							
1.1	Limpieza y Desaposte	m2	760,00	100,00%	22,60%	22,60%		
1.2	Localización Trazado y Replanteo	m2	760,00	100,00%	15,53%	15,53%		
1.3	Campamento de Obra	m2	30,00	100,00%	49,57%	49,57%		
1.4	Caseta Sanitaria	mes	6,00	100,00%	11,62%	11,62%		
2	HITO EXCAVACION CIMENTACION Y RELLENOS			%	\$ 133.064.930,61	97,00%	19,03%	18,46%
2,00	EXCAVACIONES							
2.1	Excavación Manual de Vigas de cimentación < 1.5 m	m3	58,25	100,00%	0,56%	0,56%		
2.2	Excavación Manual de Zapatas de cimentación > 1.5 m	m3	475,29	100,00%	8,03%	8,03%		
2.3	Excavación para nivelación de terreno	m3	164,42	100,00%	2,76%	2,76%		
2.5	Retiro material de Excavación	m3	410,11	59,86%	7,42%	4,43%		
3	HITO MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION							
3,00	MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION							
3.1	Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapata	m3	332,70	100,00%	11,74%	11,74%		
3.2	Mejoramiento en material seleccionado en vigas de cimentación	m3	29,12	100,00%	0,54%	0,54%		
3.3	Mejoramiento en material seleccionado bajo placa contrapiso	m3	164,42	100,00%	6,11%	6,11%		
4	HITO CIMENTACION SUPERFICIAL							
4,00	CIMENTACION SUPERFICIAL							
4.1	Concreto de Limpieza	m3	11,50	100,00%	3,00%	3,00%		
4.2	Concreto de Zapatas	m3	55,54	100,00%	16,30%	16,30%		
4.3	Concreto de Vigas de Cimentación	m3	21,84	100,00%	9,88%	9,88%		
4.4	Concreto de Placa Contrapiso	m2	482,63	100,00%	17,45%	17,45%		
4.5	Acero de Zapatas	kg	2.118,47	100,00%	4,79%	4,79%		
4.6	Acero de Vigas de Cimentación	kg	2.638,13	100,00%	5,97%	5,97%		
4.7	Malta electrosoldada Placa de Contrapiso	kg	1.899,68	100,00%	4,53%	4,53%		
5	HITO ESTRUCTURA APORTICADA			%	\$ 98.618.749,09	30,82%	14,10%	4,35%
5,00	ESTRUCTURA							
5.1	Concreto Columnas	m3	15,57	72,72%	9,72%	7,08%		
5.3	Concreto Vigas de Cubierta	m3	36,42	0,00%	28,06%	0,00%		
5.4	Concreto Placa Maciza de Cubierta	m2	133,20	0,00%	17,60%	0,00%		
5.5	Acero Columnas	kg	6.601,37	100,00%	20,18%	20,18%		
5.7	Acero Vigas Adidas	kg	1.167,72	100,00%	3,57%	3,57%		
5.8	Acero Vigas de Cubierta	kg	5.540,80	0,00%	16,94%	0,00%		
5.9	Malta electrosoldada Placa Maciza de Cubierta	kg	1.293,66	0,00%	3,55%	0,00%		
6	HITO MUROS Y PINTURAS			%	\$ 75.840.626,19	0,00%	10,85%	0,00%
6,00	MAMPOSTERIA							
6.1	Muros en bloque de concreto tipo 12x12x39 color gris con hidrófugo al exterior	m2	431,75	0,00%	44,6%	0,00%		
6.2	Muros en bloque en Acilla No. 4 exterior	m2	127,08	0,00%	8,7%	0,00%		
6.5	Muro Calado En Bloque Tipo De Concreto 12x12x39 Color Gris Con Hidrófugo Al Exterior	m2	59,73	0,00%	6,2%	0,00%		
6.11	Dovelas muro en bloque de concreto incluye refuerzos y anclajes.	m	470,97	0,00%	14,7%	0,00%		
6.13	Cinta de Ramate Antepedestal incluye refuerzos y anclajes.	m	156,78	0,00%	3,4%	0,00%		
6.14	Dinteles en Concreto incluye refuerzos y anclajes	un	9,45	0,00%	0,7%	0,00%		
7	PAÑETES							
7,00	PAÑETES							
7.1	Pañeta Tipo 1.4 Sobre Mampostería	m2	258,63	0,00%	10,4%	0,00%		
7.2	Pañeta Impermeabilizado 1.4 sobre mampostería	m2	122,38	0,00%	4,6%	0,00%		
8	HITO PISOS ANDENES ENCHAPES Y ACABADOS			%	\$ 84.254.917,17	0,00%	12,05%	0,00%
8,00	ALISTADO DE PISOS							
8.1	Alistado de Pisos 1.4 es 4 cm	m2	454,93	0,00%	10,8%	0,00%		
9	HITO ENCHAPES DE PISO							
9,00	ENCHAPES DE PISO							
9.1	Piso en cerámica Nacional 30x30cm color blanco Tático 4	m2	33,93	0,00%	1,6%	0,00%		
9.2	Piso en tablita de gres Sahara formato 20 x 20 cm o similar	m2	402,44	0,00%	20,3%	0,00%		
9.3	Moleta café en Granito color Blanco	m	103,19	0,00%	1,6%	0,00%		
9.4	Zoclos De Gres Sahara 30 X 7,5 Cms O Similar	m	198,89	0,00%	5,4%	0,00%		
9.5	Enchape En Cerámica Nacional 30 X 30 Color Blanco Con Vin De Ramate De Aluminio O Plástico En Esquinas Verticales	m2	154,33	0,00%	6,2%	0,00%		
10	PINTURAS							
10,00	PINTURAS							
10.1	Estuco y Pintura vinilo lavable tipo 1 para interiores	m2	243,74	0,00%	5,3%	0,00%		
10.2	Estuco y Pintura epóxica para interiores	m2	21,53	0,00%	0,9%	0,00%		
11	MESONES							
11,00	MESONES							
11.1	Meson en concreto acabado en granito blanco fundido en obra incluye salpicadero, pódicos cilindrados y muros de apoyo enchapados lavamanos corrido	m	8,54	0,00%	0,8%	0,00%		
12	HITO CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES			%	\$ 109.966.711,88	0,00%	15,73%	0,00%
12,00	CUBIERTA							
12.1	Tela Termoadsorbente en fibra de carbono UPMO incluye estructura metálica, anticoncavo y pintura	m2	454,96	0,00%	86,6%	0,00%		
12.2	Canal en Lámina Galvanizada Cal. 18	m	65,15	0,00%	5,1%	0,00%		
12.3	Fianche en lámina galvanizada cal 20	m	42,71	0,00%	2,3%	0,00%		
13	VENTANERIA							
13,00	VENTANERIA							
13.1	Ventaneria en aluminio, cristal y perfiles de seguridad 4 milímetros incluye marco con sifón	m2	161,30	0,00%	30,2%	0,00%		
14	FUERIAS							
14,00	FUERIAS							
14.1	Puerta en lamina GR cal. 18 con persiana, malla en cristal y perfiles de seguridad 4 milímetros incluye anticoncavo y estamita	un	12,00	0,00%	9,1%	0,00%		
	Puerta para sanitario en acero inoxidable cal 18	un	6,00	0,00%	2,2%	0,00%		
15	APARATOS Y ACCESORIOS							

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2016 I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO- SEDE MERCEDES ABREGO- JAMUNDI								
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD					HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO ÍTEM	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACION AL VALOR DEL CAPÍTULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPÍTULO CON RELACION AL ÍTEM		
15.00	APARATOS Y ACCESORIOS							
15.1	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar para discapacitados	un	1,00	0,00%	0,9%	0,00%		
15.2	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar	un	6,00	0,00%	1,2%	0,00%		
15.3	Lavamanos de colgar color blanco línea institucional tipo corona o similar incluye grifería para discapacitados	un	1,00	0,00%	0,4%	0,00%		
15.4	Grifería tipo push antivandalica de pared línea institucional	un	18,00	0,00%	5,3%	0,00%		
15.6	Óval medio de colgar color blanco línea institucional	un	2,00	0,00%	0,8%	0,00%		
15.8	Juego de barra de apoyo para personas con movilidad reducida	un	2,00	0,00%	0,3%	0,00%		
15.10	Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable	un	7,00	0,00%	1,1%	0,00%		
15.11	Dispensador de jabón en acero inoxidable	un	3,00	0,00%	0,7%	0,00%		
16	ESPEJOS							
16.00	ESPEJOS							
16.1	Espejo 4mm cantos biselados y pulidos	m2	3,00	0,00%	0,6%	0,00%		
17	HITO REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS			%	\$ 146.771.285,23	12,45%	20,99%	2,61%
17.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE VOZ Y DATOS							
17.1ELC	Instalaciones Eléctricas, de voz y datos (Ver presupuesto eléctrico anexo)	global	1,00	0,00%	43,80%	0,00%		
18	HITO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED INCENDIOS							
18.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED INCENDIOS							
18.1HIDRO	Instalaciones Hidrosanitarias, de gas y red incendios (Ver presupuesto anexo)	un	1,00	23,11%	53,80%	12,45%		
19	HITO OBRAS EXTERIORES			%	\$ 15.526.125,00	0,00%	2,22%	0,00%
19.00	URBANSIMO							
19.1	Acero Perimetral en placa de concreto reforzada de 3.000 psi	m2	53,45	0,00%	62,0%	0,00%		
19.2	Siembra de árboles	un	10,00	0,00%	18,9%	0,00%		
20	IMPERMEABILIZACIONES							
20.00	IMPERMEABILIZACIONES							
20.1	Impermeabilización Placa cubierta	m2	76,91	0,00%	4,1%	0,00%		
20.2	Impermeabilización Hidrostop en Fachada	m2	204,27	0,00%	3,0%	0,00%		
21	HITO ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS			%	\$ 4.909.266,51	0,00%	0,70%	0,00%
21.00	ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS							
21.1	Aspo de obra	m2	491,78	0,00%	53,2%	0,00%		
21.2	Cargue y retiro escombros de obra	m3	94,52	0,00%	45,6%	0,00%		
							100,00%	29,75%

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO- SEDE MERCEDES ABREGO- JAMUNDI									
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO ITEMS	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ITEMS CON RELACION AL VALOR DEL CAPITULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPITULO CON RELACION AL HITO	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL /CONTEMPLADO PARA PAGO
1	HITO PRELIMINARES			%	\$ 30.260.000,00	100,00%	4,33%	4,33%	1,68%
1.00	PRELIMINARES								
1.1	Limpieza y Descapote	m2	780,00	100,00%		22,60%			
1.2	Localización Trazado y Replanteo	m2	780,00	100,00%		16,33%			
1.3	Campamento de Obra	m2	30,00	100,00%		49,57%			
1.4	Caseta Sanitaria	mes	6,00	100,00%		11,50%			
2	HITO EXCAVACION CIMENTACION Y RELLENOS			%	\$ 133.064.930,61	97,00%	19,03%	18,46%	18,46%
2.00	EXCAVACIONES								
2.1	Excavación Manual de Vigas de cimentación < 1.5 m	m3	58,25	100,00%		0,98%			
2.2	Excavación Manual de Zapatas de cimentación > 1.5 m	m3	475,29	100,00%		8,03%			
2.3	Excavación para nivelación de terreno	m3	164,49	100,00%		2,78%			
3.6	Retiro material de Excavación	m3	410,11	59,89%		7,49%			
3	HITO MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION								
3.00	MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION								
3.1	Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas	m3	338,70	100,00%		11,74%			
3.2	Mejoramiento en material seleccionado en vigas de cimentación	m3	29,12	100,00%		0,94%			
3.3	Mejoramiento en material seleccionado bajo placa contrapiso	m3	164,49	100,00%		6,11%			
4	HITO CIMENTACION SUPERFICIAL								
4.00	CIMENTACION SUPERFICIAL								
4.1	Concreto de Limpieza	m3	11,50	100,00%		3,00%			
4.2	Concreto de Zapatas	m3	35,94	100,00%		16,30%			
4.3	Concreto de Vigas de Cimentación	m3	21,84	100,00%		9,88%			
4.4	Concreto de Placa Contrapiso	m2	462,63	100,00%		17,45%			
4.5	Axero de Zapatas	kg	2.115,47	100,00%		4,79%			
4.6	Axero de Vigas de Cimentación	kg	2.636,13	100,00%		5,97%			
4.7	Malta electrosoldada Placa de Contrapiso	kg	1.899,68	100,00%		4,53%			
5	HITO ESTRUCTURA APORTICADA			%	\$ 98.618.749,09	30,82%	14,10%	4,35%	4,35%
5.00	ESTRUCTURA								
5.1	Concreto Columnas	m3	15,57	72,72%		9,73%			
5.3	Concreto Vigas de Cubierta	m3	36,49	0,00%		28,03%			
5.4	Concreto Placa Maciza de Cubierta	m2	133,20	0,00%		17,60%			
5.5	Axero Columnas	kg	6.601,97	100,00%		20,18%			
5.7	Axero Vigas Aéreas	kg	1.167,72	100,00%		3,57%			
5.8	Axero Vigas de Cubierta	kg	5.540,80	0,00%		16,94%			
5.9	Malta electrosoldada Placa Maciza de Cubierta	kg	1.293,86	0,00%		3,95%			
6	HITO MUROS Y PINTURAS			%	\$ 75.840.626,19	0,00%	10,85%	0,00%	0,00%
6.00	MAMPOSTERIA								
6.1	Muros en bloque de concreto Liso 12x19x39 color gris con hidrófugo al exterior	m2	431,75	0,00%		44,8%			
6.2	Muros en bloque en Arolla No. 4 e=8cms	m2	127,05	0,00%		6,7%			
6.5	Muro Calado En Bloque Liso De Concreto 12x19x39 Color Gris Con Hidrofugo Al Exterior	m2	56,73	0,00%		6,2%			
6.11	Dovelas muro en bloque de concreto incluye refuerzos y anclajes.	m	470,97	0,00%		14,7%			
6.13	Cinta de Remate Antepedros incluye refuerzos y anclajes.	m	155,78	0,00%		3,4%			
6.14	Dinteles en Concreto incluye refuerzo y anclajes	un	9,45	0,00%		0,7%			
7	PAÑETES								
7.00	PAÑETES								
7.1	Pañete Liso 1/4 Sobre Mampostería	m2	286,63	0,00%		10,4%			
7.2	Pañete impermeabilizado 1/4 sobre mampostería	m2	122,36	0,00%		4,8%			
8	HITO PISOS ANDENES ENCHAPES Y ACABADOS			%	\$ 84.254.917,17	0,00%	12,05%	0,00%	0,00%
8.00	ALISTADO DE PISOS								
8.1	Afinado de Pisos 1/4 e=4 cm	m2	464,99	0,00%		10,6%			
9	HITO ENCHAPES DE PISO								
9.00	ENCHAPES DE PISO								
9.1	Piso en cerámica Nacional 30x30cm color blanco Trafico 4	m2	33,93	0,00%		1,6%			
9.2	Piso en tableta de gres Sahara formato 20 x 20 cm o similar	m2	402,44	0,00%		20,3%			
9.3	Media caña en Granito color Blanco	m	103,19	0,00%		1,5%			
9.4	Zocalo De Gres Sahara 30 X 7,5 Cms O Similar	m	196,89	0,00%		5,4%			
9.5	Enchape En Ceramica Nacional 30 X 30 Color Blanco Con Win De Remate De Aluminio O Plastico En Esquinas Verticales	m2	154,33	0,00%		6,2%			
10	PINTURAS								
10.00	PINTURAS								
10.1	Estuco y Pintura vinilo lavable tipo 1 para interiores	m2	243,74	0,00%		5,3%			
10.2	Estuco y Pintura epóxica para interiores	m2	21,53	0,00%		0,9%			
11	MESONES								
11.00	MESONES								
11.1	Meson en concreto acabado en granito blanco fundido en obra incluye salpicadero bordes dilataciones y muretes de apoyo enchapados, lavamanos corrido	m	6,54	0,00%		0,8%			
12	HITO CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES			%	\$ 109.966.711,88	0,00%	15,73%	0,00%	0,00%
12.00	CUBIERTA								
12.1	Teja Termoaústica en fibra de carbono UPVC incluye estructura metálica, anticorrosivo y pintura	m2	454,96	0,00%		85,5%			
12.2	Canal en Lámina Galvanizada Cal. 18	m	65,15	0,00%		5,1%			
12.3	Plancha en lámina galvanizada cal.20	m	42,71	0,00%		2,9%			
13	VENTANERIA								
13.00	VENTANERIA								
13.1	Ventanería en aluminio, cristal y película de seguridad 4 micras. incluye marco con alfaja	m2	141,30	0,00%		30,2%			
14	PUERTAS								
14.00	PUERTAS								
14.1	Puerta en lamina CR cal. 18, con persiana, mirilla en cristal y película de seguridad 4 micras, incluye anticorrosivo y esmalte.	un	12,00	0,00%		9,1%			
	Puerta para sanitario en acero inoxidable cal 16	un	6,00	0,00%		2,2%			
15	APARATOS Y ACCESORIOS								
15.00	APARATOS Y ACCESORIOS								
15.1	Sanitario de tanque color blanco linea institucional tipo corona o similar para discapacitados	un	1,00	0,00%		0,9%			

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO- SEDE MERCEDES ABREGO- JAMUNDI									
ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO ÍTEM	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACIÓN AL VALOR DEL CAPÍTULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPÍTULO CON RELACIÓN AL HITO	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL /CONTEMPLADO PARA PAGO
15.2	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar	un	6,00	0,00%		1,2%			
15.3	Lavamanos de colgar color blanco línea institucional tipo corona o similar incluye grifería para discapacitados	un	1,00	0,00%		0,4%			
15.4	Grifería tipo push antivandalica de pared línea institucional	un	16,00	0,00%		5,5%			
15.6	Orinal mediano de colgar color blanco línea institucional	un	2,00	0,00%		0,6%			
15.8	Juego de barras de apoyo para personas con movilidad reducida	un	2,00	0,00%		0,3%			
15.10	Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable	un	7,00	0,00%		1,1%			
15.11	Dispensador de Jabón en acero inoxidable	un	3,00	0,00%		0,7%			
16	ESPEJOS								
16,00	ESPEJOS								
16.1	Espejo 4mm cantos biselados y pulidos	m2	3,00	0,00%		0,6%			
17	HITO REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS			%	\$ 146.771.265,23	12,45%	20,99%	2,61%	2,61%
17,00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE VOZ Y DATOS								
17.1ELC	Instalaciones Eléctricas, de voz y datos (Ver presupuesto eléctrico anexo)	global	1,00	0,00%		48,20%			
18	HITO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED INCENDIOS								
18,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED INCENDIOS								
18.1HIDRO	Instalaciones hidrosanitarias, de gas y red incendio (ver presupuesto anexo)	un	1,00	23,14%		53,60%			
19	HITO OBRAS EXTERIORES			%	\$ 15.526.125,00	0,00%	2,22%	0,00%	0,00%
19,00	URBANISMO								
19.1	Andén Perimetral en placa de concreto reforzado de 8.000 psi	m2	83,45	0,00%		82,0%			
19.2	Siembra de árboles	un	10,00	0,00%		18,0%			
20	IMPERMEABILIZACIONES								
20,00	IMPERMEABILIZACIONES								
20.1	Impermeabilización Placa cubierta	m2	76,91	0,00%		4,1%			
20.2	Impermeabilización Hidrojugen Fachada	m2	204,27	0,00%		3,0%			
21	HITO ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS			%	\$ 4.909.266,51	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%
21,00	ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS								
21.1	Aseo de obra	m2	491,76	0,00%		53,2%			
21.2	Cargue y retiro escombros de obra	m3	94,52	0,00%		46,6%			
							100,00%	29,75%	27,10%

I.E LA MERCED SEDE PRINCIPAL

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 I.E. LA MERCED-CALI								
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO ÍTEM	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACION AL VALOR DEL CAPITULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPITULO CON RELACION AL ÍTEM	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL
1	HITO PRELIMINARES				\$ 45.370.000,00	92,33%	1,95%	1,80%
1.00	PRELIMINARES							
1.1	Limpieza y Descapeo	m2	1.680,00	100,00%	32,63%	32,63%		
1.2	Localización Trazado y Replanteo	m2	1.680,00	100,00%	23,78%	23,81%		
1.3	Carpentado de Cera	m2	30,00	100,00%	33,06%	33,11%		
1.4	Cereta Santaria	mes	8,00	25,00%	10,23%	2,61%		
2	HITO EXCAVACION CIMENTACION Y RELLENOS				\$ 275.574.999,40	15,51%	11,85%	1,84%
2.00	EXCAVACIONES							
2.1	Excavación Manual de Vigas de cimentación < 1.5 m	m3	107,36	0,00%	0,68%	0,00%		
2.2	Excavación Manual de Zapatas de cimentación > 1.5 m	m3	338,97	100,00%	3,16%	3,16%		
2.3	Excavación para nivelación de terreno	m3	304,67	100,00%	2,52%	2,52%		
3.5	Retro material de Excavación	m3	627,13	78,41%	7,82%	6,13%		
3	HITO MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION							
3.00	MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION							
3.1	Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas	m3	221,42	100,00%	3,70%	3,70%		
3.2	Mejoramiento en material seleccionado en vigas de cimentación	m3	45,15	0,00%	0,72%	0,00%		
3.3	Mejoramiento en material seleccionado bajo placa contrapié	m3	338,97	0,00%	5,64%	0,00%		
4	HITO CIMENTACION SUPERFICIAL							
4.00	CIMENTACION SUPERFICIAL							
4.1	Concreto de Limpieza	m3	7,58	0,00%	0,59%	0,00%		
4.2	Concreto de Zapatas	m3	89,51	0,00%	19,62%	0,00%		
4.3	Concreto de Vigas de Cimentación	m3	82,68	0,00%	18,09%	0,00%		
4.4	Concreto de Placa Contrapié	m2	1.023,91	0,00%	18,74%	0,00%		
4.5	Acero de Zapatas	kg	2.731,26	0,00%	2,99%	0,00%		
4.6	Acero de Vigas de Cimentación	kg	9.429,40	0,00%	10,31%	0,00%		
4.7	Malla electrosoldada Placa de Contrapié	kg	4.350,09	0,00%	5,01%	0,00%		
5	HITO ESTRUCTURA VAPORIZADA				\$ 758.947.609,38	0,00%	32,64%	0,00%
5.00	ESTRUCTURA							
5.1	Concreto Columnas	m3	61,50	0,00%	6,62%	0,00%		
5.2	Concreto Placa Aérea	m2	564,00	0,00%	27,56%	0,00%		
5.3	Concreto Vigas de Cubierta	m3	45,02	0,00%	4,59%	0,00%		
5.4	Concreto Placa Maciza de Cubierta	m2	45,04	0,00%	0,79%	0,00%		
5.5	Acero Columnas	kg	33.654,56	0,00%	13,43%	0,00%		
5.6	Malla electrosoldada Placa Aérea entrepisos	kg	28.453,82	0,00%	11,51%	0,00%		
5.7	Acero Vigas Aéreas	kg	28.200,94	0,00%	11,24%	0,00%		
5.8	Acero Vigas de Cubierta	kg	8.434,08	0,00%	2,56%	0,00%		
5.9	Malla electrosoldada Placa Maciza de Cubierta	kg	1.373,85	0,00%	0,55%	0,00%		
6	HITO MUROS Y PINTURA				\$ 276.958.861,40	0,00%	11,91%	0,00%
6.00	MANPOSTERIA							
6.1	Muros en bloque de concreto Liso 12x15x39 color gris con Hidrotejo al exterior	m2	1.231,02	0,00%	34,57%	0,00%		
6.2	Muros en Bloque en Acilla No. 4 e-8oma	m2	563,95	0,00%	10,43%	0,00%		
6.5	Muro Calado En Bloque Liso De Concreto 12x15x39 Color Gris Con Hidrotejo Al Exterior	m2	268,16	0,00%	6,42%	0,00%		
6.10	Columnetas en Concreto incluye refuerzo y anclajes	m	1.019,99	0,00%	8,73%	0,00%		
6.11	Dovelas muro en bloque de concreto incluye refuerzo y anclajes	m	1.552,45	0,00%	13,25%	0,00%		
6.13	Cinta de Remate Antepechos incluye refuerzos y anclajes	m	492,51	0,00%	2,97%	0,00%		
6.14	Dinteles en Concreto incluye refuerzo y anclajes	un	30,71	0,00%	0,64%	0,00%		
7	PANETES							
7.00	PANETES							
7.1	Pañeta Liso 1/4 Sobre Mampostería	m2	1.292,17	0,00%	12,63%	0,00%		
7.2	Pañeta Impermeabilizado 1/4 sobre mampostería	m2	893,65	0,00%	9,67%	0,00%		
8	HITO PISOS Y DISEÑOS ENCHAPES Y ACABADOS				\$ 282.263.783,54	0,00%	12,57%	0,00%
8.00	ALISTADO DE PISOS							
8.1	Afinado de Pisos 1/4 en 4 cm	m2	2.061,61	0,00%	13,66%	0,00%		
9	ENCHAPES DE PISO							
9.00	ENCHAPES DE PISO							
9.1	Piso en cerámica Nacional 30x30cm color blanco Tráfico 4	m2	205,88	0,00%	2,84%	0,00%		
9.2	Piso en tabletas de gres Sahara formato 20 x 20 cm o similar	m2	1.635,93	0,00%	26,59%	0,00%		
9.3	Malla café en Granito color Blanco	m	227,16	0,00%	1,17%	0,00%		
9.4	Zocalo De Gres Sahara 30 X 7,5 Oms O Similar	m	833,54	0,00%	6,82%	0,00%		
9.5	Enchape En Cerámica Nacional 30 X 30 Color Blanco Con Win De Remate De Aluminio O Plástico En Esquinas Verticales	m2	445,43	0,00%	5,16%	0,00%		
10	PINTURAS							
10.00	PINTURAS							
10.1	Estuco y Pintura vinilo lavable tipo 1 para interiores	m2	1.652,08	0,00%	9,81%	0,00%		
10.2	Estuco y Pintura epóxica para interiores	m2	25,70	0,00%	0,23%	0,00%		
11	MESONES							
11.00	MESONES							
11.1	Meson en concreto acabado en granito blanco fundido en obra incluye sapicadero bordes dilataciones y muretes de apoyo enchapados lavamanos corrido	m	21,12	0,00%	0,78%	0,00%		
12	HITO CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES				\$ 212.718.914,36	0,00%	10,44%	0,00%
12.00	CUBIERTA							
12.1	Tela Termosoldada en fibra de carbono LFTV incluye estructura metálica, anticonvelo y pintura	m2	543,77	0,00%	60,80%	0,00%		
12.2	Canal en Lámina Galvanizada Cal 18	m	179,67	0,00%	6,22%	0,00%		
12.3	Plancha en lámina galvanizada cal 20	m	192,05	0,00%	4,57%	0,00%		
13	VENTANERIA							
13.00	VENTANERIA							
13.1	Ventanería en aluminio, cristal y pellova de seguridad 4 milras, incluye marco con alijá	m2	447,74	0,00%	27,57%	0,00%		
14	PUERTAS							
14.00	PUERTAS							
14.1	Puerta en lámina CR cal 18, con persiana, malla en cristal y pellova de seguridad 4 milras, incluye anticonvelo y ensaba	un	27,00	0,00%	5,87%	0,00%		
14.3	Puerta para sanitario en acero inoxidable cal 18	un	14,00	0,00%	1,43%	0,00%		
15	APARATOS Y ACCESORIOS							
15.00	APARATOS Y ACCESORIOS							

			CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 I.E. LA MERCED-CALI					
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a las Areas o productos contractados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO ITEMS	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ITEMS CON RELACION AL VALOR DEL CAPITULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPITULO CON RELACION AL HITO	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL
15.1	Sanitario de tanque color blanco linea institucional tipo corona o similar para discapacitados	un	1,00	0,00%	0,23%	0,00%		
15.2	Sanitario de tanque color blanco linea institucional tipo corona o similar	un	13,00	0,00%	0,90%	0,00%		
15.3	Lavamanos de colgar color blanco linea institucional tipo corona o similar incluye griferia para discapacitados	un	2,00	0,00%	0,26%	0,00%		
15.3a	Lavamanos Blanco de colgar tipo corona o similar incluye griferia	un	2,00	0,00%	0,24%	0,00%		
15.4	Griferia tipo push antivandalica de pared linea institucional	un	24,00	0,00%	2,29%	0,00%		
15.6	Orinal mediano de colgar color blanco linea institucional	un	9,00	0,00%	1,10%	0,00%		
15.8	Juego de barras de apoyo para personas con movilidad reducida	un	2,00	0,00%	0,06%	0,00%		
15.10	Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable	un	7,00	0,00%	0,31%	0,00%		
15.11	Dispensador de Jabón en acero inoxidable	un	13,00	0,00%	0,83%	0,00%		
16	ESPEJOS							
16.00	ESPEJOS							
16.1	Espejo 4mm canto biselado y pulido	m2	13,00	0,00%	1,17%	0,00%		
17	HITO REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				\$	396.468.786,98	0,00%	
17.00	INSTALACIONES ELECTRICAS, DE VOZ Y DATOS						17,05%	0,00%
17.1ELO	Instalaciones Eléctricas, de voz y datos (Ver presupuesto eléctrico anexo)	global	1,00	0,00%	\$3,27%	0,00%		
18	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED INCENDIOS							
18.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED INCENDIOS							
18.1HIDRO	Instalaciones Hidrosanitarias, de gas y red incendios (ver presupuesto anexo)	un	1,00	0,00%	61,73%	0,00%		
19	HITO OBRAS EXTERIORES				\$	19.662.125,00	0,00%	
19.00	URBANISMO						0,84%	0,00%
19.1	Andén Perimetral en placa de concreto reforzado de 3.000 psi	m2	109,85	0,00%	55,69%	0,00%		
19.2	Siembra de flores	un	10,00	0,00%	14,32%	0,00%		
20	IMPERMEABILIZACIONES							
20.00	IMPERMEABILIZACIONES							
20.1	Impermeabilización Pasa cubierta	m2	30,76	0,00%	0,76%	0,00%		
20.2	Impermeabilización Hidrólogo en Fachada	m2	1.134,23	0,00%	7,49%	0,00%		
21	HITO ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS				\$	17.102.895,65	0,00%	
21.00	ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS						0,74%	0,00%
21.1	Area de obra	m2	2.282,44	0,00%	70,27%	0,00%		
21.2	Carga y retiro escombros de obra	m3	209,42	0,00%	29,73%	0,00%		
22	RAMPA ELEVADA EN CONCRETO							
22.1	Rampa elevada en concreto reforzado 3000 psi, incluye barandas en tubular de acero y pintura esmalte blanco	m2	204,59	0,00%	13,47%	0,00%		
23	ESCALERA ELEVADA EN CONCRETO							
23.1	Escala elevada en concreto reforzado 3000 psi, incluye barandas en tubular de acero y pintura esmalte blanco	m2	188,00	0,00%	3,07%	0,00%		
							100,00%	3,64%

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 I.E. LA MERCED-CALI									
ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO ÍTEM	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACIÓN AL VALOR DEL CAPÍTULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPÍTULO CON RELACIÓN AL ÍTEM	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL /CONTEMPLADO PARA PAGO
1	HITO PRELIMINARES			%	\$ 45.370.000,00	92,33%	1,95%	1,80%	0,00%
1.00	PRELIMINARES								
1.1	Limpieza y Descapote	m2	1.660,00	100,00%	32,63%	32,9%			
1.2	Localización Trazado y Replanteo	m2	1.680,00	100,00%	23,78%	23,8%			
1.3	Campamento de Obra	m2	30,00	100,00%	33,06%	33,1%			
1.4	Caseta Sanitaria	mes	8,00	25,00%	10,23%	2,6%			
2	HITO EXCAVACION CIMENTACION Y RELLENOS			%	\$ 275.574.999,40	15,51%	11,85%	1,84%	0,00%
2.00	EXCAVACIONES								
2.1	Excavación Manual de Vigas de cimentación < 1.5 m	m3	107,36	0,00%	0,88%	0,00%			
2.2	Excavación Manual de Zapatas de cimentación > 1.5 m	m3	386,97	100,00%	3,16%	3,16%			
2.3	Excavación para nivelación de terreno	m3	308,67	100,00%	2,52%	2,52%			
3.5	Retiro material de Excavación	m3	887,13	78,41%	7,82%	6,13%			
3	HITO MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION								
3.00	MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION								
3.1	Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas	m3	221,42	100,00%	3,70%	3,70%			
3.2	Mejoramiento en material seleccionado en vigas de cimentación	m3	46,15	0,00%	0,72%	0,00%			
3.3	Mejoramiento en material seleccionado bajo placa contrapiso	m3	308,67	0,00%	5,54%	0,00%			
4	HITO CIMENTACION SUPERFICIAL								
4.00	CIMENTACION SUPERFICIAL								
4.1	Concreto de Limpieza	m3	7,58	0,00%	0,96%	0,00%			
4.2	Concreto de Zapatas	m3	89,51	0,00%	19,60%	0,00%			
4.3	Concreto de Vigas de Cimentación	m3	82,69	0,00%	18,92%	0,00%			
4.4	Concreto de Placa Contrapiso	m2	1.028,91	0,00%	18,74%	0,00%			
4.5	Acero de Zapatas	kg	2.731,26	0,00%	2,99%	0,00%			
4.6	Acero de Vigas de Cimentación	kg	9.429,40	0,00%	10,81%	0,00%			
4.7	Malla electrosoldada Placa de Contrapiso	kg	4.350,69	0,00%	5,01%	0,00%			
5	HITO ESTRUCTURA APORTICADA			%	\$ 758.947.509,66	0,00%	32,64%	0,00%	0,00%
5.00	ESTRUCTURA								
5.1	Concreto Columnas	m3	81,50	0,00%	6,52%	0,00%			
5.2	Concreto Placa Aérea	m2	954,00	0,00%	27,96%	0,00%			
5.3	Concreto Vigas de Cubierta	m3	46,02	0,00%	4,59%	0,00%			
5.4	Concreto Placa Maciza de Cubierta	m2	46,04	0,00%	0,79%	0,00%			
5.5	Acero Columnas	kg	33.854,56	0,00%	13,45%	0,00%			
5.6	Malla electrosoldada Placa Aérea entrepiso	m2	28.483,82	0,00%	11,31%	0,00%			
5.7	Acero Vigas Aéreas	kg	28.260,94	0,00%	11,24%	0,00%			
5.8	Acero Vigas de Cubierta	kg	6.434,08	0,00%	2,96%	0,00%			
5.9	Malla electrosoldada Placa Maciza de Cubierta	kg	1.373,85	0,00%	0,56%	0,00%			
6	HITO MUROS Y PINTURA			%	\$ 276.968.861,40	0,00%	11,91%	0,00%	0,00%
6.00	MAMPOSTERIA								
6.1	Muros en bloque de concreto Liso 12x19x39 color gris con hidrófugo al exterior	m2	1.231,02	0,00%	34,97%	0,00%			
6.2	Muros en bloque en Arcilla No. 4 e=8cms	m2	553,55	0,00%	10,43%	0,00%			
6.5	Muro Calado En Bloque Liso De Concreto 12x19x39 Color Gris Con Hidrófugo Al Exterior	m2	226,16	0,00%	6,42%	0,00%			
6.10	Columnetas en Concreto incluye refuerzos y anclajes.	m	1.019,98	0,00%	8,73%	0,00%			
6.11	Dovelas muro en bloque de concreto incluye refuerzos y anclajes.	m	1.552,46	0,00%	13,29%	0,00%			
6.13	Cinta de Remate Antapachos incluye refuerzos y anclajes.	m	492,51	0,00%	2,97%	0,00%			
6.14	Dinteles en Concreto incluye refuerzo y anclajes	un	30,71	0,00%	0,64%	0,00%			
7	PAÑETES								
7.00	PAÑETES								
7.1	Pañete Liso 1:4 Sobre Mampostería	m2	1.292,17	0,00%	12,88%	0,00%			
7.2	Pañete Impermeabilizado 1:4 sobre mampostería	m2	895,86	0,00%	9,67%	0,00%			
8	HITO PISOS ANDENES ENCHAPES Y ACABADOS			%	\$ 292.283.264,54	0,00%	12,57%	0,00%	0,00%
8.00	ALISTADO DE PISOS								
8.1	Afinado de Pisos 1:4 e= 4 cm	m2	2.061,81	0,00%	13,86%	0,00%			
9	ENCHAPES DE PISO								
9.00	ENCHAPES DE PISO								
9.1	Piso en cerámica Nacional 30x30cm color blanco Trafico 4	m2	205,88	0,00%	2,84%	0,00%			
9.2	Piso en tabletas de gres Sahara formato 20 x 20 cm o similar	m2	1.855,93	0,00%	26,98%	0,00%			
9.3	Media caña en Granito color Blanco	m	227,16	0,00%	1,17%	0,00%			
9.4	Zocalo De Gres Sahara 30 X 7,5 Cms O Similar	m	853,64	0,00%	6,80%	0,00%			
9.5	Enchape En Cerámica Nacional 30 X 30 Color Blanco Con Win De Remate De Aluminio O Plástico En Esquinas Verticales	m2	445,43	0,00%	5,16%	0,00%			
10	PINTURAS								
10.00	PINTURAS								
10.1	Estuco y Pintura vinilo lavable tipo 1 para interiores	m2	1.652,08	0,00%	9,81%	0,00%			
10.2	Estuco y Pintura epóxica para interiores	m2	25,70	0,00%	0,25%	0,00%			
11	MESONES								
11.00	MESONES								
11.1	Meson en concreto acabado en granito blanco fundido en obra incluye sapicadero bordes dilataciones y muretes de apoyo enchapados. lavamanos corrido	m	21,12	0,00%	0,78%	0,00%			
12	HITO CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES			%	\$ 242.713.914,36	0,00%	10,44%	0,00%	0,00%
12.00	CUBIERTA								
12.1	Teja Termoséptica en fibra de carbono UPVC incluye estructura metálica, anticoncreto y pintura	m2	948,77	0,00%	80,80%	0,00%			
12.2	Canal en Lámina Galvanizada Cal. 18	m	176,87	0,00%	5,29%	0,00%			
12.3	Flancho en lámina galvanizada cal 20	m	192,05	0,00%	4,67%	0,00%			
13	VENTANERIA								
13.00	VENTANERIA								
13.1	Ventanería en aluminio, cristal y película de seguridad 4 micras. Incluye marco con alfiler	m2	447,74	0,00%	27,57%	0,00%			
14	PUERTAS								
14.00	PUERTAS								
14.1	Puerta en lámina CR cal. 18, con persiana, mirilla en cristal y película de seguridad 4 micras, incluye anticoncreto y esmalte.	un	27,00	0,00%	5,87%	0,00%			
14.3	Puerta para sanitario en acero inoxidable cal 18	un	14,00	0,00%	1,48%	0,00%			
15	APARATOS Y ACCESORIOS								
15.00	APARATOS Y ACCESORIOS								
15.1	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar para discapacitados	un	1,00	0,00%	0,27%	0,00%			
15.2	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar	un	15,00	0,00%	0,90%	0,00%			
15.3	Lavamanos de colgar color blanco línea institucional tipo corona o similar incluye grifería para discapacitados	un	2,00	0,00%	0,28%	0,00%			
15.3a	Lavamanos Blanco de colgar tipo corona o similar incluye grifería	un	2,00	0,00%	0,24%	0,00%			
15.4	Grifería tipo push antivandalismo de pared línea institucional	un	24,00	0,00%	2,29%	0,00%			
15.6	Orinal mediano de colgar color blanco línea institucional	un	9,00	0,00%	1,10%	0,00%			
15.8	Juego de barras de apoyo para personas con movilidad reducida	un	2,00	0,00%	0,08%	0,00%			
15.10	Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable	un	7,00	0,00%	0,31%	0,00%			
15.11	Dispensador de Jabón en acero inoxidable	un	13,00	0,00%	0,63%	0,00%			
16	ESPEJOS								

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 I.E. LA MERCED-CALI									
ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO ÍTEM	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACIÓN AL VALOR DEL CAPÍTULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPÍTULO CON RELACIÓN AL HITO	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL /CONTEMPLADO PARA PAGO
16.00	ESPEJOS								
16.1	Espejo 4mm cantos biselados y pulidos	m2	19,00	0,00%	1,17%	0,00%			
17	HITO REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS			%	\$ 396.468.766,88	0,00%	17,05%	0,00%	0,00%
17.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE VOZ Y DATOS								
17.1ELC	Instalaciones Eléctricas, de voz y datos (Ver presupuesto eléctrico anexo)	global	1,00	0,00%	38,27%	0,00%			
18	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED INCENDIOS								
18.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED INCENDIOS								
18.1HIDRO	Instalaciones hidrosanitarias, de gas y red incendios (ver presupuesto anexo)	un	1,00	0,00%	61,73%	0,00%			
19	HITO OBRAS EXTERIORES			%	\$ 19.552.125,00	0,00%	0,84%	0,00%	0,00%
19.00	URBANISMO								
19.1	Andén Perimetral en placa de concreto reforzado de 3.000 psi	m2	109,65	0,00%	85,68%	0,00%			
19.2	Siembra de árboles	un	10,00	0,00%	14,32%	0,00%			
20	IMPERMEABILIZACIONES								
20.00	IMPERMEABILIZACIONES								
20.1	Impermeabilización Placa cubierta	m2	30,76	0,00%	0,75%	0,00%			
20.2	Impermeabilización Hidrofugo en Fachada	m2	1.134,23	0,00%	7,48%	0,00%			
21	HITO ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS			%	\$ 17.109.895,65	0,00%	0,74%	0,00%	0,00%
21.00	ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS								
21.1	Aseo de obra	m2	2.262,44	0,00%	70,27%	0,00%			
21.2	Cargue y retiro escombros de obra	m3	209,42	0,00%	29,73%	0,00%			
22	RAMPA ELEVADA EN CONCRETO								
22.1	Rampa elevada en concreto reforzado 3000 psi, incluye barandas en tubular de acero y pintura esmalte blanco	m2	204,59	0,00%	18,47%	0,00%			
23	ESCALERA ELEVADA EN CONCRETO								
23.1	Escalera elevada en concreto reforzado 3000 psi, incluye barandas en tubular de acero y pintura esmalte blanco	m2	188,00	0,00%	3,07%	0,00%			
							100,00%	3,64%	0,00%

I.E DEL VALLE JULIO CESAR ARCE

CONTRATO PAF-JU02-G02DC/2015 I.E. DEL VALLE JULIO CESAR ARCE- PALMIRA								
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems a pagar por el contratador)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PORCENTUAL PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACION AL VALOR DEL CAPÍTULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPÍTULO CON RELACION AL ÍTEM	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL
1	HITO : PRELIMINARES				\$ 30.350.270,00	100,00%	3,35%	3,35%
1.00	PRELIMINARES							
1.1	Limpieza y Descape	m2	997,83	100%	29,58%	29,58%		
1.2	Localización Trazado y Ripleo	m2	445,00	100%	9,53%	9,53%		
1.3	Campamento de Obra	m2	80,50	100%	49,42%	49,42%		
1.4	Caseta Sanitaria	m2	8,00	100%	11,47%	11,47%		
2	HITO EXCAVACION CIMENTACION Y RELLENOS				\$ 154.287.768,22	100,00%	17,02%	17,02%
2.00	EXCAVACIONES							
2.1	Excavación Manual de Vigas de cimentación < 1.5 m	m3	157,15	100%	2,29%	2,29%		
2.2	Excavación Manual de Zapatas de cimentación < 1.5 m	m3	179,32	100%	2,60%	2,60%		
2.3	Excavación para instalación de terreno	m3	67,66	100%	0,84%	0,84%		
2.4	Relleno material de Excavación	m3	347,66	100%	5,43%	5,43%		
3	HITO : MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION							
3.00	MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION							
3.1	Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas	m3	60,75	100%	1,52%	1,52%		
3.2	Mejoramiento en material seleccionado en vigas de cimentación	m3	61,67	100%	2,56%	2,56%		
3.3	Mejoramiento en material seleccionado bajo placa contrapiso	m3	57,66	100%	1,86%	1,86%		
4	HITO : CIMENTACION SUPERFICIAL							
4.00	CIMENTACION SUPERFICIAL							
4.1	Concreto de Limpieza	m3	13,76	100%	3,10%	3,10%		
4.2	Concreto de Zapatas	m3	26,15	100%	10,22%	10,22%		
4.3	Concreto de Vigas de Cimentación	m3	54,84	100%	21,62%	21,62%		
4.4	Concreto de Placa Contrapiso	m2	819,04	100%	29,61%	29,61%		
4.5	Axero de Zapatas	kg	1.191,73	100%	2,33%	2,33%		
4.6	Axero de Vigas de Cimentación	kg	6.261,06	100%	12,29%	12,29%		
4.7	Malta electrodos de Placa de Contrapiso	kg	3.934,80	100%	6,91%	6,91%		
5	HITO ESTRUCTURA APORTICADA				\$ 129.899.834,34	43,96%	14,33%	6,30%
5.00	ESTRUCTURA							
5.1	Concreto Columnas	m3	48,12	100%	21,88%	21,88%		
5.2	Concreto Vigas de Cubierta	m3	69,16	0%	54,52%	0,00%		
5.3	Concreto Placa Madre de Cubierta	m2	80,45	0%	0,19%	0,00%		
5.4	Axero Columnas	kg	9.515,27	100%	22,08%	22,08%		
5.5	Axero Vigas Alceas	kg	7.457,06	0%	17,90%	0,00%		
5.6	Malta electrodos de Placa Madre de Cubierta	kg	1.743,15	0%	4,65%	0,00%		
6	HITO MUROS Y PINTURAS				\$ 84.470.774,71	0,00%	9,32%	0,00%
6.00	MAMPOSTERIA							
6.1	Muros en Bloque de concreto Liso 12x19x30 color gris con hidrófugo al exterior	m2	219,19	0%	20,41%	0,00%		
6.2	Muros en Bloque en Acolla No. 4 exterior	m2	473,04	0%	29,23%	0,00%		
6.3	Columnas en Concreto incluye refuerzos y anclajes	m	219,32	0%	6,16%	0,00%		
6.4	Dovelas muro en bloque de concreto incluye refuerzos y anclajes	m	140,66	0%	3,99%	0,00%		
6.5	Cinta de Remate Antepedimentos incluye refuerzos y anclajes	m	123,50	0%	2,54%	0,00%		
6.6	Drifales en Concreto incluye refuerzos y anclajes	m	14,36	0%	0,97%	0,00%		
7	HITO : PAÑETES							
7.00	PAÑETES							
7.1	Pañeta Liso 1.4 Sobre Mampostería	m2	401,22	0%	13,12%	0,00%		
7.2	Pañeta impermeabilizado 1.4 sobre mampostería	m2	297,22	0%	10,51%	0,00%		
8	HITO PISOS ANDENES ENCHAPES Y ACABADOS				\$ 186.734.532,84	0,00%	15,08%	0,00%
8.00	ALUSTADO DE PISOS							
8.1	Alustado de Pasa 1.4 de 4 cm	m2	893,01	0%	12,65%	0,00%		
9	HITO : ENCHAPE DE PISOS							
9.00	ENCHAPE DE PISOS							
9.1	Piso en cerámica Nacional 30x30cm color Blanco Tráfico 4	m2	170,54	0%	5,64%	0,00%		
9.2	Piso en tabletas de gres Sahara formato 20 x 20 cm o similar	m2	723,99	0%	22,64%	0,00%		
9.3	Mezcla de arena en Gravel color Blanco	m	237,70	0%	2,62%	0,00%		
9.4	Zoclo De Gres Sahara 30 X 7.5 Cms O Similar	m	157,60	0%	2,66%	0,00%		
9.5	Enchape En Cerámica Nacional 30 X 30 Color Blanco Con Vin De Remate De Aluminio O Pícaro En Esquinas Verticales	m2	238,19	0%	7,11%	0,00%		
10	PINTURAS							
10.00	PINTURAS							
10.1	Esbozo y Pintura vinilo lavable tipo I para interiores	m2	608,24	0%	12,19%	0,00%		
10.2	Esbozo y Pintura epóxica para interiores	m2	25,67	0%	0,91%	0,00%		
11	HITO : MESONES							
11.00	MESONES							
11.1	Esbozo y Pintura vinilo lavable en gres color blanco en sala de estar salpicadero bordes dilataciones y muretas de apoyo enlajados lavaderos	m	17,20	0%	1,36%	0,00%		
12	HITO CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES				\$ 169.781.557,89	0,00%	18,73%	0,00%
12.00	CUBIERTA							
12.1	Tapa Termoplasticas en fibra de carbono UPVC incluye estructura metálica reforzadora y pintura	m2	722,02	0%	87,61%	0,00%		
12.2	Canal en Lámina Galvanizada Cal. 18	m	124,12	0%	5,24%	0,00%		
12.3	Pancho en lámina galvanizada cal. 20	m	45,58	0%	1,61%	0,00%		
13	VENTANARIA							
13.00	VENTANARIA							
13.1	Ventana en aluminio, cristal y película de seguridad 4 mm. Incluye marco con agua	m2	138,84	0%	19,28%	0,00%		
14	PUERTAS							
14.00	PUERTAS							
14.1	Puerta en lámina OR cal. 18 con persiana móvil en cristal y película de seguridad 4 mm. Incluye reforzadora y asfalto	un	16,00	0%	7,44%	0,00%		
14.2	Puerta para sanitario en acero inoxidable cal. 18	un	12,00	0%	2,72%	0,00%		
15	APARATOS Y ACCESORIOS							

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 I.E. DEL VALLE JULIO CESAR ARCE- TALEMIRA								
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO/ITEMS	PROCENTUAL POR-CENTUAL DEL ÍTEM CON RELACIÓN AL VALOR DEL CAPÍTULO	EJECUTADO POR-CENTUAL TOTAL DEL CAPÍTULO CON RELACIÓN AL ÍTEM	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL
15.00	APARATOS Y ACCESORIOS							
15.1	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar para		1.00	0%	0.56%	0.00%		
15.2	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar		13.00	0%	1.66%	0.00%		
15.3	Lavamanos de colgar color blanco línea institucional tipo corona o similar para		1.00	0%	0.29%	0.00%		
15.3a	Lavamanos de colgar color blanco línea institucional tipo corona o similar incluye		21.00	0%	5.52%	0.00%		
15.4	Orinal tipo push arriba de la pared línea institucional		12.00	0%	2.45%	0.00%		
15.6	Orinal mediano de colgar color blanco línea institucional		3.00	0%	0.79%	0.00%		
15.8	Juego de bañita de apoyo para personas con movilidad reducida		2.00	0%	0.17%	0.00%		
15.9	Lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial 60x40 60x50 incluye		10.00	0%	0.71%	0.00%		
15.10	Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable		17.00	0%	1.66%	0.00%		
15.11	Dispensador de Jabón en acero inoxidable		17.00	0%	2.33%	0.00%		
15.12a	Juego instalaciones de baño		2.00	0%	0.13%	0.00%		
16	ESPEJOS							
16.00	ESPEJOS							
16.1	Espejo 4mm canto biselado y pulido	m2	6.63	0%	0.97%	0.00%		
17	HITO REDES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS			%	\$ 173,249,246.38	19.45%	19,11%	3,72%
17.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE VOZ Y DATOS							
17	Instalaciones Eléctricas de Voz y Datos	g	1.00	3.26%	47.33%	1.54%		
18	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED INCENDIOS							
18.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED INCENDIOS							
18	Instalaciones Hidrosanitarias de Gas y Red de Incendios	g	1.00	34.00%	59.67%	17.61%		
19	HITO OBRAS EXTERIORES			%	\$ 19,849,500.00	0.00%	2,19%	0,00%
19.00	URBANISMO							
19.1	Andén Perimetral en placa de concreto reforzado de 3.000 psi	m2	111.90	0%	85.60%	0.00%		
19.2	Sanitoria de Antibias	un	10.00	0%	14.11%	0.00%		
20	IMPERMEABILIZACIONES							
20.00	IMPERMEABILIZACIONES							
20.1	Impermeabilización Placa cubierta	m2	60.60	0%	2.82%	0.00%		
20.2	Impermeabilización Hidrófugo en Fachada	m2	256.26	0%	2.42%	0.00%		
21	HITO : ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS			%	\$ 7,849,166.23	0.00%	0,87%	0,00%
21.00	ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS							
21.1	Aseo de obra	m2	640.34					
21.2	Cargas y retiro de escombros de obra	m2	117.42					
							100,00%	30,39%

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 I.E. DEL VALLE JULIO CESAR ARCE- PALMIRA									
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO ÍTEM	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACION AL VALOR DEL CAPÍTULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPÍTULO CON RELACION AL ÍTEM	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL /CONTEMPLADO PARA PAGO
1	HITO - PRELIMINARES			%	\$ 30.350.270,00	100,00%	3,35%	3,35%	1,69%
1.00	PRELIMINARES								
1.1	Limpieza y Descapote	m2	697,53	100%	29,58%	29,58%			
1.2	Localización Trazado y Replanteo	m2	445,00	100%	9,53%	9,53%			
1.3	Campamento de Obra	m2	30,00	100%	49,42%	49,42%			
1.4	Caseta Sanitaria	mas	6,00	100%	11,47%	11,47%			
2	HITO EXCAVACION CIMENTACION Y RELLENOS			%	\$ 154.287.768,22	100,00%	17,02%	17,02%	17,02%
2.00	EXCAVACIONES								
2.1	Excavación Manual de Vigas de cimentación < 1,5 m	m3	157,15	100%	2,29%	2,29%			
2.2	Excavación Manual de Zapatas de cimentación > 1,5 m	m3	178,32	100%	2,60%	2,60%			
2.3	Excavación para nivelación de terreno	m3	57,96	100%	0,84%	0,84%			
2.4	Retiro material de Excavación	m3	347,95	100%	5,48%	5,48%			
3	HITO - MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION								
3.00	MEJORAMIENTO PARA CIMENTACION								
3.1	Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas	m3	50,75	100%	1,52%	1,52%			
3.2	Mejoramiento en material seleccionado en vigas de cimentación	m3	91,67	100%	2,56%	2,56%			
3.3	Mejoramiento en material seleccionado bajo placa contrapiso	m3	57,66	100%	1,86%	1,86%			
4	HITO - CIMENTACION SUPERFICIAL								
4.00	CIMENTACION SUPERFICIAL								
4.1	Concreto de Limpieza	m3	13,76	100%	3,10%	3,10%			
4.2	Concreto de Zapatas	m3	26,15	100%	10,22%	10,22%			
4.3	Concreto de Vigas de Cimentación	m3	54,84	100%	21,40%	21,40%			
4.4	Concreto de Placa Contrapiso	m2	818,04	100%	26,61%	26,61%			
4.5	Acero de Zapatas	kg	1.191,73	100%	2,33%	2,33%			
4.6	Acero de Vigas de Cimentación	kg	6.291,05	100%	12,29%	12,29%			
4.7	Malla electrosoldada Placa de Contrapiso	kg	3.354,80	100%	6,91%	6,91%			
5	HITO ESTRUCTURA APORTICADA			%	\$ 129.899.534,34	43,96%	14,33%	6,30%	6,30%
5.00	ESTRUCTURA								
5.1	Concreto Columnas	m3	46,12	100%	21,88%	21,88%			
5.3	Concreto Vigas de Cubierta	m3	59,16	0%	34,50%	0,00%			
5.4	Concreto Placa Maciza de Cubierta	m2	80,48	0%	0,19%	0,00%			
5.5	Acero Columnas	kg	9.515,27	100%	22,08%	22,08%			
5.7	Acero Vigas Aéreas	kg	7.467,09	0%	17,30%	0,00%			
5.8	Malla electrosoldada Placa Maciza de Cubierta	kg	1.743,18	0%	4,05%	0,00%			
6	HITO MUROS Y PINTURAS			%	\$ 84.470.774,71	0,00%	9,32%	0,00%	0,00%
6.00	MAMPOSTERIA								
6.1	Muros en bloque de concreto Liso 12x19x39 color gris con hidrófugo al exterior	m2	219,19	0%	20,41%	0,00%			
6.2	Muros en bloque en Anilla No. 4 a-6ms	m2	475,04	0%	29,23%	0,00%			
6.5	Columnetas en Concreto incluye refuerzos y anclajes.	m	219,32	0%	6,16%	0,00%			
6.11	Dovelas muro en bloque de concreto incluye refuerzos y anclajes.	m	140,88	0%	3,95%	0,00%			
6.13	Cinta de Remate Antepechos incluye refuerzos y anclajes.	m	128,50	0%	2,54%	0,00%			
6.14	Dinteles en Concreto incluye refuerzo y anclajes	m	14,35	0%	0,97%	0,00%			
7	HITO : PAÑETES								
7.00	PAÑETES								
7.1	Pañete Liso 1/4 Sobre Mampostería	m2	401,22	0%	13,12%	0,00%			
7.2	Pañete Impermeabilizado 1/4 sobre mampostería	m2	297,22	0%	10,51%	0,00%			
8	HITO-PISOS ANDENES ENCHAPES Y ACABADOS			%	\$ 136.734.532,84	0,00%	15,08%	0,00%	0,00%
8.00	ALISTADO DE PISOS								
8.1	Alistado de Pisos 1/4 a-4 cm	m2	893,01	0%	12,83%	0,00%			
9	HITO - ENCHAPE DE PISOS								
9.00	ENCHAPE DE PISOS								
9.1	Piso en cerámica Nacional 30x30cm color blanco Trafico 4	m2	170,54	0%	5,04%	0,00%			
9.2	Piso en tabletas de gres Sahara formato 20 x 20 cm o similar	m2	728,39	0%	22,84%	0,00%			
9.3	Media cefia en Granito color Blanco	m	237,70	0%	2,62%	0,00%			
9.4	Zocalo De Gres Sahara 50 X 7,5 Cms O Similar	m	167,60	0%	2,86%	0,00%			
9.5	Enchape En Ceramica Nacional 30 X 30 Color Blanco Con Vin De Remate De Aluminio O Plastico En Esquinas Verticales.	m2	288,19	0%	7,14%	0,00%			
10	PINTURAS								
10.00	PINTURAS								
10.1	Estuco y Pintura vinilo lavable tipo 1 para interiores	m2	626,24	0%	12,19%	0,00%			
10.2	Estuco y Pintura epóxica para interiores	m2	25,67	0%	0,91%	0,00%			
11	HITO : MESONES								
11.00	MESONES								
11.1	Instalar en concreto acabado en granito blanco remate en obra incluye sapicadero bordes dilataciones y muretes de apoyo enchapados lavamanos	m	17,20	0%	1,36%	0,00%			
12	HITO CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES			%	\$ 169.781.557,89	0,00%	18,73%	0,00%	0,00%
12.00	CUBIERTA								
12.1	Teja Termoacústica en fibra de carbono UPVC incluye estructura metálica, anticorrosivo y pintura	m2	722,02	0%	87,91%	0,00%			
12.2	Canal en Lámina Galvanizada Cal. 18	m	104,12	0%	5,24%	0,00%			
12.3	Flandia en lámina galvanizada cal.20	m	48,38	0%	1,81%	0,00%			
13	VENTANARIA								
13.00	VENTANARIA								
13.1	Ventaneria en aluminio, cristal y película de seguridad 4 micras. Incluye marco con alfaja	m2	138,94	0%	18,28%	0,00%			
14	PUERTAS								
14.00	PUERTAS								
14.1	Puerta en lámina CR cal. 18, con persiana, mirilla en cristal y película de seguridad 4 micras, incluye anticorrosivo y esmalte.	un	16,00	0%	7,44%	0,00%			
14.3	Puerta para sanitario en acero inoxidable cal 18	un	12,00	0%	2,72%	0,00%			
15	APARATOS Y ACCESORIOS								
15.00	APARATOS Y ACCESORIOS								
15.1	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar para		1,00	0%	0,58%	0,00%			
15.2	Sanitario de tanque color blanco línea institucional tipo corona o similar		13,00	0%	1,68%	0,00%			
15.3	Lavamanos de colgar color blanco línea institucional tipo corona o similar para		1,00	0%	0,28%	0,00%			
15.3a	Lavamanos de colgar color blanco línea institucional tipo corona o similar incluye		21,00	0%	5,50%	0,00%			
15.4	Grifería tipo push antivandalica de pared línea institucional		12,00	0%	2,45%	0,00%			
15.6	Orinal mediano de colgar color blanco línea institucional		3,00	0%	0,79%	0,00%			
15.8	Juego de barras de apoyo para personas con movilidad reducida		2,00	0%	0,17%	0,00%			
15.9	Lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial 0.60x0.60x0.30 incluye		10,00	0%	0,71%	0,00%			
15.10	Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable		17,00	0%	1,62%	0,00%			
15.11	Dispensador de Jabón en acero inoxidable		17,00	0%	2,33%	0,00%			

CONTRATO PAF-JU02-G02DC-2015 I.E. DEL VALLE JULIO CESAR ARCE- PALMIRA									
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	EJECUTADO ÍTEM	INCIDENCIA PORCENTUAL DEL ÍTEM CON RELACION AL VALOR DEL CAPÍTULO	EJECUTADO PORCENTUAL TOTAL DEL CAPÍTULO CON RELACION AL HITO	HITO PROGRAMADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL	HITO EJECUTADO TOTAL /CONTEMPLADO PARA PAGO
15.12a	Juego Incrustaciones de baño		2,00	0%	0,13%	0,00%			
16	ESPEJOS								
16.00	ESPEJOS								
16.1	Espejo 4mm cantos biselados y pulidos	m2	6,63	0%	0,87%	0,00%			
17	HITO REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS			%	\$ 173.249.246,38	19,45%	19,11%	3,72%	3,72%
17.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE VOZ Y DATOS								
17	Instalaciones Eléctricas de Voz y Datos	gl	1,00	3,26%	47,33%	1,54%			
18	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED INCENDIOS								
18.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED INCENDIOS								
18	Instalaciones Hidrosanitarias de Gas y Red de Incendios	gl	1,00	34,00%	52,67%	17,91%			
19	HITO OBRAS EXTERIORES			%	\$ 19.849.500,00	0,00%	2,19%	0,00%	0,00%
19.00	URBANISMO								
19.1	Andén Perimetral en placa de concreto reforzado de 3.000 psi	m2	111,80	0%	85,86%	0,00%			
19.2	Siembra de Árboles	un	10,00	0%	14,11%	0,00%			
20	IMPERMEABILIZACIONES								
20.00	IMPERMEABILIZACIONES								
20.1	Impermeabilización Placa cubierta	m2	80,80	0%	2,82%	0,00%			
20.2	Impermeabilización Hidrofujo en Fachada	m2	266,25	0%	2,42%	0,00%			
21	HITO : ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS			%	\$ 7.849.166,23	0,00%	0,87%	0,00%	0,00%
21.00	ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS								
21.1	Aseo de obra	m2	940,34						
21.2	Cargue y retro escombros de obra	m2	117,42						
							100,00%	30,39%	28,73%

Certificado Pago Parafiscales

Interventoría



CONSORCIO ECO-DAIMCO
NIT. 900.888.894-3

Bogotá D.C., 20 de enero de 2018

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO ECO-DAIMCO, certifica que CONSORCIO ECO-DAIMCO se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, así como por concepto de pago de parafiscales (*). De los últimos 6 meses.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si (x)	No ()
--	--------	-------

Atentamente,

CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
C.C. 78.027.760 de Cereté
Representante Legal

Certificado Pago Parafiscales Contratista



CONSORCIO ECO-DAIMCO
NIT. 900.888.894-3

G02-FINDETER-2015-573

Bogotá D.C. 11 de diciembre de 2017

Señores
CONSTRUCCIONES RUBAU COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA
Contratista de Obra
Atn. JULIO PEREZ REDONDO
Representante Legal
Carrera 11B No. 96-03 Of. 504
Edificio Zúrich
Teléfono: 57 (1) 7550979
Bogotá D.C.

	
RUBAU	
Colombia	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
PAF-JU-2 G-2 DC-2015	
Consecutivo R-	420
Fecha:	15/12/17
Hora:	2:00
Anexos:	1 FOLIO
EL RECIBO DE ESTE DOCUMENTO NO IMPLICA ACEPTACIÓN	

Referencia: Contrato PAF-JU02-G02DC-2015. ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 02.

Asunto: Solicitud documentos liquidación contrato de obra

Respetados Señores:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y atendiendo al documento RUBAU G02-FINDETER-2017-382 del 09 de noviembre de 2017 con radicado DAIMCO D-2017-2192 del 10 de noviembre de 2017, a través del cual RUBAU indicó a esta interventoría lo siguiente:


(...)

"[Hemos recibido el documento citado en el asunto, a través del cual RUBAU indica a esta interventoría el siguiente aparte del texto que traemos a colación, así: ... "Con sorpresa acusamos recibo de sus comunicaciones referenciadas en el asunto, mediante las cuales interventoría informa sobre presuntos incumplimientos que se vienen presentando en las Instituciones Educativas del Grupo 2, en la medida que tales notificaciones por parte de la interventoría, no guardan concordancia con lo manifestado por la Entidad Financiera Contratante, Fiduciaria Bogotá, la cual, mediante comunicación de octubre 26 de 2017 notificó su decisión de "(...) dar por terminado unilateralmente el contrato del asunto por incumplimiento".

En virtud de lo anterior, y a pesar que Construcciones RUBAU S.A. fijó su posición ante esa ilegal decisión mediante comunicación G02-FINDETER-2017-372 del 02 de noviembre de 2017, invitamos a la interventoría a concertar con la entidad el procedimiento a seguir para la liquidación del contrato, y a la entrega de las obras en el estado en que se encuentren".

Respecto a esto, solicitamos a la Entidad Contratante instrucciones con relación al procedimiento a seguir por parte de la interventoría por cuanto se adelanta el proceso de Terminación Anticipada del





CONSORCIO ECO-DAIMCO

NIT. 900.888.894-3

G02-FINDETER-2015-573


Contrato de Obra No. PAF-JU02-G02DC-2015, y como es de su conocimiento las obras ya se encuentran abandonadas por parte de RUBAU.

De igual forma, reiteramos que en el marco del contrato de interventoría No. PAF-JU13-G02IDC-2015, cada uno de los frentes cuenta con la permanencia de nuestros profesionales contratados]. Subrayado y negrilla por fuera del texto, solicitamos la entrega de la documentación relacionada a fin de continuar con el trámite de liquidación del contrato PAF-JU02-G02DC-2015.

- Planos Récord para cada uno de los frentes.
- Certificado del revisor fiscal o Representante Legal del pago de obligaciones del contratista con aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA.
- Certificado actualizado de la Cámara de Comercio
- RUT
- Documento de constitución de la empresa.
- Actas de Terminación de los Proyectos I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO-JAMUNDI e I.E. DEL VALLE JULIO CESAR ARCE- PALMIRA, remitidas el 24 de noviembre de 2017 para su firma.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente


ING. JOSÉ VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TÉCNICO
CONSORCIO ECO-DAIMCO

Anexos:	Lo enunciado	
Elaboro:	Carolina Melgarejo Márquez	
Vo. Bo.	Arq. Paola Pérez Álvarez - Coordinadora de proyectos	
Vo. Bo.	Ing. O. Pertuz / C. Espitia - Representante Legal	
Copia 1.	Archivo - Convocatoria N° PAF-JU13-G02IDC-2015	
Copia 2.	FINDETER. FINANCIERA DEL DESARROLLO. Atn. Arq. Gloria Rodríguez. Supervisor de Contrato. Calle 103 No. 19-20 Pbx: (1) 6230311/6230388	

CAPÍTULO IV.

ASPECTO TÉCNICO

Control del personal del Contratista

**I.E ECOTURISTICA LITORAL
PACIFICO DE NUQUI**

Firma: Geoner Mosquera
Nombre: GESNER MOSQUERA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Construcciones RUBAU S.A.
Consorcio Eco Daimco

OBSERVACIONES

25

Internacional

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

8 MESES

Y EL:	01/09/2017	PLAZO:
-------	------------	--------

02/08/2017

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

Construcciones RUBAU S.A.
Consorcio Eco Daimco

Construcciones RUBAU S.A.
Consorcio Eco Daimco

PERSONAL MINIMO DEL CONTRATISTA

[illegible]

Mosquera
Guzner

Firmá: _____
Nombre: **GESNER MOSQUERA YACUB**
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

I.E ALFREDO BONILLA MONTAÑO
SEDE SIXTO MARIA ROJAS

CONTROL DE PERSONAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

Firma: Gesner Mosquera
Nombre: **GESNER MOSQUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

000023

CONTROL DE PERSONAL

05/06/2017

人

PLAZO:

PLAZO:

Construcciones RUBAU S.A.

Consorcio Ego Daimco

Consorcio Ego Daimco

PERSONAL MINIMO DEL CONTRATISTA

MAYO

[illegible]

Firma: Gesner Mosquera

Nombre: **GESNER MOSQUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/06/2017 Y 01/07/2017
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES RUBAU
INTERVENIOR: CONSORCIO ECO-DAIMCO

PERSONAL DE INTERVENTORIA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

FECHA		JUNIO																														OBSERVACIONES	
CARGO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		1
J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S			
DIRECTOR DE INTERVENTORIA		1						1								1							1							1			
RESIDENTE DE INTERVENTORIA		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TRABAJADORA SOCIAL																						1											
SISOMA																						1											
ESPECIALISTA ELECTRICO																																	
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS																																	
PERSONAL CONTRATISTA		2	1	1	0	1	1	1	2	1	1	0	1	1	1	2	1	1	0	1	1	1	4	1	1	1	0	1	1	1	2		1
																																	34

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA:

34

Firma: Gesner Mosquera
GESNER MOSQUERA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Código: 10
Versión: 1

CONTROL DE PERSONAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/10/2017 Y EL 01/11/2017 PLAZO:
CONTRATISTA: Construcciones RUBAU S.A.
INTERVENTOR: Consorcio Eco Daimco

PERSONAL MINIMO DEL CONTRATISTA

FECHA	OCTUBRE																														OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CARGO	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	
GUSTAVO REYES TRUJILLO (ARQ.RESIDENTE)	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PEDRO NEL (DIRECTOR OBRA)							1						1		1														1		
MARIA ALEJANDRA IBARRA (TRABAJADORA SOCIAL)							1						1		1											1			1		
PAOLA ANDREA ENRIQUEZ (PROFESIONAL CALIDAD)							1						1		1											1			1		
ANA PATRICIA ESPINOZA (PROFESIONAL SEGURIDAD)							1						1		1											1			1		
JAIME JHON VALENCIA LAINES (MAESTRO GENERAL)	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
JAVIER IVAN VALENCIA LAINES (SUBCONTRATISTA)																															
JOSE EDUAR CARACAS	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FRANKLIN CARACAS	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
JEFFERSON VIAFARA CHAPURRI	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
GERSON APOENZA VIAFARA	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ LAZARI	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
JESUS ALBERTO OLAYA	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
HAROL GONZALEZ CARABALI	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
																		</													

A PESAR DE LA ASISTENCIA EN LA MAYORIA DE DIAS, NO SE LABORO POR LA FALTA DE PAGO DEL PERSONAL OPERATIVO

Firma: 
Nombre: GONZALO PRIETO
DIRECTOR INTERVENTORIA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL

02/07/2017

YEL 01/08/2017 PLAZO:

Construcciones RUBALSA

Consorzio Eco Daimco

PERSONAL MINIMO DEL CONTRATISTA

FECHA		JULIO																															OBSERVACIONES	
S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D		L
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RENUNCIO A MEDIADOS DE MES
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												

Firma: Conner Moser

Nombre: **GESNER MOSQUERA YACUB**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

000142

CONTROL DE PERSONAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
CONTRATISTA:
INTERVENIOR:

CONSTRUCCIONES RUBAU
CONSORCIO ECO-AMICO

YEL: 01/05/2017

PLAZO:

Código: 10

Versión: 1

PERSONAL MINIMO DEL CONTRATISTA		OBSERVACIONES	
FECHA	CARGO		
2	M	1	1
3	J	1	1
4	V	1	1
5	S	1	1
6	D	1	1
7	L	1	1
8	M	1	1
9	J	1	1
10	M	1	1
11	J	1	1
12	V	1	1
13	S	1	1
14	D	1	1
15	L	1	1
16	M	1	1
17	J	1	1
18	V	1	1
19	S	1	1
20	D	1	1
21	L	1	1
22	M	1	1
23	J	1	1
24	V	1	1
25	S	1	1
26	D	1	1
27	L	1	1
28	M	1	1
29	J	1	1
30	V	1	1
31	S	1	1
GUSTAVO REYES TRUJILLO (ARQ.RESIDENTE)			
LEUDY CESAR ALDANA (DIRECTOR OBRA)			
MARIA ALEXANDRA BARRA (TRABAJADORA SOCIAL)			
PAOLA ANDREA ENRIQUEZ (PROFESIONAL CALIDAD)			
ANA PATRICIA ESPINOZA (PROFESIONAL SEGURIDAD)			
JAMIE JHON VALENCIA LAINES (MAESTRO GENERAL)			
JAVIER IVAN VALENCIA LAINES (SUBCONTRATISTA)			
JOSE EDUAR CARACAS			
GILDAURO ARIAS CHAPURRI			
FRANKLIN CARACAS			
GILDAURO ARIAS CHAPURRI			
JEFFERSON WAFARA CHAPURRI			
GERSON APOINZA WAFARA			
JESUS DAVID HERRERA FLOREZ			
MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ LAZARI			
LEON HERNANDO GOMEZ (ELECTRICO)			
DIEGO ARMANDO GOMEZ (ELECTRICO)			
DIEGO LUIS LASSO			
JESUS ALBERTO OLAYA			
RUBIEL DE JESUS CARDONA MONTOYA			
HAROL GONZALEZ CARABALI			
WILMAR CARABALI MONDRAGON			
DORCEU PENA GONZALEZ			
DARWIN ANDRES WAFARA CARABALI			
BRETDYS DEL CRISTO HERRERA FLOREZ			
TOTAL PERSONAL		399	
MANO OBRA NO CALIFICADA			
De la region			
De fuera de la region			
PROVEEDORES			
Local			
Nacional			
Internacional			

000345

Gesner Mosquera

Firma: _____

Nombre: GESNER MOSQUERA YACUB

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Página 1 de 1

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/09/2017 Y 01/10/2017
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES RUBAU
INTERVENTOR: CONSORCIO ECO-DAIMCO

PERSONAL DE INTERVENTORIA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

FECHA		AGOSTO																														OBSERVACIONES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
CARGO	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S		
DIRECTOR DE INTERVENTORIA						1							1							1								1				
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		
TRABAJADORA SOCIAL					1															1												
SIGOMA											1							1							1							
COMISION TOPOGRAFIA																																
ESPECIALISTA ELECTRICO																																
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS																																
PERSONAL CONTRATISTA	1	1	0	1	2	1	2	1	1	0	1	2	1	2	1	1	0	1	2	1	3	1	1	0	1	2	1	1	3	0		
																															36	

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA:

Firma:



GONZALO PRIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESUMEN CONTROL DE PERSONAL EN OBRA

A: NOVIEMBRE 2017

L: AMPLIACIÓN I.E SIXTO MARIA ROJAS

ID	CONTRATISTA	NOVIEMBRE																												TOTAL
		MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI					
1	ADMINISTRACION	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	PERSONAL OPERATIVO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL		2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	54	

Firma:



GONZALO PRIETO PIMIENTO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

I.E ALFREDO BONILLA MONTAÑO
SEDE MARIA INMACULADA
