

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CENTRO EDUCATIVO INDIGENA AWA VERDE									
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		252835006343									
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		SEDE # 5 IND AWA PIZDE PIALQUER									
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		252835006297									
Dirección/ Municipio:		SAN ANDRES DE TUMACO					Departamento		NARIÑO		
FECHA DE VISITA	DIA	9	MES	10	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	NOCHE
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	1°20'46.8"N					
					Y:	78°22'24.5"W					
RECTOR:	MARTHA LUCIA ORTIZ					URBANA		RURAL	X		
E-mail:	ainfipi@gmail.com					TELÉFONO:	3178530640				
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.					SI		NO	Tipo de doc.:		
						X			No del doc.:		
						Anexa documento:		SI		NO	

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	5	1	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	3	2	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN		3	1	TERCERO	1	2	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	4	1	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	2	2	DECIMO		X		
ESTUDIANTES							ONCE			27	
TOTAL		3	1	TOTAL	15	8	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA	<input type="checkbox"/>	LABORATORIO	<input type="checkbox"/>	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	<input type="checkbox"/>	No. De aparatos	<input type="checkbox"/>	COMEDOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				INTERNADO	<input type="checkbox"/>	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	B. SANITARIA	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	1000LT	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	B. SANITARIA	Cant:	20	UND:	ML	Medidas	1/2"	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	B. SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1,50x1,50x2	Material	MAMPOSTERIA
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	B. SANITARIA	Cant:	23	UND:	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	B. SANITARIA	Cant:	1	UND:		Medidas	1X1	Material	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULA Y COMEDOR	Cant:	19	UND:	ML	Medidas	6+5+8	Material	BAJANTE TIPO AMAZONAS CON ACCESORIOS
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULA	Cant:	135	UND:	m2	Medidas	15x9	Material	TERMOACUSTICA
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	AULA	Cant:	102	UND:	ML	Medidas	4X2''	Material	VIGAS EN MADERA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	1	UND:	ML	Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas		Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	BATERIA SANITARIA Y AULA	Cant:	59	UND:	M2	Medidas		Material	MADERA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	AULA	Cant:	10	UND:	M2	Medidas		Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULA	Cant:	129	UND:	M2	Medidas		Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	B/ SANITARIA Y SALON	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	1X2.07	Material	ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	B/ SANITARIA Y SALON	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	1,40X3,20	Material	ALUMINIO
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	B/ SANITARIA Y SALON	Cant:	125	UND:	M2	Medidas		Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	AULA	Cant:	7	UND:	UND	Medidas		Material	LAMPARAS LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	AULA	Cant:	6	UND:	UND	Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	AULA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	AULA	Cant:	35	UND:	ML	Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULA	Cant:	81	UND:	M2	Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULA	Cant:	68	UND:	M2	Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	B/SANITARIA	Cant:	4	UND:	UND	Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	3
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	x	No existe		Cantidad	3
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

SE REQUIERE CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA.

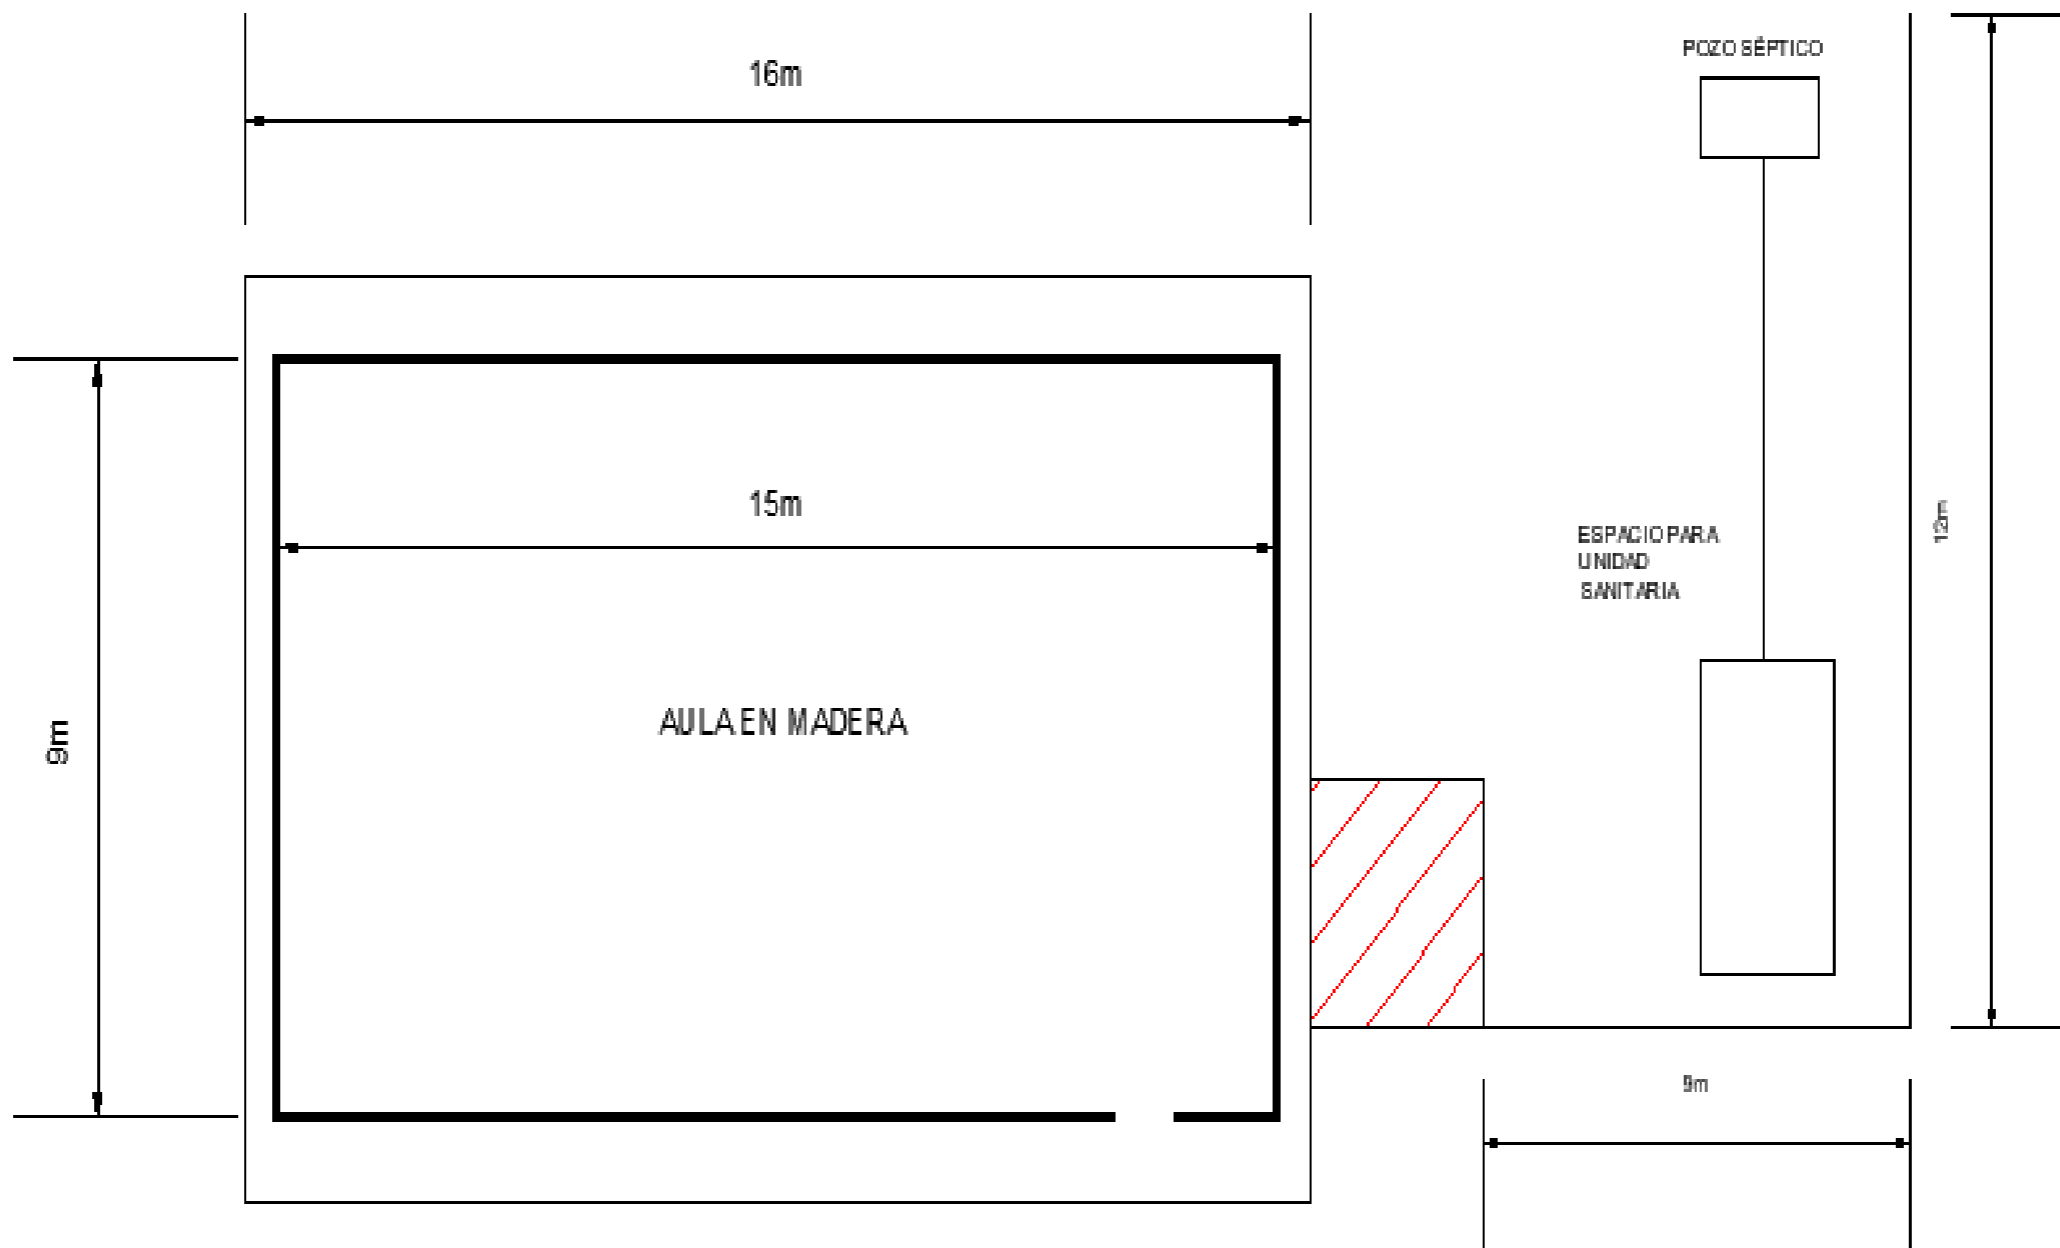

- Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA
 Email: abrahhan@hotmail.com
 Teléfono: 3218726444

Firma
 C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: VICTOR BERMUDEZ
 Email:
 Teléfono:

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: MARTHA LUCI ORTIZ
 Email:
 Teléfono: 3104007064

Firma
 Cargo: DIRECTORA

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:
 Email:
 Teléfono:

Firma
 Cargo:

<p>1 FACHADA PRINCIPAL</p>  <p style="text-align: center;">VEREDA PIZDE PIALQUER</p>	<p>2 AULAS DE CLASE EN MAL ESTADO</p>  <p style="text-align: center;">AULA DE CLASE</p>
	
<p>3 AULA DE CLASE</p> 	<p>4 FACHADA EN MAL ESTADO</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

<p>Acceso al predio <input checked="" type="checkbox"/> Vehicular <input checked="" type="checkbox"/> Peatonal <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Marítima <input type="checkbox"/> Otro: _____</p>	<p>Distancia en km desde el casco urbano 185 KM</p>
<p>El predio cuenta con servicios de: https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_6438440810345136128_n.jpg?_nc_cat=0&_nc</p>	
<p>Agua SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Luz SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Gas SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Alcantarillado SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>Se requiere realizar demoliciones SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> M2 <input type="checkbox"/> Material predominante _____</p>	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

A la sede se llega desde Tumaco por vía en mal estado por 58 kilómetros para luego coger una lancha por 4 horas y por último caminar por trocha dos horas

Se requiere la construcción de una batería sanitaria
