

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA AWA VERDE											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	252835006343											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	PANELERO											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	252835007137											
Dirección/ Municipio:	SAN ANDRES DE TUMACO					Departamento			NARIÑO			
FECHA DE VISITA	DIA	6	MES	10	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	1°22'32.8"N						
					Y:	78°21'21.9"W						
RECTOR:	MARTHA LUCIA ORTIZ					URBANA		RURAL	X			
E-mail:						TELÉFONO:	3178530640					
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI											
	NO	X										
Tipo de doc.:												
No del doc.:												
Anexa documento: SI NO												

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
	PREJARDIN				PRIMERO		3	SEXTO		
JARDIN				SEGUNDO	3	3	SÉPTIMO			Adultos hombres
TRANSICIÓN	5	5		TERCERO	1		OCTAVO			TOTAL
				CUARTO		4	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
				QUINTO	1	4	DECIMO			
ESTUDIANTES							ONCE			29
TOTAL	5	5		TOTAL	5	14	TOTAL			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	0	INTERNADO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A.	Ubicació	Cant	UNC	UND	Medidas	Material
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	AULA	4	UNC	UND	1000LT	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	AULA	15	UNC	ML	1/2"	PVC
C. POZO SÉPTICO:	B. SANITARIA	2	UNC	UND	2X2X3	MAMPOSTERIA
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	B. SANITARIA	15	UNC	ML	4"	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	B. SANITARIA	1	UNC		1X1	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	AULA	40	UNC	ML		BAJANTE TIPO AMAZONAS CON ACCESORIOS
G. Otro	Ubicación:	Cant	UNC		Medidas	Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicació	AULA	Cant	135	UNC	m2	Medidas	15X9	Material	TERMOACUSTICO
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicació	AULA	Cant	95	UNC	ML	Medidas	4X2''	Material	VIGA EN MADERA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas		Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas		Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	1	UNC	ML	Medidas	1,20X0,30	Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicació	AULA	Cant	35,8	UNC	M2	Medidas		Material	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	10	UNC	M2	Medidas	5X2	Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicació	AULA	Cant	130	UNC	M3	Medidas		Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicació	/ SANITARIA Y SALO	Cant	4	UNC	UND	Medidas	1X2.07	Material	ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicació	/ SANITARIA Y SALO	Cant	4	UNC	UND	Medidas	2X3,85	Material	ALUMINIO
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicació	AULA	Cant	100	UNC	M2	Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicació	AULA	Cant	8	UNC	UND	Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicació	AULA	Cant	6	UNC	UND	Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicació	AULA	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicació	AULA	Cant	30	UNC	ML	Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació	AULA	Cant	59	UNC	M2	Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació	AULA	Cant	100	UNC	M2	Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	12
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	5

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

la sede requiere construccion de bateria sanitaria y mejoramiento de aulas ya que los salones están en malas condiciones

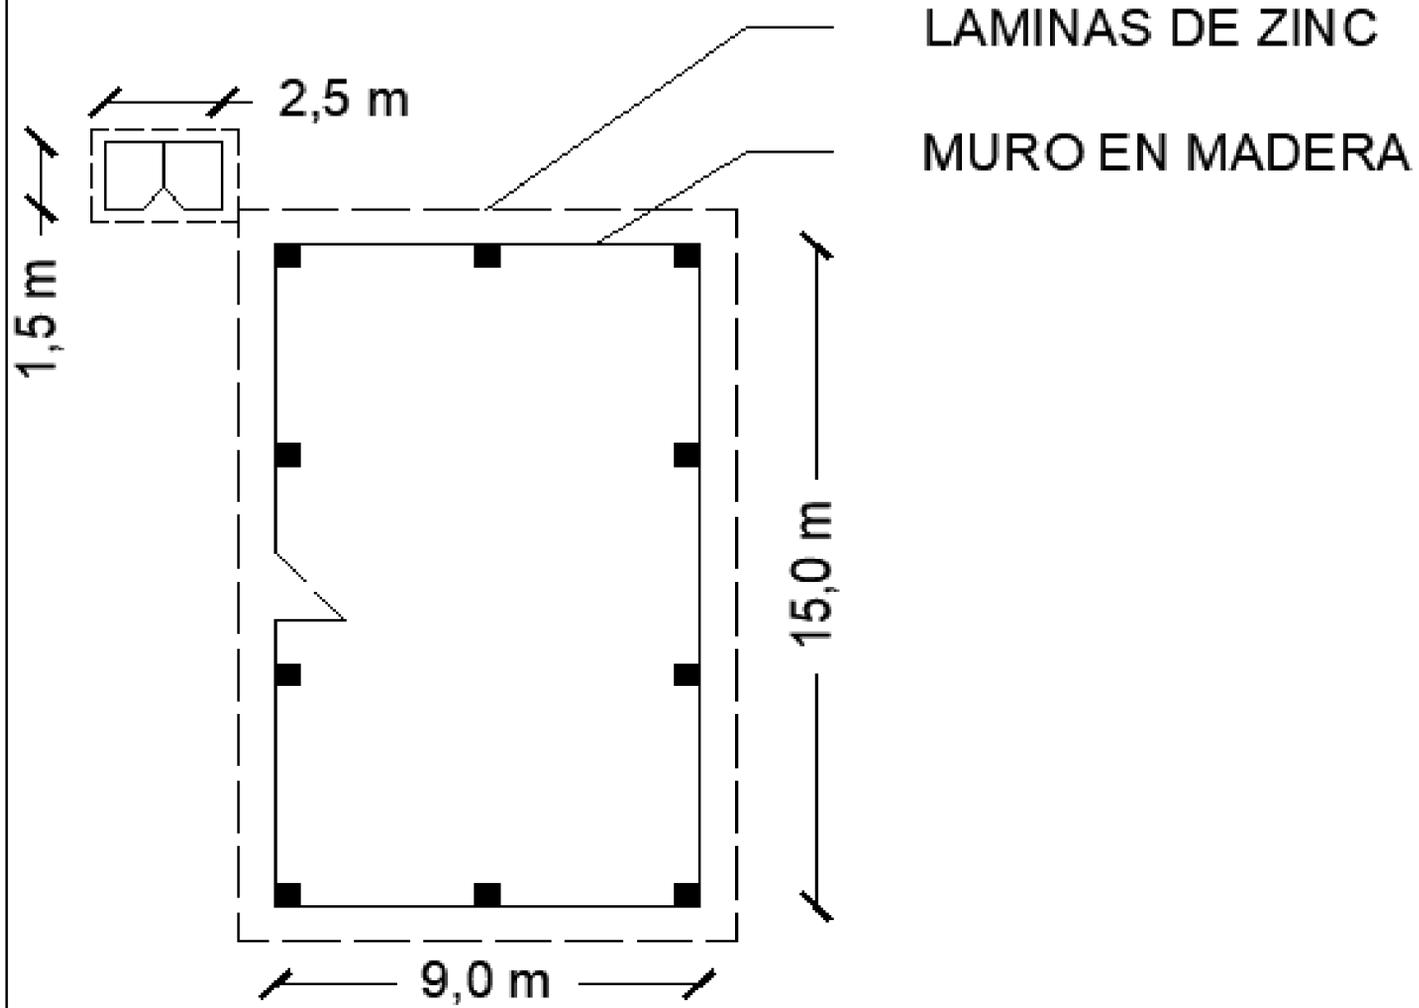

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre:	ABRAHAM YELA GARCIA	Firma	
Email:	abrahhan@hotmail.com	C.C.	1086724434
Teléfono:	3218726444		

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:	VICTOR BERMUDEZ	Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre:	MARTHA LUCIA ORTIZ	Firma	
Email:		Cargo:	DIRECTORA
Teléfono:	3104007064		

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre:	JOSE SANTOS LOPEZ	Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

1	FACHADA PRINCIPAL	2	BATERIA SANITARIA
			
COMEDOR		DETALLE DE MURO	
			
3	AULA DE CLASE	4	COCINA
			

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio				Distancia en km desde el casco urbano		125KM	
<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input checked="" type="checkbox"/> Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro:			
El predio cuenta con servicios de:				https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_64			
Agua SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Luz SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantaril SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
Se requiere realizar demoliciones SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				M2 Material predominante _____			

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA COMUNIDAD DE LA SEDE PANELERO REQUIERE TUBERIA HIDRAULICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA MONTAÑA

A la sede se llega desde Tumaco hasta el kilometro 88 por vía pavimentada (hora y 45 minutos), luego se camina 2 horas hasta el río guiza, 10 minutos pasando el río por una canoa llamada potrillo y luego caminar 2 horas y 20 minutos subiendo la montaña hasta la sede
