

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		C.E.R EL BIJAO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205172000208											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R MANUEL GOMEZ											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205172000186											
Dirección/ Municipio: CHIGORODO		VEREDA EL GUINEO					ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	30	MES	AGOSTO	AÑO	2018	JORNADAS	MANANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		N 716^ 55' 26,40"									
		Y:		W 1333^34'58,80"									
RECTOR:	ISAURO						URBANA		RURAL	X			
E-mail:	NO TIENE						TELEFONO:	3108256576					
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	Tipo de doc.: MATRICULA INMOBILIARIA					
							NO	No del doc.: 008-1857					
		Anexa documento:		SI	X	NO							

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	3	3	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	4	2	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		2	2	TERCERO	0	5	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	1	4	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	1	3	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0		
TOTAL		2	2	TOTAL	9	17	TOTAL	0	0	30	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	3	No. De aparatos	3	COMEDOR	1	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UN	Medidas	2000 LTS	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	20	UND:	ML	Medidas	1//2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	1	UND:	UN	Medidas	3000 LTS	Material	PLASTICO
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	40	UND:	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	1	UND:	UN	Medidas	60*60	Material	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro BOMBA	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	60	UND:	M2	Medidas		Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UN	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UN	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS	Cant:	146	UND:	M2	Medidas		Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ALJIBE	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	1	UND:	UN	Medidas		Material	COCRETO
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	M2	Medidas	1*2	Material	CEEMENTO Y ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	267	UND:	M2	Medidas		Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual? PUERTA DE INGRESO	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	1	UND:	UN	Medidas	3*2	Material	MALLA ESLABONADA


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	3
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	3
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	35
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	x	Cantidad
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	x	Cantidad

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

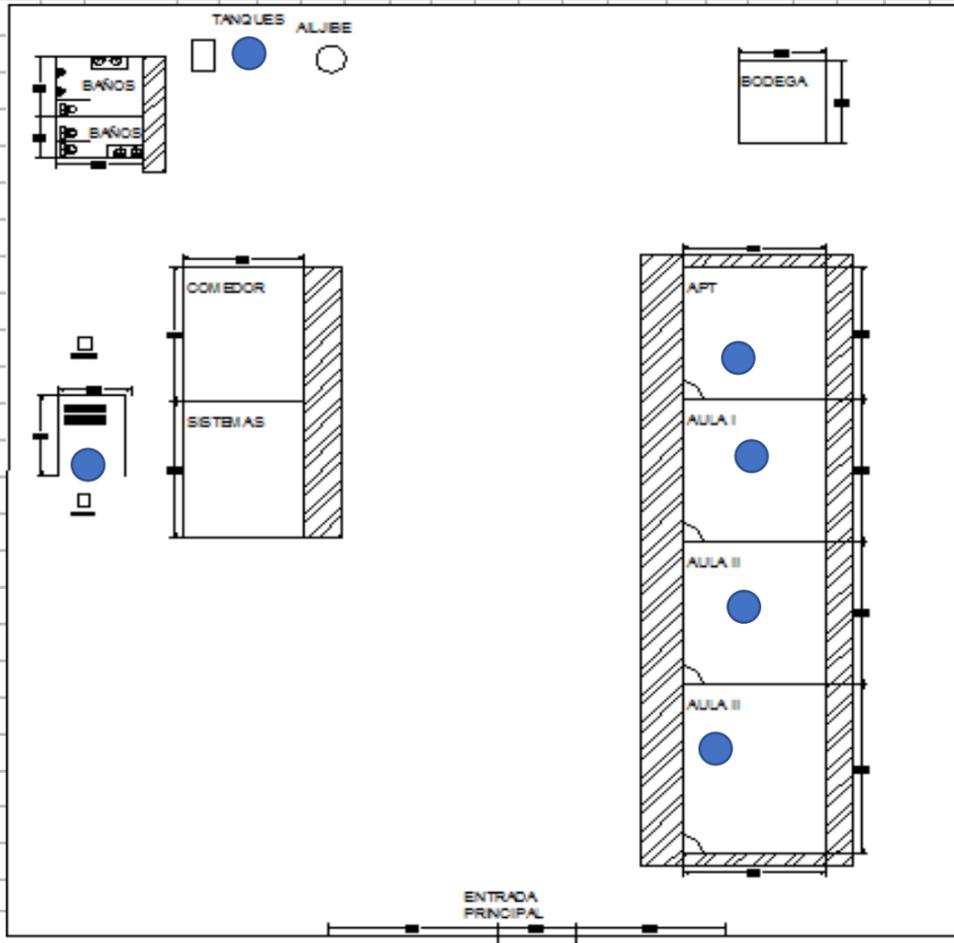

puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN	
Nombre: _____	Firma _____
Email: _____	C.C. _____
Teléfono: _____	
Acompañamiento de la OIM:	
Nombre: <u>Marcela Ortiz P.</u>	Firma <u>[Signature]</u>
Email: <u>gestoramotata@gmail.com</u>	Cargo: <u>psicóloga</u>
Teléfono: <u>3117130129</u>	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: <u>Leandro Monquera</u>	Firma <u>[Signature]</u>
Email: <u>l24-mo-pa@hotmail.es</u>	Cargo: <u>RECTOR</u>
Teléfono: <u>3108256576</u>	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: <u>Pedro Raúl Medina</u>	Firma <u>[Signature]</u>
Email: <u>Pedro_molina@live.com.co</u>	Cargo: <u>[Signature]</u>
Teléfono: <u>3216004477</u>	

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	2	CAMBIO DE SANITARIOS
			
3	TANQUE ALMACENAMIENTO	4	ENMALLADO Y CERRAMIENTO PUERTA INGRESO
			
5	ENCHAPE PISOS	6	PINTURA
			

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 30 KM DESDE EL MUNICIPIO DE CHIGORODO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcaí SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 2 M2 Material predominante **CEMENTO**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)
