

3

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO No.:	109-131-132 de 29 de Abril de 2011
OBJETO	Ejecución de las obras públicas para la EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, CONSOLIDACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE CENTENARIO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA
LOCALIZACION DEL PROYECTO	PARQUE CENTENARIO DE CARTAGENA
PLAZO INICIAL	Seis (06) Meses
FECHA DE INICIACION	16 de julio de 2011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.589.748.420,00
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUE CENTENARIO - CARTAGENA
INTERVENTOR	CONSORCIO CARINSA-INCOPLAN II
CONTRATANTE	DISTITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

A. PRORROGAS

PRORROGA No.	FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
Modificadorio 2011 por Ampliación de Plazo	13 de Diciembre de 2011	60 Días
Modificadorio 2/2012 por Ampliación de plazo	14 de Marzo de 2012	65 Días
Modificadorio 005/2012 por ampliación de Plazo	29 de Junio de 2012	55 Días
Modificadorio 2012 por Precio Unitario y Plazo	22 de Agosto de 2012	30 Días
Modificadorio 2012 por Ampliación de Plazo	20 de Septiembre de 2012	29 Días
Modificadorio 008/213 por Ampliación de plazo	02 de Mayo de 2013	60 Días
Modificadorio 009/2013 Por Ampliación de plazo	02 de Septiembre de 2013	40 Días
Modificadorio 010/2013 Por ampliación de plazo	15 de Octubre de 2013	34 Días

B. SUSPENSIONES Y REINICIO

ACTAS No.	FECHA
Actas de Suspensión de Plazo	04 de Abril de 2012
Actas de Reinicio de Plazo	16 de Mayo de 2012
Actas de Suspensión de Plazo No. 2	21 de Septiembre de 2012
Actas de Reinicio de Plazo No. 2	16 de Noviembre de 2012
Actas de Suspensión de Plazo No. 3	14 de Diciembre de 2012
Actas de Reinicio No. 3	02 de Mayo de 2013
Actas de Suspensión de Plazo No. 4	19 de Junio de 2013
Actas de Reinicio de Plazo No. 4	20 de Agosto de 2013

C. ADICIONES

ADICION No.	VALOR (\$)
Modificadorio 2011 por precio Unitario y Plazo	\$ 172.941.174,41
Modificadorio 005/2012 por Precio Unitario y Plazo	\$ 1.136.030.000,00
Modificadorio 008/2013 por Precio Unitario y Plazo	\$ 1.436.755.121,00

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	18.4 Meses
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	18 de Noviembre de 2013
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 8.335.474.715,41

A los veinte (20) días del mes de Noviembre de 2013, se reunieron el Ing. Alonso Núñez Martínez en representación del contratista el Ing. Santiago Luis Rizo Delgado como representante legal del Consorcio CARINSA-INCOPLAN II en su calidad de interventor del Contrato No. 109-131-132 con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato, dado que se cumplió el plazo del contrato.

ESTADO DEL CONTRATO

CODIGO ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	PRELIMINARES		
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO		26,341.96
1.2	RETIRO PISO ADOQUIN DE CONCRETO EXISTENTE	M2	5,673.61
1.3	DEMOLICION ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M2	1,210.97
1.4	DEMOLICION DE ANDENES DE CONCRETO	M3	2,254.80
1.5	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA ZONAS VERDES h= 0.60 Mts	M2	2,453.00
1.6	DEMOLICION DE PAVIMENTOS	ML	3,112.44
1.7	EXCAVACION A MANO	M2	3,843.67
1.8	RETIRO MATERIAL SOBRANTE	M3	6,489.71
1.9	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	3,858.46
1.10	RELLENO CON MATERIAL ARENOSO seleccionado	M3	827.23
1.11	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	3,781.98
2	MAMPOSTERIA Y PANETES		
2.1	MAMPOSTERIA BLOCK N° 4		
2.2	MAMPOSTERIA BLOCK N° 6	M2	294.42
2.3	PANETE INTERIOR	M2	558.90
2.4	PANETE EXTERIOR IMPERMEABILIZADO	M2	307.82
		M2	3,178.46
3	PISOS Y ADOQUINES		
3.1	PLANTILLA COLOCACION BALDOSAS CONCRETO DE 3.000 PSI DE 7 CM DE ESPESOR	M2	8,202.87
3.2	COLOCACION BALDOSA LOSETA DE CEMENTO CUADRATO GRIS PREPULIDA 0,30 m X 0,30 m	M2	-
3.3	COLOCACION ADOQUIN PEATONAL DE ARCILLA COCIDA 0,10 m X 0,2 m X 10 Cm de espesor	M2	658.43
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
4.1	CONCRETO Pobre 2500 PSI (SOLADO DE LIMPIEZA)	M2	1,644.77
4.2	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	60,326.71
4.3	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ESTRUCTURAS (CIMENTOS, MUROS, PLACAS BASE DE MONUMENTOS, CANALES, CJAS RECOLECTORAS, CANALES SUPERFICIALES, PILOTES. MUELLE, ETC)	M3	803.60
5	ESTRUCTURAS METALICAS		
5.1	FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	KG	23,191.41

CODIGO ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
5.2	COLUMNAS CIRCULARES METALICAS EN CAFETERIA C8A (D=8"), e = 5mm	ML	118.95
5.3	COLUMNAS METALICAS CIRCULARES EN CAFETERIA C8A (D=6"), e = 5mm	ML	9.44
5.4	COLUMNAS TUBULARES CUADRADAS 200 x 200 mm EN CAI Y BATERIA DE BAÑOS. e = 5mm	ML	-
5.5	PLATINAS 1/4" 400 X 400 mm	UNID	-
5.6	LOSAS CON STEELDECK		
5.6.1	LAMINAS DE STEELDECK 2" CALIBRE 22 EN CUBIERTA DE CAI Y BATERIA DE BAÑOS	M2	188.47
5.6.2	LOSETA DE CONCRETO 3500 psi LAMINA STEELDECK DE LA CUBIERTA DE CAI Y BATERIA DE BAÑOS. ESPESOR TOTAL DE LA LOSA e = 0,1 m	M3	45.60
5.6.3	CONCRETO DE 3500 psi EN PLACA DE CUBIERTA 1 CAFETERIA	M3	-
5.6.4	LAMINA DE STEELDECK EN PLACA DE CUBIERTA 1 CAFETERIA	M2	211.53
5.6.5	CONCRETO DE 3500 psi EN PLACA DE CUBIERTA 2 CAFETERIA	M3	-
5.6.6	LAMINA DE STEELDECK EN PLACA DE CUBIERTA 2 CAFETERIA	M2	-
5.6.7	CONCRETO DE 3500 psi EN PLACA DE PISO CAFETERIA	M3	40.00
5.6.8	LAMINA DE STEELDECK EN PLACA DE PISO CAFETERIA	M2	455.00
6	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS		
6.1	PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL		
6.1.1	PRELIMINARES		
6.1.1.1	Localización y Replanteo	ML	430.00
6.1.1.2	Demolición y Retiro de Escombros	M3	72.50
6.1.2	ESTRUCTURA		
6.1.2.1	Excavación a máquina	M3	1,479.54
6.1.2.2	Retiro de material sobrante	M3	936.82
6.1.2.3	Relleno an material seleccionado	M3	288.27
6.1.2.4	Solado en concreto de 3000 p.s.i. (e=0,05 m)	M2	290.05
6.1.2.5	Concreto de 4000 p.s.i. (Incluye formaleta e impermeabilizante)	M3	170.70
6.1.2.6	Aceros de 60000 p.s.i.	KG	8,330.50
6.1.2.7	Reconstrucción de vía vehicular, de 4.000 psi, producto de las demoliciones para realizar trabajos relacionados con la solución hidráulica, el concreto es de 20 cm de espesor con color integral rojo	M2	-
6.1.2.8	Construcción de Andén incluye Demolición y Retiro de Escombros	M2	1,879
6.1.2.9	Construcción de Sumidero Incluye Suministro e Instalación de rejilla de 1 m x 1.60 m	UND	-
6.1.2.10	Construcción de Sumidero Incluye Suministro e Instalación de rejilla de 1 m x 2.10 m	UND	-
6.1.2.11	Construcción de Cámara de Bombeo	UND	-
6.1.2.12	Suministro e Instalación de Equipos de Bombeo	UND	3.00
6.2	PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS		
6.2.1	BATERIA CAFETERIA		
6.2.1.1	Construcción de Sistema Hidráulico		
6.2.1.1.1	Suministro e Instalación de Tubería 1/2" PVC RDE 21	ML	2.77
6.2.1.1.2	Suministro e Instalación de Tubería 3/4" PVC RDE21	ML	4.41
6.2.1.1.3	Suministro e Instalación de Tubería 1" PVC RDE21	ML	0.80
6.2.1.1.4	Suministro e Instalación de Tubería 1 1/2" PVC RDE 21	ML	4.41
6.2.1.1.5	Suministro e Instalación de Tubería 2" PVC RDE 21	ML	10.22
6.2.1.1.6	Suministro e Instalación de Tubería 2 1/2" PVC RDE 21	ML	0.76
6.2.1.1.7	Punto Hidráulico Lavamanos	UND	7.00
6.2.1.1.8	Punto Hidráulico orinal	UND	3.00
6.2.1.1.9	Punto Hidráulico inodoro	UND	6.00
6.2.1.1.10	Suministro e Instalación de Codo de PVC 90° de 1/2"	UND	4.00
6.2.1.1.11	Suministro e Instalación de Codo de PVC de 90° de 1 1/2"	UND	1.00
6.2.1.1.12	Suministro e Instalación de Codo de PVC de 90° de 2"	UND	6.00
6.2.1.1.13	Suministro e Instalación de Codo de PVC de 90° de 2 1/2"	UND	1.00
6.2.1.1.14	Suministro e Instalación de Tee de PVC de 3/4"X1/2"	UND	4.00
6.2.1.1.15	Suministro e Instalación de Tee de PVC de 1"X1/2"	UND	1.00
6.2.1.1.16	Suministro e Instalación de Tee de PVC de 1 1/2"X1/2"	UND	6.00
6.2.1.1.17	Suministro e Instalación de Tee de PVC de 2"	UND	4.00
6.2.1.1.18	Suministro e Instalación de Tee de PVC de 2 1/2"	UND	1.00
6.2.1.1.19	Suministro e Instalación de Válvula de Compuerta RW 1/2"	UND	1.00

CODIGO ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
6.2.1.1.20	Suministro e Instalación de Válvula de Compuerta RW 2"	UND	2.00
6.2.1.1.21	Suministro e Instalación de reducción de 3/4x1/2"	UND	1.00
6.2.1.1.22	Suministro e Instalación de reducción de 1" x 3/4"	UND	2.00
6.2.1.1.23	Suministro e Instalación de reducción de 1 1/2" x 1/2"	UND	4.00
6.2.1.1.24	Suministro e Instalación de reducción de 1 1/2" x 1"	UND	2.00
6.2.1.1.25	Suministro e Instalación de reducción de 2"x1"	UND	1.00
6.2.1.1.26	Suministro e Instalación de reducción de 2"x1 1/2"	UND	2.00
6.2.1.1.27	Suministro e Instalación de reducción de 2 1/2"x2"	UND	1.00
6.2.1.1.28	Construcción de Tanque bajo de 1.2mx1mx1.5m	UND	-
6.2.1.1.29	Sistema de Bombeo incluye Suministro e Instalación de Bomba P=3 HP, CDT= 28.38 m, Q= 4.65 lps y Tanque Hidroneumático de 217 gal	GL	-
6.2.1.2	Construcción de Sistema Sanitario		
6.2.1.2.1	Suministro e Instalación de Tubería de Pvc de 2"	ML	32.43
6.2.1.2.2	Suministro e Instalación de Tubería de ventilación de Pvc de 2"	ML	25.20
6.2.1.2.3	Suministro e Instalación de Tubería de Pvc de 3"	ML	18.65
6.2.1.2.4	Suministro e Instalación de Tubería de Pvc de 4"	ML	138.81
6.2.1.2.5	Suministro e Instalación de Tubería de Pvc de 6"	ML	258.00
6.2.1.2.6	Punto sanitario lavamanos	UND	7.00
6.2.1.2.7	Punto sanitario inodoro	UND	6.00
6.2.1.2.8	Punto sanitario orinal	UND	8.00
6.2.1.2.9	Suministro e Instalación de Codo PVC 2" de 90°	UND	56.00
6.2.1.2.10	Suministro e Instalación de Tee de PVC de 2"	UND	3.00
6.2.1.2.11	Construcción de Registro Sanitario de 60 cm x 60 cm	UND	5.00
6.2.2	BATERIA CAI		
6.2.2.1	Construcción de Sistema Hidráulico		
6.2.2.1.1	Suministro e Instalación de Tubería 1/2" PVC RDE 21	ML	3.54
6.2.2.1.2	Suministro e Instalación de Tubería 3/4" PVC RDE 21	ML	5.51
6.2.2.1.3	Suministro e Instalación de Tubería 1 1/2" PVC RDE 21	ML	189.48
6.2.2.1.4	Suministro e Instalación de Tubería 2" PVC RDE 21	ML	9.70
6.2.2.1.5	Suministro e Instalación de Tubería 2 1/2" PVC RDE 21	ML	0.72
6.2.2.1.6	Punto Hidráulico Lavamanos	UND	6.00
6.2.2.1.7	Punto Hidráulico orinal	UND	3.00
6.2.2.1.8	Punto Hidráulico inodoro	UND	7.00
6.2.2.1.9	Suministro e Instalación de Codo de PVC 90° de 1/2"	UND	2.00
6.2.2.1.10	Suministro e Instalación de Codo de PVC de 90° de 3/4"	UND	3.00
6.2.2.1.11	Suministro e Instalación de Codo de PVC de 90° de 1 1/2"	UND	6.00
6.2.2.1.12	Suministro e Instalación de Codo de PVC de 90° de 2"	UND	4.00
6.2.2.1.13	Suministro e Instalación de Codo de PVC de 90° de 2 1/2"	UND	1.00
6.2.2.1.14	Suministro e Instalación de Tee de PVC de 3/4"x1/2"	UND	3.00
6.2.2.1.15	Suministro e Instalación de Tee de PVC de 1"x1/2"	UND	4.00
6.2.2.1.16	Suministro e Instalación de Tee de PVC de 1 1/2"	UND	2.00
6.2.2.1.17	Suministro e Instalación de Tee de PVC de 2"	UND	8.00
6.2.2.1.18	Suministro e Instalación de Tee de PVC de 2 1/2"	UND	1.00
6.2.2.1.19	Suministro e Instalación de Válvula de Compuerta RW 3/4"	UND	2.00
6.2.2.1.20	Suministro e Instalación de Válvula de Compuerta RW 1 1/2"	UND	2.00
6.2.2.1.21	Suministro e Instalación de Válvula de Compuerta RW 2"	UND	3.00
6.2.2.1.22	Suministro e Instalación de reducción de 3/4x1/2"	UND	5.00
6.2.2.1.23	Suministro e Instalación de reducción de 1 1/2 x 1/2"	UND	1.00
6.2.2.1.24	Suministro e Instalación de reducción de 2x1 1/2"	UND	1.05
6.2.2.1.25	Suministro e Instalación de reducción de 2 1/2x2"	UND	1.00
6.2.2.1.26	Construcción de Tanque bajo de 1.4mx1mx1.5m	UND	1.00
6.2.2.1.27	Sistema de Bombeo incluye Suministro e Instalación de Bomba P= 4 HP, CDT= 28.08 m, Q= 4.86 lps y Tanque Hidroneumático de 227 gal	UND	1.00
6.2.2.2	Construcción de Sistema Sanitario		
6.2.2.2.1	Suministro e Instalación de Tubería de Pvc de 2"	ML	8.72
6.2.2.2.2	Suministro e Instalación de Tubería de ventilación de Pvc de 2"	ML	10.55
6.2.2.2.3	Suministro e Instalación de Tubería de Pvc de 3"	ML	3.68
6.2.2.2.4	Suministro e Instalación de Tubería de Pvc de 4"	ML	35.68
6.2.2.2.5	Suministro e Instalación de Tubería de Pvc de 6"	ML	31.70

CODIGO ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
6.2.2.2.6	Punto sanitario lavamanos	UND	7.00
6.2.2.2.7	Punto sanitario inodoro	UND	8.00
6.2.2.2.8	Punto sanitario orinal	UND	3.00
6.2.2.2.9	Punto de Sifón de piso	UND	9.00
6.2.2.2.10	Suministro e Instalación de Codo PVC 2" de 90°	UND	3.00
6.2.2.2.11	Suministro e Instalación de Yee PVC de 4"	UND	2.00
6.2.2.2.12	Suministro e Instalación de Yee PVC de 2"	UND	2.00
6.2.2.2.13	Suministro e Instalación de Yee PVC de 4x2"	UND	6.00
6.2.2.2.14	Suministro e Instalación de Yee PVC de 4x3"	UND	1.00
6.2.2.2.15	Suministro e Instalación de Tee de PVC de 2"	UND	1.00
6.2.2.2.16	Construcción de Registro Sanitario de 60 cm x 60 cm	UND	9.00
6.2.3	SISTEMA DE RIEGO		
6.2.3.1	Suministro e Instalación de Tubería de Pvc de 1/2"	ML	373.63
6.2.3.2	Suministro e Instalación de Tubería de Pvc de 3/4"	ML	131.67
6.2.3.3	Suministro e Instalación de Tubería de Pvc de 1"	ML	6.51
6.2.3.4	Suministro e Instalación de Tubería de Pvc de 1 1/2"	ML	89.75
6.2.3.5	Suministro e Instalación de Bomba de Fuente de P= 2 hp, CDT = 5m	UND	-
6.2.3.6	Construcción de Cámara de Bombeo de Fuente	UND	-
6.2.3.7	Suministro e Instalación de Punto hidráulico para riego	UND	18.00
6.2.3.8	Suministro e Instalación de Medidores de 3/4"	UND	-
6.2.3.9	Suministro e Instalación de Medidores de 1"	UND	-
6.2.3.10	Suministro e Instalación de Medidores de 1 1/2"	UND	-
6.2.4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
6.2.4.1	Excavación	M3	202.70
6.2.4.2	Relleno material seleccionado	M3	65.87
6.2.4.3	Retiro de material sobrante	M3	286.91
6.2.4.4	Localización y replanteo	GL	1.00
6.2.4.5	Reconstrucción de Vía (incluye demolición y retiro de escombros)	M2	18.23
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS	UND	7.00
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES	UND	3.00
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	10.00
7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
7.1	Salidas para tomacorrientes	UN	13.00
7.2	Salidas para tomacorrientes 220V bifásicos	UN	1.00
7.3	Salida para luces y ventiladores en cafetería, CAI y baños	UN	73.00
7.4	Salida para luces 150W en zonas verdes, balas de piso HQL asimétricas, indulux BA y reflectores	UN	-
7.5	Salida para Led Hidroled 1,2W - 24V en paseo peatonal frente a cafetería	UN	-
7.6	Salidas para voz (teléfono)	UN	4.00
7.7	Acometida en 1" con 3#6 + 1#10T (a Tablero Baños)	ML	-
7.8	Acometida en 1" con 3#4 + 1#10T (a Tablero CAI)	ML	-
7.9	Acometida en 3/4" con 4#6 + 1#10T (a tablero Libreros)	ML	-
7.1	Acometida en 1-1/4" con 3#4 + 1#8 + 1#6T (Tab.Luces)	ML	-
7.11	Acometida en 1-1/4" con 4#4 + 1#10T (a Tab. Libreros 1)	ML	-
7.12	Acometida en 1-1/4" con 4#2 + 1#10T (a Tab. Cafetería)	ML	-
7.13	Salida eléctrica tablero libreros y libreros 1	UN	-
7.14	Acometida desde TMB-CAI hasta Unid. Manejadora con 3#12 en d=1/2"	ML	-
7.15	Acometida desde Unid. Manejadora hasta Unid. Condensadora con 3#12 + 3#16 en d=3/4"	ML	-
7.16	Malla de tierra	GLB	1.00
7.17	Celda de baja tensión	GLB	-
7.18	Sum e inst de tab MB de 12 ctos, Bifásico con puerta	UN	2.00
7.19	Sum e inst de tab MB de 8 ctos, Bifásico con puerta	UN	-
7.20	Sum e inst de caja para 4 cortacircuitos enchufables	UN	-
7.21	Sum e inst de tab MB de 36 ctos, trifásico con puerta	UN	-
7.22	Breaker enchufable monopolar 10 a 60 Amp	UN	-
7.23	Breaker enchufable bipolar 10 a 30 Amp	UN	-
7.24	Excavación y relleno de zanja	ML	919.04
7.25	Elaboración de registros de 0,6*0,6*0,8 de una tapa y con marco metálico, con ladrillo tolete o block #6	UN	-
7.26	Elaboración de registros de 1,3*1,6*1,0 de doble tapa y con marco metálico, con	UN	6.00

CODIGO ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
	ladrillo tolete o block #6		
7.27	Suministro e instalación de leds hidroled	UN	-
7.28	Suministro e instalación de lámpara fluorescente	UN	-
7.29	Suministro e instalación de Bala fluorescente 2*26w ó 1*13w	UN	67.00
7.30	Suministro e instalación de Bala de piso HQI asimétrica con bombillo 170W MH	UN	-
7.31	Suministro e instalación de lámpara alumbrado zonas verdes	UN	-
7.32	Suministro e instalación de lámpara indulux BA	UN	4.00
7.33	Suministro e instalación de Reflector RRA con bombillo MH de 250W	UN	-
7.34	Suministro e instalación de ventiladores de techo	UN	-
7.35	Protecciones aéreas en poste (transición red aérea a subterránea)	UN	-
7.36	Acometida en MT desde transición red aérea a subterránea hasta S/E Electricaribe con 3 XLPE#1/0	ML	-
7.37	Suministro e instalación de terminales premoledados uso exterior	GLB	-
7.38	Suministro e instalación de terminales premoledados uso Interior en celda compacta RM6	GLB	-
7.39	Suministro e instalación de celda compacta RM6 extensible de 200Amp, con transferencia en MT	GLB	-
7.40	Suministro e instalación de elementos eléctricos en S/E Parque centenario	GLB	-
7.4.1	Suministro e instalación de Transformador Pad Mounted de 400KVA, 13200/220-127V tipo malla con seccionador Interno	GLB	-
7.4.2	Acometida en BT desde Trafo 400KVA hasta celda Baja Tensión	ML	-
7.43	Acometida en MT desde S/E Electricaribe Parque Centenario con 3 XLPE#2 hasta centros de carga	ML	136.00
7.44	Empalmes en media tensión	UN	-
7.45	Acometida en 3" con 4#4/0 + 1#6T (a Trafo 30 KVA)	ML	-
7.46	Acometida en 2" con 4#2/0 + 1#6T (a Trafo 30 KVA y trafo de 50KVA)	ML	-
7.47	Acometida en 1-1/4" con 3#2 + 1#8T (a Trafo 15 KVA)	ML	-
7.48	Acometida en 3" con 4#250MCM + 1#4T (a Trafo 75 KVA)	ML	-
7.49	Acometida en 1-1/2" con 3#2/0 + 1#6T (a Trafo 25 KVA)	ML	-
7.50	Suministro e instalación de control de alumbrado	GLB	1.00
7.5.1	Trámites ante Electricaribe	GLB	1.00
7.5.2	Inspección RETIE	GLB	1.00
8.00	ACABADOS		
8.1	ESTUCO		
8.2	ESTUCO PLASTICO	M2	596.72
8.3	PINTURA MURO INTERIORES	M2	2,203.64
8.4	PINTURA MURO EXTERIORES	M2	691.13
8.5	GRANIPLAST	M2	5,304.88
8.6	CIELO RAZO EN DRYWALL	M2	-
8.7	PUERTAS	M2	327.00
8.7.1	PUERTA DE MADERA 0.9mX2.5m de celba con marco y herrajes, incluye pintura con barniz natural	UND	9.00
8.7.2	PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DIVISION DE BANO EN CAFETERIA 0.6mX2.0m	UND	-
8.7.3	PUERTA EN MADERA DOBLE 1.6mX2.5m	UND	-
8.7.6	PUERTA EN MADERA DE 0.6mX2.5m	UND	-
8.8	VENTANAS EN ALUMINIO	M2	7.53
8.9	BARANDAS METALICAS, ELABORADAS EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE, PASAMANO Y PARALES EN 1 1/2" PULGADAS Y TUBERIAS HORIZONTALES (Dos lineas) EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 1" ESCUDOS EN CADA PARAL DE APOYO QUE SE COLOCARAN CADA 2 MTS	ML	97.67
8.10	ENCHAPE BANOS		
8.10.1	CERAMICA PISOS DE 30X30 TRAFICO PESADO	M2	-
8.10.2	CERAMICA PARED DE 30X30	M2	82.00
8.11	BALDOSA PISOS		
8.11.1	BALDOSA TIPO DE GRANITO TERRASO DE 33X33 BLANCO PERLA GRANO 5	M2	221.51
8.11.2	BALDOSA TIPO DE GRANITO TERRASO TRAVERTINO VILLA DE LEIVA DE 33X33 GRANO 2	M2	182.96
8.12	CUBIERTA TEJA ARCILLA KIOSKO	M2	75.21
8.13	MOLDURAS, ZOCALOS DE CEMENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL		
8.13.1	MOLDURA TIPO A	ML	1,307.70
8.13.2	ZOCALO MOLDURA TIPO B	ML	816.44
8.14	IMPERMEABILIZACION	M2	578.05


CODIGO ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
9.00	MOBILIARIOS URBANOS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA		
9.1	CANECAS DE BASURA ACERO INOXIDABLE	UNID	45.00
9.2	BANCAS RAMBLA 200CM	UNID	40.00
9.3	MODULOS DE VENTA TIPO 1 (LIBREROS)	UNID	29.00
9.4	MUEBLES PUBLICITARIOS	UNID	-
9.5	CABINAS TELEFONICAS	UNID	-
9.6	POSTES ILUMINACION	UNID	-
9.7	CABINAS SANITARIAS BATERIA BANOS PUBLICOS Y DIVISIONES DE ORINALES EN ACERO INOXIDABLE	UNID	-
10.00	ARBORIZACION, JARDINES Y ZONAS VERDES, ELABORACION DE RETRETA		
10.1	JARDINES EN GRAMA (Siembra y mantenimiento durante 3 meses de gramilla soja japonesa, incluye 0.1 m3 tierra negra)	M2	8,949.36
10.2	Elaboración de Kiosko de la retreta, incluye cimentación columnas vigas aéreas, losa cubierta, detalles ornamentales, tales como basa, capiteles, molduras y escalinatas de acceso, la colocación del tejado esta en el ítem 8.12	Un	1.00
10.3	Mantenimiento impermeabilización y puesta en funcionamiento de cuerpo de agua	Gib	-
10.4	ARBOLES (Siembra de arboles de altura mínima 10"m)	UND	-
10.5	PLANTAS ORNAMENTALES	UND	180.00
11.00	MANTENIMIENTO Y ELABORACION E INSTALACION DE REJAS DE CERRAMIENTO DEL PARQUE INCLUYE LAS 3 PUERTAS		
11.1	MANTENIMIENTO DE REJAS EXISTENTES	ML	383.07
11.2	CONSTRUCCION DE TRAMOS NUEVOS DE REJA (AV. DANIEL LEMAITRE Y AV. DEL CENTENARIO)	ML	303.29
	ITEM NUEVOS		
12.1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE	ML	2,030.77
12.2	DESMONTE DE BANCAS DE CONCRETO Y/O MADERA Y/O METALICAS Y/O COMBINADAS	UND	37.00
12.3	DESMONTE DE SEÑALES REGLAMENTARIAS DE TRANSITO	UND	29.00
12.4	DESMONTE SEMAFOROS EXISTENTES, INCLUYE DEMOLICION DE CIMENTACION	UND	5.00
12.5	DESMONTE DE CANECAS DE BASURA	UND	5.00
12.6	ADECUACION DE TERRENO PARA CIMENTACION DE ESTRUCTURAS CON PIEDRA DE CIMIENTO Y TRITURADO 1-1/2in	M3	1,342.00
12.7	CONCRETO CICLOPEO	M3	89.04
12.8	DESMONTE DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA EXISTENTE	M2	125.00
12.9	ESCARIFICACION DE PAÑETE	M2	283.05
12.10	DESMONTE DE REJAS EXTERNAS	ML	654.97
12.11	TALA DE ARBOLES	UND	62.00
12.12	TRASLADO DE MONUMENTOS, INCLUYE CONSTRUCCION DE PEDESTAL	UND	3.00
12.13	TRASLADO DE REJAS EXISTENTES (NO INCLUYE MANTENIMIENTO)	ML	355.22
12.14	TRASLADO DE MONUMENTOS SIN PEDESTAL	UND	3.00
12.15	CORTE Y PERFILADO DE PAVIMENTO	ML	2,609.58
12.16	CONSTRUCCION DE BORDILLO DE CONCRETO EN 3000 PSI, SECCION 15 X 20 CMS. (NO INCLUYE ANCLAJE)	ML	319.82
12.17	RAMPAS PEATONALES	M2	48.20
12.18	COLOCACION DE LOSETA TACTIL PARA ANDENES EXTERIORES	ML	630.00
12.19	RETIRO Y REINSTALACION DE ADQUIN DE ARCILLA EXTERIOR	M2	1,209.42
12.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE IMPULSION PEAD 24in	ML	82.86
12.21	ALFAJIA 0.26 X 0.06 M, EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	2,723.94
12.22	PLATINA DE 3/4 in X 400 mm x 400 mm, INCLUYE PERNOS, RIGIDIZADORES Y GROUTING	UNID	32.00
12.23	COLOCACION BALDOSA LOSETA DE CEMENTO CUADRATO GRIS PREPULIDA 0.30 m X 0.30 m, PEGA CON MORTERO 1:4	M2	6,918.75
12.24	Cinta PVC V-15	ML	144.40
12.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO AGUAS LLUVIAS D=48in	ML	205.40
12.26	ARREGLO DE PORTADAS	UND	-
12.27	Suministro e instalacion de tuberia PVC D=6 de reserva para futuro cambio aereo a subteranea de alimentacion en media tension.	ML	8.00

CODIGO ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
12.28	Suministro e instalacion de tuberia PVC D=4 de reserva para futuro cambio aereo a subterranea de alimentacion en media tension.	ML	358.00
12.29	Suministro e instalacion de tuberia PVC D=3 de reserva para futuro cambio aereo a subterranea de acometidas en media tension.	ML	456.00
12.30	Suministro e instalacion de tuberia PVC D=1-1/2in de reserva para futuro cambio aereo a subterranea de acometidas en media tension.	ML	-
12.31	Acometida en 1 1/4" con 3#4 + 1#6 + 1#8 (Desde Celda BT#1 hasta Celda BT#2)	ML	94.12
12.32	Acometida en 3/4" con 2#8 + 1#8 + 1#10T (Desde Celda BT#2 hasta Tablero CAI)	ML	122.68
12.33	Acometida en 1 1/4" con 3#4 + 1#6 + 1#10T (Desde Celda BT#1 hasta Tableros librereros #1)	ML	210.56
12.34	Acometida en 1" con 3#8 + 1#8 + 1#10T (Desde Celda BT#2 hasta Tablero Luces)	ML	-
12.35	Acometida en 1" con 4#6 + 1#10 (Desde Celda BT#1 hasta Tab. Librereros #2)	ML	152.00
12.36	Acometida en 1" con 3#8 + 1#10 + 1#10 (Desde Celda BT #2 hasta Tab. Cafeteria)	ML	100.00
12.37	Acometida en 1/2" con 3#12 desde registro a cajas de 4 circuitos en Modulos de Librereros	ML	599.04
12.38	Suministro e instalacion de Celda de Baja Tension #1 (Segun Diagrama Unifilar)	UND	1.00
12.39	Suministro e instalacion de Celda de Baja Tension #2 (Segun Diagrama Unifilar)	UND	1.00
12.40	Suministro e instalacion Tablero MB de 12 Ctos, Trifasico con Puerta (Cafeteria)	UND	5.00
12.41	Suministro, Transporte e instalacion Tablero de 18 Ctos con Puerta (Luces)	UND	-
12.42	Suministro e instalacion de celda de medida Incluye 2 TPs y 3 TCs	UND	1.00
12.43	Suministro, Transporte e instalacion de Celda Seccionador. Incluye fusibles HH	UND	1.00
12.44	Suministro e instalacion de celda para trafo de 400 KVA tipo seco	UND	-
12.45	Acometida en BT desde Trafo 400KVA hasta celda Baja Tension # 1 (con 15 #500MCM por Carcamo)	ML	11.00
12.46	Suministro e instalacion de poste metalico LYRA BS de 7.5 m	UND	60.00
12.47	Suministro e instalacion de poste metalico LYRA BD de 7.5 m	UND	4.00
12.48	Suministro e instalacion luminaria ALBANY MIDI con reflector 1627, y bombilla de sodio de 70W	UND	60.00
12.49	Suministro e instalacion luminaria ALBANY MIDI con reflector 1627, y bombilla de sodio de 150W	UND	8.00
12.50	Suministro e instalacion de proyector NEOS 2, con reflector 1737, y bombilla de sodio de 70 W	UND	8.00
12.51	Salida para luces 150W en zonas verdes, balas de piso HQI asimetricas, indulux BA y reflectores	UND	-
	ITEM NUEVOS		
12.52	Bordillo en concreto de 3000 psi 0.15x0.40 (no incluye acero)	ML	71.90
12.53	Cuneta en concreto de 3000 psi, 0.55x20	ML	219.80
12.54	Anclajes en varilla 1/2" (no incluye acero)	UND	3,486.00
12.55	Registros 1.2x1.2x1.2 med. Interna en ladrillo tolete o bloque pañetado inc tapa	UND	1.00
12.56	Registros 1.0x1.0x1.0 med. Interna en ladrillo tolete o bloque pañetado inc tapa	UND	8.00
12.57	Registros 0.8x0.8x0.8 med. Interna en ladrillo tolete o bloque pañetado inc tapa	UND	22.00
12.58	Registros 1.3x1.3x1.3 med. Interna en ladrillo tolete o bloque pañetado inc tapa	UND	5.00
12.59	Refaccion total de arcadas principales	UND	8.00
12.60	Poda y mantenimiento de arboles	UND	100.00
12.61	Escaleras de acceso a cafeteria y kiosko altura 1.0 m (5 pasos)	ML	33.40
12.62	Instalaciones provisionales para librereros	UND	1.00
12.63	Acometida en 3/4" con 3#10 (Desde tablero de control de alumbrado a lamparas)	ML	3,718.00
12.64	Dilatacion en granito lavado ancho menor 0,50 incluye piran de aluminio	ML	95.71
12.65	Dilatacion en granito lavado ancho menor 0,30 sin piran de aluminio	ML	206.77
12.66	Dilatacion en granito lavado ancho menor 0,80 sin piran de aluminio	ML	92.75
12.67	Zocalo H=0.10 m en baldosa de granito	ML	81.18
12.68	Desbastada, pulida, brillada y cristalizada de piedra de granito blanco de 30 x 30	M2	419.52
	Estacion de bombeo y obras de drenaje		
12.69	Tablestacado de proteccion	m2	416.12
12.70	Manejo de aguas	und	1.00
12.71	Suministro e instalacion de manifold	und	-
factado	Excavacion a mano	M3	121.18
factado	Excavacion a maquina	M3	487.20
factado	Retiro de material sobrante	M3	1,297.52
factado	Concreto de 4000 p.s.l. (incluye formaleta e impermeabilizante)	M3	149.45


CODIGO ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
	REFRACCION DE CANCHA MULTIPLE, PISTA DE PATINAJE Y CAMERINOS		-
	Obras preliminares y civiles		-
12.110	Demolicion de estructuras en concreto	M3	-
12.111	Demolicion de pavimentos	M2	-
12.112	Cerramiento provisional en tela incluye parales. H = 2 ML.	ML	-
12.113	Desmonte de malla eslabonada	M2	-
12.114	Estuco	M2	-
12.115	Pañete interior	M2	-
12.116	Pintura muros	M2	-
12.117	Escarificacion de pañete	M2	-
12.118	Mamposteria Block No. 4	M2	-
12.119	Demolicion de andenes	M2	-
12.120	Excavacion a mano	M3	-
12.121	Relleno con material seleccionado	M3	-
12.122	Concreto pobre de 2500 psi para solado	M2	-
12.123	Corte y perfilado de pavimento	ML	-
12.124	Acero de refuerzo	KG	-
12.125	Concreto de 3500 para estructuras	M3	-
	CANCHA MULTIPLE DE 16 x 28 MTS.		
12.126	Suministro, colocación e instalación de cerramiento en malla rígida plastificada, Cal 9 ojo 5cms. Incluye: Pintura, parales, piamigos, rombos, faroles, pisamalla triangular 0.15x0.15.	M2	558.90
12.127	Placa de concreto para pista y/o cancha multiple en concreto 3.9 kg/cm2, espesor 0.18 m. Incluye base en suelo cemento al 4%	M2	548.10
12.128	Demarcacion de cancha de Hockey y Patinaje; o; cancha multiple	UND	-
12.129	Sumnistro de Parales desmontables para voleibol en tubería, sellado en 2", argollas de nivel, tensor, grilletes, bases de anclaje con bujes. Incluye malla	UN	-
12.130	Sumnistro de Estructura metálica de 1.10 de altura para el Juez Arbitro (Voleibol)	UN	-
12.131	Mantenimiento estructura metalica de cubierta y cambio de laminas deterioradas remodelacion de baños, camerinos existentes y zonas aledañas	UN	-
12.132	Excavacion a mano	m3	46
12.133	Demolicion de estructuras en concreto	m3	-
12.134	Relleno con material seleccionado	M3	-
12.135	Concreto de 3500 psi para estructuras	M3	-
12.136	Acero de refuerzo	KGS	-
12.137	mamposteria Block No. 4	M2	-
12.138	Pañete interior	M2	-
12.139	Plantilla colocacion baldosas concreto de 3000 psi de 7 cm de espesor	M2	-
12.140	Colocacion de baldosa loseta de cemento cuadrato gris prepulida 0.30 x 0.30 m, pega con mortero 1:4	M3	-
12.141	Estuco	M2	-
12.142	Estuco plastico	M2	-
12.143	Cielo raso en dry wall	M2	-
12.144	Puertas de madera 0.9x2.0 m Incluye pintura y herrajes	UND	-
12.145	Pintura muros	M2	-
12.146	Cubierta en lamina perfil 7	M2	-
12.147	ventanas en aluminio	M2	-
12.148	Ceramica de pisos 30x30 trafico pesado	M2	-
12.149	Ceramica de pared 30x30	M2	-
12.150	Suministro e instalacion de sanitarios	UND	-
12.151	Suministro e instalacion de lavamanos	UND	-
12.152	Puerta de acero inoxidable division de baño en camerinos 0.8*2	UND	-
12.153	Red sanitaria	und	-
12.154	Red hidraulica	und	-
	Otras actividades		
12.155	Construccion de cuarto de valvulas y equipos de fuente, incluya accesorios y tuberias a fuente	und	1.00
12.156	Puertas de aluminio de 1.6x2.0 m tipo machimbre para subestacion electrica	und	3.00
12.157	Construccion de canal metalico 0.30x0.15	ml	10.00
12.158	Frenteros en superboard para cafeteria	ml	82.13
12.159	cerramiento en lamina clibre 20 y posteria galvanizada	m2	-
12.160	suministro e instalacion de adhesivo con imagen y/o texto	m2	-

En virtud de lo anterior se dan por recibidas las obras motivo del contrato de la referencia a entera satisfacción de las partes sin que lo anterior releve al contratista de sus responsabilidades y obligaciones conforme lo establecido en el contrato inicialmente mencionado y las establecidas en las normas legales vigentes en materia contractual. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo las responsabilidades expresa de los que intervienen en el, a los 20 días del mes de Noviembre del 2013.

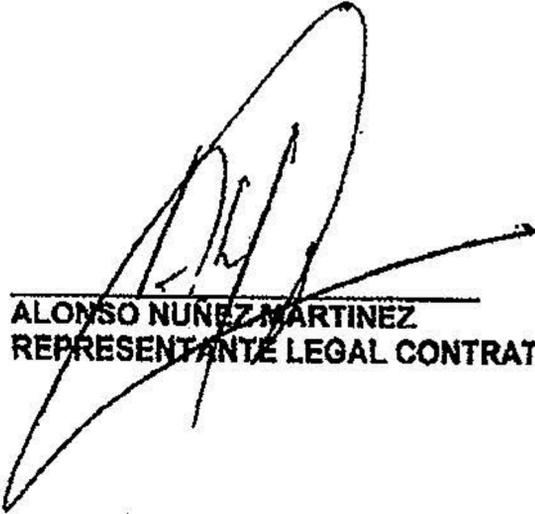

ALONSO NUNEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

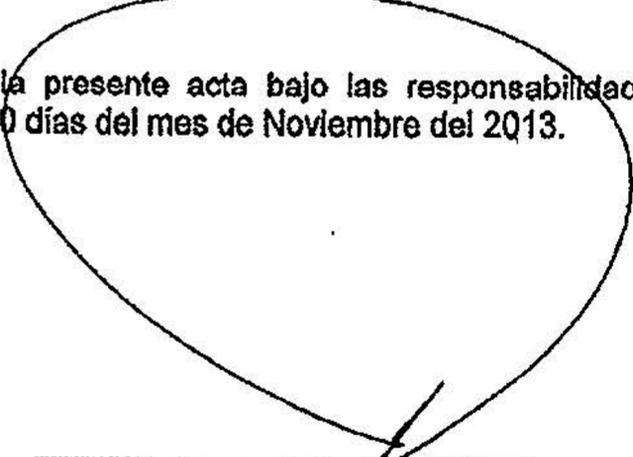

SANTIAGO LUIS RIZO BELGADO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.308.620**

SARMIENTO ALVAREZ
APELLIDOS

ALFREDO LUIS
NOMBRES

Alfredo Sarmiento Alvarez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-FEB-1971**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

30-JUN-1989 PUERTO COLOMBIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00203131-M-0072308620-20091212 0018992931A 1 1210109326

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

6

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO No.:	133-134
OBJETO:	LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA PLAZA DE LA ADUANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	PLAZA DE LA ADUANA CARTAGENA
PLAZO INICIAL:	Seis (06) Meses
FECHA DE INICIACIÓN:	16 de Julio de 2011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.917.497.643,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLAZA ADUANA - CARTAGENA
INTERVENTOR:	CONSORCIO CARINSA-INCOPLAN-II
CONTRATANTE:	DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

A. PRORROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
Modificadorio 002/2011	13 de Diciembre de 2011	30 Días
Modificadorio 002/2012 por Ampliación de Plazo	14 de Febrero de 2012	75 Días
Modificadorio 003/2012 por Ampliación de Plazo	08 de Junio de 2012	24 Días
Modificadorio 004/2012 por Precio Unitario y Plazo.	29 de Junio de 2012	Hasta 31 de Julio de 2012
Modificadorio 2012 por Ampliación de Plazo.	31 de Julio de 2012	Hasta 25 de Agosto de 2012

B. SUSPENSIONES Y REINICIO

ACTAS No.	FECHA
Acta de Suspensión de Plazo	04 de Abril de 2012
Acta de Reinicio de Plazo	16 de Mayo de 2012

C. ADICIONES

ADICION No.	VALOR (\$)
Modificadorio 004/2012 por Precio Unitario y Plazo.	\$ 358,900,000

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	12.9 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	25 de Agosto de 2012
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 3,276,397,643

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A los Cuatro (4) días del mes de Octubre de 2012, se reunieron el Ing. Santiago Luis Rizo Delgado como representante legal del Consorcio CARINSA-INCOPLAN-II en su calidad de interventor del contrato No. 133-134 y el Ing. Alonso Núñez Martínez en representación del contratista con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato, dado que se cumplió el plazo del contrato.

ESTADO DEL CONTRATO

CÓD.	ITEM	UNIDAD	CANTIDADES
1	TRAZADO Y LOCALIZACIÓN, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS		
1.1	Localización y Replanteo	M2	5,222.00
1.2	cerramiento provisional de obra	ML	503.58
1.3	Demolición de estructuras en concreto	M3	209.33
1.4	Demolición de andenes en concreto	M3	64.71
1.5	Demolición de bordillos en concreto	ML	285.86
1.6	Demolición de pavimento	M2	1,018.75
1.7	Excavación con maquinaria	M3	-
1.8	Excavación manual	M3	2,132.92
1.9	Retiro de material sobrante	M3	4,021.05
1.10	Relleno con material del sitio	M3	45.22
1.11	Relleno con material areno	M3	81.81
1.12	Relleno con material seleccionado	M3	172.02
1.13	Relleno con tierra negra	M3	36.68
1.14	Relleno con suelo cemento	M2	2,944.76
2	PAVIMENTOS EN CONCRETO Y ESTAMPADO DE PISOS		
2.1	Reconstrucción de placas de concreto en color natural	M2	178.56
2.2	Pavimentos en concretos de 4000 psi con color integral resistencia a la flexión 600psi (Mr=42 Kg/Cm2)	M2	3,982.31
2.3	Estampado de piso	M2	4,756.77
2.4	Dilataciones para piso	ML	5,177.49
3	ANDENES Y BORDILLOS		
3.1	Andenes en concreto estampado, con color integral	M2	826.37
3.2	Bordillo de concreto de 3000psi de .30x.15	ML	-
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
4.1	Concreto pobre (Solado)	M2	611.93
4.2	Acero de refuerzo	KG	77,085.46
4.3	Concreto sw 4000psi para estructuras(cimientos muros, placas bases de monumentos placa superior estación de bombeo aguas residuales)	M3	38.20

CÓD.	ITEM	UNIDAD	CANTIDADES
4.4	Anclajes de 3/8 con epoxicos	UNID	5,215.00
4.5	Canal perimetral sub estación de bombeo aguas negras en concreto de 3000 psi de 0.6x0.6	ML	-
4.6	Rejilla de hierro colado para canal perimetral sub estación eléctrica	ML	-
5	BAJADA DE ALTURA DE LA SUB ESTACIÓN DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS		
5.1	Rotura de concreto armado	M3	13.00
5.2	Construcción en concreto y acero de viga canal con concreto de 3500psi	M3	-
5.3	Concreto 4000 PSI para muros Incluye formaleta	M3	57.77
5.4	Concreto 4000 PSI para Tapa Incluye formaleta	M3	-
5.5	Acero de 6000PSI	KG	-
5.6	Perforación en muro para cables de los sensores de nivel	UND	1.00
5.7	Sika anclaje y Sikadur 32 Premier para anclaje de acero y unión de concreto nuevo y existente	UND	1.00
5.8			-
5.9	Suministro y colocación de epóxico		-
5.10	En tapa zona de pozo húmedo	M2	25.00
5.11	En muros zona de pozo húmedo	M3	14.00
5.12			-
5.13	Obras eléctricas (Cableado eléctrico tapa pozo seco para iluminación interna)	UND	-
5.14			-
5.15	Entarimado de protección de equipos eléctricos y mecánicos en pozo seco y húmedo	UND	1.00
5.18	Tapas para pozo seco y húmedo en en pvc o fibra de vidrio con alma de acero, incluye candado y las obras complementarias para su instalación	UND	-
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
6.1	Salida para led hidroled	ML	38.00
6.2	Extensión Acometida a balas de piso existente en pedestal estatua, d=1/2" con 3#12	ML	94.20
6.3	Suministro e instalación de Led Hidroled 1,2W	UN	40.00
6.4	Desmote de bala de piso existente en pedestal estatua Cristóbal Colón e instalación en nueva ubicación	UN	20.00
6.5	Adecuación de S/E Electricaribe del SENA - CENTRO	GLB	1.00
6.6	Acometida en MT desde S/E SENA hasta transformador 225KVA, en D=3" con 3XLPE#2, mas 1*3" PVC de reserva	ML	-


CÓD.	ITEM	UNIDAD	CANTIDADES
6.7	Suministro e instalación de Transformador Pad Mounted trifásico 225 KVA	UN	-
6.8	Acometida en BT desde trafo 225KVA hasta tablero de bombas, con 3#4/0 por fase + 1#4/0 neutro + 1#2/0T	ML	-
6.9	Suministro e instalación de tablero de bombas con protecciones	GLB	-
6.10	Acometida a bombas desde tablero de bombas, con 2#250MCM por fase + 1#2T, en D=4". Incluye 1*1-1/2"PVC Reserva	ML	-
6.11	Malla de tierra	GLB	-
6.12	Elaboración de registros	UN	29.00
7	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS		
7.1	Suministro e instalación de tubería de drenaje en PVC de 6"	ML	25.00
7.2	Suministro e instalación de tubería de drenaje en concreto de 24"	ML	-
7.3	Construcción de canal perimetral de desagüe con concreto de 3000psi, la sección del canal es de acuerdo al diseño de los planos hidráulicos	ML	-
7.4	Rejillas de desagüe en hierro dulce	UN	-
7.5	Cárcamo en concreto sección de 0.6x0.40m incluye rejilla en hierro dulce	ML	-
7.6	Sistema de bombeo de aguas lluvias y mareas, con bombas sumergible cuya especificación se encuentra en los planos hidráulicos y sanitarios	GBL	1.00
8	ARBORIZACIÓN Y AMOBLAMIENTO		
8.1	Suministro y siembra de árboles de CEDRO	Un	11.00
8.2	Suministro e instalación de bolardos	Un	298.00
8.3	Suministro e instalación de bolardo hidráulico	Un	2.00
8.4	Traslado y restauración de monumento a Colon	Un	1.00
8.17	Retoque con pintura de cal a áreas de edificios afectados	M2	180.00
9	ITEMS NO PREVISTOS ACTA ANTERIOR		
9.1	GEOMALLA LBO-212	M2	2,168.00
9.2	COLOCACIÓN DE LOSETA TÁCTIL PARA ANDENES EXTERIORES	ML	246.33
9.3	Desmonte de rejas estatua colon	ML	16.33
9.4	DESMONTE DE BANCAS DE CONCRETO Y/O MADERA Y/O METÁLICAS Y/O COMBINADAS	UND	3.00
9.5	Corte y perfilado de pavimento	ML	3,262.55
9.6	Riego de liga	M2	2,813.11
9.7	Retiro y botada de plantas	UND	56.00
9.8	Geotextil NT 3000	M2	2,183.00
9.9	Plaqueta prefabricada tapa canal espesor 15 cms, ancho 25 cms, longitud 1.20 m	UND	1,005.00
9.10	Suministro e instalación de tubería 12in para ventilación EBAR, incluye	ML	112.08

En virtud de lo anterior se dan por recibidas las obras motivo del contrato de la referencia a entera satisfacción de las partes sin que lo anterior releve al contratista de sus responsabilidades y obligaciones conforme lo establecido en el contrato inicialmente mencionado y las establecidas en las normas legales vigentes en materia contractual. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo las responsabilidades expresa de los que intervienen en el, a los 3 días del mes de diciembre del 2012.



ALONSO NUNEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

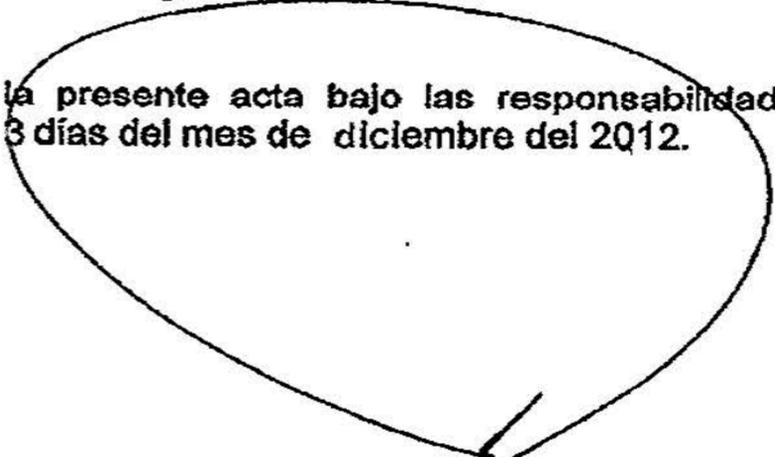

SANTIAGO LUIS RIZO BELGADO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **73137670**

NUNEZ MARTINEZ
APELLIDOS

ALONSO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-ABR-1968**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

15-JUL-1987 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-0500100-30094474-M-0073137670-20020125

00840 02025A 01 101980104

USO EXCLUSIVO
INSTRUMENTOS DE INGENIERIA S.A.S.

2. Concepto Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14686751186



(415)7707212489984(8020)0000014686751186

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 0 1 1 0 9 5 2

6. DV

- 3

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

AS PROYECTOS S.A.S.

36. Nombre comercial:

AS PROYECTOS S.A.S.

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio:

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CR 56 66 86

42. Correo electrónico:

contabilidad@asproyectos.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

3 2 0 1 4 0 2

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 6 0 9 2 1

Actividad secundaria

48. Código:

4 1 1 2

49. Fecha inicio actividad:

2 0 0 6 0 9 2 1

Otras actividades

50. Código:

4 1 1 1

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	8	9	1	4	4	2	4	8																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57. Modo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		58. CPC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha:

2 0 2 0 0 3 0 6

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SARMIENTO ALVAREZ ALFREDO LUIS

985. Cargo: Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14676968093



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 1 4 5 0 5 0 - 6	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
--	------------	--	----------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="text"/>
65. Fondos	<input type="text"/>	66. Cooperativas	<input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="text"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="text"/>	70. Beneficio	<input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text"/>	82. Nacional:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> %
72. Número:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text"/>	83. Nacional público:	<input type="text" value="0"/> %
73. Fecha:	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/>	<input type="text"/>	84. Nacional privado:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> %
74. Número de Notaría:	<input type="text" value="9"/>	<input type="text"/>	85. Extranjero:	<input type="text" value="0"/> %
75. Entidad de registro	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	86. Extranjero público:	<input type="text" value="0"/> %
76. Fecha de registro:	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>	<input type="text"/>	87. Extranjero privado:	<input type="text" value="0"/> %
77. No. Matrícula mercantil:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="6"/>	<input type="text"/>		
78. Departamento:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/>	<input type="text"/>		
79. Ciudad/Municipio:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>		
Vigencia:				
80. Desde:	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="Año"/> <input type="text" value="Mes"/> <input type="text" value="Día"/>		
81. Hasta:	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="Año"/> <input type="text" value="Mes"/> <input type="text" value="Día"/>		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	<input type="text"/>	<input type="text" value="Año"/> <input type="text" value="Mes"/> <input type="text" value="Día"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text" value="Año"/> <input type="text" value="Mes"/> <input type="text" value="Día"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text" value="Año"/> <input type="text" value="Mes"/> <input type="text" value="Día"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text" value="Año"/> <input type="text" value="Mes"/> <input type="text" value="Día"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text" value="Año"/> <input type="text" value="Mes"/> <input type="text" value="Día"/>	<input type="text"/>

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14676968093



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 1 4 5 0 5 0 - 6	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
--	------------	--	----------------------------

Representación

1	98. Representación: REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 0 7 0 4 1 7
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación: 1 3 7 2 1 6 8 0 0 0
	102. DV -	103. Número de tarjeta profesional:
	104. Primer apellido RIPOLL	105. Segundo apellido VARELA
	106. Primer nombre IVAN	107. Otros nombres MANUEL
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT): -	109. DV -
	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación: REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 0 8 0 7 2 1
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación: 1 3 2 2 7 4 6 3 8 7
	102. DV -	103. Número de tarjeta profesional:
	104. Primer apellido ARJONA	105. Segundo apellido ROBLEDO
	106. Primer nombre PATIANA	107. Otros nombres PATRICIA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT): -	109. DV -
	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación: Año Mes Día
	100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
	102. DV -	103. Número de tarjeta profesional:
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido
	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT): -	109. DV -
	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación: Año Mes Día
	100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
	102. DV -	103. Número de tarjeta profesional:
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido
	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT): -	109. DV -
	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación: Año Mes Día
	100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
	102. DV -	103. Número de tarjeta profesional:
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido
	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT): -	109. DV -
	110. Razón social representante legal	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14676968093



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 1 4 5 0 5 0 - 6	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
--	------------	--	----------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación: 7 2 1 6 8 0 0 0	113. DV 1 3	114. Nacionalidad: COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido RIPOLL	116. Segundo apellido VARELA	117. Primer nombre IVAN	118. Otros nombres MANUEL	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio: 19,000,000	121. % Participación: 9 5	122. Fecha de ingreso: 2 0 0 7 0 3 2 7	123. Fecha de retiro: Año Mes Día	
2	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación: 9 2 2 2 6 4 9 7	113. DV 1 3	114. Nacionalidad: COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MARTINEZ	116. Segundo apellido MONTES	117. Primer nombre DOMINGO	118. Otros nombres ANTONIO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio: 1,000,000	121. % Participación: 5	122. Fecha de ingreso: 2 0 0 7 0 3 2 7	123. Fecha de retiro: Año Mes Día	
3	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV -	114. Nacionalidad:	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: AAAA MM DD	123. Fecha de retiro: Año Mes Día	
4	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV -	114. Nacionalidad:	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: AAAA MM DD	123. Fecha de retiro: Año Mes Día	
5	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV -	114. Nacionalidad:	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: AAAA MM DD	123. Fecha de retiro: Año Mes Día	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14676968093



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 1 4 5 0 5 0 - 6	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
--	------------	--	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal	124. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación: 1 3 8 7 6 9 7 5 6	126. DV -	127. Número de tarjeta profesional: 2 5 8 7 T
	128. Primer apellido MONTES	129. Segundo apellido GARCIA	130. Primer nombre JUAN	131. Otros nombres CARLOS
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT):	133. DV -	134. Sociedad o firma designada:	
135. Fecha de nombramiento 2 0 1 2 1 2 0 4				
Revisor Fiscal Suplente	136. Tipo de documento:	137. Número de identificación:	138. DV -	139. Número de tarjeta profesional:
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT):	145. DV -	146. Sociedad o firma designada:	
147. Fecha de nombramiento Año Mes Día				
Contador	148. Tipo de documento:	149. Número de identificación:	150. DV -	151. Número de tarjeta profesional:
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT):	157. DV -	158. Sociedad o firma designada:	
159. Fecha de nombramiento Año Mes Día				


Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14676968093



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 1 4 5 0 5 0 - 6	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla	14. Buzón electrónico 2
--	------------	--	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica: Comercio de partes, piezas (autopa 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO LTDA.	
163. Departamento: Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio: Barranquilla 0 0 1
165. Dirección: AV CIRCUNVALAR CL 110 35 78 BG 3	
166. Número de matrícula mercantil: 0 0 0 0 4 3 3 3 3 7	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 7 0 4 1 7
168. Teléfono: 3 5 6 6 9 7 7	169. Fecha de cierre MM DD
160. Tipo de establecimiento:	161. Actividad económica:
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento:	164. Ciudad/Municipio:
165. Dirección:	
166. Número de matrícula mercantil:	167. Fecha de la matrícula mercantil: AAAA MM DD
168. Teléfono:	169. Fecha de cierre AAAA MM DD
160. Tipo de establecimiento:	161. Actividad económica:
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento:	164. Ciudad/Municipio:
165. Dirección:	
166. Número de matrícula mercantil:	167. Fecha de la matrícula mercantil: AAAA MM DD
168. Teléfono:	169. Fecha de cierre AAAA MM DD

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 174290290



WEB
20:17:39
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de agosto del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALFREDO LUIS SARMIENTO ALVAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 72308620:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 21 de agosto de 2021, a las 20:05:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	72308620
Código de Verificación	72308620210821200515

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 174290338



WEB
20:20:41
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de agosto del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) AS PROYECTOS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9001109523:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 21 de agosto de 2021, a las 20:07:51, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9001109523
Código de Verificación	9001109523210821200751

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 174290447



WEB
20:26:52
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de agosto del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO LIMITADA identificado(a) con NIT número 9001450506:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 21 de agosto de 2021, a las 20:08:11, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9001450506
Código de Verificación	9001450506210821200811

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.168.000**
RIPOLL VARELA

APELLIDOS
IVAN MANUEL

NOMBRES


 FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-SEP-1970**
BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 **A+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

16-ENE-1989 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300100-00057823-M-0072168000-20080823 0002514225A 2 3390010882

INSTITUCION NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1564F05B694F1269

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MILENA PATRICIA OROZCO GUERRERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32878825 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 175624-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1564F05B694F1269

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MILENA PATRICIA OROZCO GUERRERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32878825 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 175624-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 A 0 0 4 0 E E 5 7 B 7 9 A 5 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS MONTES GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8769756 de SOLEDAD (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 78897-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 A 0 0 4 0 E E 5 7 B 7 9 A 5 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS MONTES GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8769756 de SOLEDAD (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 78897-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JORGE ELIECER VERA ROSES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 13437936, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-26111 desde el 20 de Agosto de 1987, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 127.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Agosto del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 173567048



WEB
17:29:07
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de agosto del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALONSO NUNEZ MARTINEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 73137670:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 173567198



WEB
17:30:23
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de agosto del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS SIGLA JFALSM ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NIT número 8020236269:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 11 de agosto de 2021, a las 17:15:37, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	73137670
Código de Verificación	73137670210811171537

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 11 de agosto de 2021, a las 17:16:28, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	802023626
Código de Verificación	802023626210811171628


Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



Banco Caja Social

Certifica que el cliente:

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO SAS

Identificado con Nit. 900.145.050-6

Actualmente posee el siguiente producto, radicado en la oficina 0407 CALLE 84, con las siguientes características:

CUPO EMPRESARIAL – COMERCIAL

Numero: **31006530604**

Cupo Aprobado: \$1.000.000.000

1. Esta constancia se expide con destino a: PAF-EUC-O-018-2022 ; "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Valor del cupo: \$ 758.000.000

Realizada en la oficina 0407 Calle 84 de la ciudad de Barranquilla, a los 8 días del mes de Abril de 2022.


Cordialmente,



SUGHEY YEPES DURAN

Gerente Calle 84

Tel. 3697575 Ext. 47040 Cel. 3002009515



CONSORCIO PARQUE CENTENARIO CARTAGENA**DOCUMENTO CONSORCIAL**

Barranquilla, Febrero 25 de 2011.

Señores

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL.
Plaza de La Aduana Palacio Municipal, Piso N° 2
Cartagena de Indias.

Ref.: Licitación Pública No 001-2011, cuyo objeto es: **LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE CENTENARIO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA**

Los suscritos, ALONSO NUÑEZ MARTINEZ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S, NIT. 802.023.626-9 e identificado con la cedula No 73.137.670 de Cartagena y JAIRO RAMON ALDANA BULA, identificado con la cedula de ciudadanía No 15.039.021, de Sahagún -Córdoba, quien actúa en nombre de JA ASOCIADOS S.A., NIT. 890.116.998-3, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en la contratación de la referencia cuyo objeto es **LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE CENTENARIO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA** y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y estará vigente hasta la liquidación del contrato, y un año (1) más contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la ejecución de la obra o de la vigencia del contrato.

1. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	IDENTIFICACION-NIT.	PARTICIPACION (%) (1)
JA ASOCIADOS S.A.	890.116.998-3	50%
JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S	802.023.626-9	50%
TOTAL		100%


(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

- El Consorcio se denomina **CONSORCIO PARQUE CENTENARIO CARTAGENA**.
- La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria
- El representante Legal del Consorcio es ALONSO NUÑEZ MARTINEZ, identificado con la C.C. No. 73.137.670, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la Propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.


El Representante Legal Suplente es JAIRO RAMON ALDANA BULA, identificado con la C.C. No.15.039.021 de Sahagún -Córdoba 8.687.003, quien en ausencia temporal o definitiva del principal tendrá las mismas funciones y facultades.

5. La sede del Consorcio es:
Dirección de correo: Carrera 50 No 84-115.
Dirección Electrónica: jallicitaciones@yahoo.com Y
Teléfono(s): 3786658 – 3786656 – 3584499
Telefax: 3786658 – 3786656 – 3584499
Teléfono Móvil: 3008428200 - 3007101292
Ciudad: BARRANQUILLA

En constancia, se firma en Barranquilla, a los veinticinco (25) días del mes de Febrero de 2011.



JAIRO RAMON ALDANA BULA
ALONSO NUÑEZ MARTINEZ
Representante Legal
C.C. No. 73.137.670 de Cartagena




JA ASOCIADOS S.A.
JAIRO RAMON ALDANA BULA.
Representante Legal.
C.C. No.15.039.021 de Sahagún -Córdoba.

ACEPTO,
Firma del Representante Legal del
Consorcio



ALONSO NUÑEZ MARTINEZ
C.C. 73.137.670 de Cartagena
Representante Legal
CONSORCIO PARQUE CENTENARIO CARTAGENA

ACEPTO,
Firma del Representante Legal
Suplente del Consorcio



JAIRO RAMON ALDANA BULA
C.C. 15.039.021 de Sahagún-Córdoba.
Suplente del Representante Legal
CONSORCIO PARQUE CENTENARIO CARTAGENA

CONSORCIO PLAZA ADUANA- CGENA

032

ACUERDO CONSORCIAL

Barranquilla, Febrero 25 de 2011.

Señores
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL.
Plaza de La Aduana Palacio Municipal, Piso N° 2
Cartagena de Indias.

Ref.: Licitación Pública No 003-2011, cuyo objeto es: LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA PLAZA DE LA ADUANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.

Los suscritos **ALONSO NUÑEZ MARTINEZ** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S, Nit. 802.023.626-9 e identificado con la cedula No 73.137.670 de Cartagena, JAIRO RAMON ALDANA BULA, identificado con la cedula de ciudadanía No 15.039.021, de Sahagún - Córdoba quien representa a JA ASOCIADOS S.A Nit. 890.116.998-3 y HECTOR BERNARDO VERA KIDD, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.690.362, quien actúa en nombre de H.V.INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LTDA. Nit. 800.195.564-0, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en la contratación de la referencia cuyo objeto es LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA PLAZA DE LA ADUANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y estará vigente hasta la liquidación del contrato, y un año (1) más contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la ejecución de la obra o de la vigencia del contrato.

1. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	IDENTIFICACION-NIT.	PARTICIPACION (%) (1)
JA ASOCIADOS S.A.	890.116.998-3	47.5%
JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S	802.023.626-9	47.5%
H.V. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LTDA	800.195.564-0	5%
TOTAL		100%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO PLAZA ADUANA-CGENA.

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria

4. El representante Legal del Consorcio es ALONSO NUÑEZ MARTINEZ, identificado con la C.C. 73.137.670 No. quien está expresamente facultado para firmar, presentar la Propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

El Representante Legal Suplente es JAIRO RAMON ALDANA BULA, identificado con la C.C. No.15.039.021 de Sahagún -Córdoba 8.687.003, quien en ausencia temporal o definitiva del principal tendrá las mismas funciones y facultades.

5. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: Carrera 50 No 84-115.
Dirección Electrónica: jallicitaciones@yahoo.com Y
Teléfono(s): 3786658 – 3786656 – 3584499

Carrera 50 No 84 – 115 Local 1, Teléfonos: 3786658 – 3786656 -Cel: 3008428200-3007101292
Email: apingenierocivil@hotmail.com-jallicitaciones@yahoo.com Barranquilla –Colombia

CONSORCIO PLAZA ADUANA- CGENA

Telefax: 3786658 – 3786656 – 3584499
Teléfono Móvil: 3007101292
Ciudad: BARRANQUILLA

En constancia, se firma en Barranquilla, a los cuatro (25) días del mes de Febrero de 2011.

JAI ME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S
ALONSO NUÑEZ MARTINEZ Representante Legal
CC. No. 73.137.670 de Cartagena

JA ASOCIADOS S.A.
JAIRO RAMON ALDANA BULA.
Representante Legal.
CC. No.15.039.021 de Sahagún – Córdoba.

HECTOR BERNARDO VERA KIDD
H.V. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LTDA.
Representante Legal.
CC. No. 8.690.362

ACEPTO,

ALONSO NUÑEZ MARTINEZ
Representante Legal **CONSORCIO PLAZA ADUANA CARTAGENA**

ACEPTO,

JAIRO RAMON ALDANA BULA
C.C. 15.039.021 de Sahagún-Córdoba.
Suplente del Representante Legal –CONSORCIO PLAZA ADUANA CARTAGENA
