MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y REPORTE DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE CIUDADES Y COMPETITIVIDAD
VICEPRESIDENCIA COMERCIAL

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS REGIONALES DE INVERSIÓN
ANEXO A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
REGIÓN AMAZONÍA

No.	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN EN DIAS (calendario)	HITO
0	**Fase Alistamiento: Definición del Plan de trabajo**	**15/02/2024**	**19/02/2024**	**7**	
0,1	Desarrollo del proceso pre-contractual (Elaboración de convenios y contratos de ser requeridos)	15/02/2024	15/02/2024	0	NO
0,2	Inicio del Proceso Contractual (Suscripción y legalización de contratos y convenios)	16/02/2024	16/02/2024	0	NO
0,3	Definición líder de Proceso	15/02/2024	16/02/2024	1	NO
0,4	Elaboración y revisión del Plan de Trabajo	15/02/2024	19/02/2024	4	SI
0,5	Reunión de Alistamiento y delegación de responsables	19/02/2024	19/02/2024	1	NO
1	**Fase I: Priorización Territorial**	**20/02/2024**	**7/06/2024**	**108**	
1,1	**Contextualización Regional**	**20/02/2024**	**14/05/2024**	**84**	
1,11	Levantamiento y análisis de Información por dimensiones para desarrollo de contexto	20/02/2024	6/03/2024	15	NO
1,12	Elaboración de contenidos de contextualización regional	1/03/2024	16/03/2024	15	NO
1,13	Mesa de Trabajo a partir del levantamiento, análisis y desarrollo de contenidos con información inicial	17/03/2024	17/03/2024	1	NO
1,14	Consolidación de resultados de análisis de información	18/03/2024	2/05/2024	45	SI
1,15	Espacialización de los resultados de Contextualización	10/04/2024	4/05/2024	24	SI
1,16	Primera identificación de núcleos regionales a partir de análisis cuantitativo	20/03/2024	4/05/2024	45	NO
1,17	Presentación de Resultados Contextualización Regional	14/05/2024	14/05/2024	1	NO
1,2	**Identificación de Núcleos**	**20/02/2024**	**14/05/2024**	**84**	
1,21	Levantamiento y análisis de Información por dimensiones para la construcción del Índice de Necesidades	20/02/2024	30/04/2024	70	NO
1,22	Consolidación de datos y construcción del Índice de Necesidades	22/04/2024	2/05/2024	10	NO
1,23	Aplicación de la normalización de resultados	27/04/2024	2/05/2024	5	SI
1,24	Análisis de los resultados a partir de la normalización	2/05/2024	10/05/2024	8	NO
1,25	Espacialización de los resultados del Índice de Necesidades	6/05/2024	21/05/2024	15	SI
1,26	Cruce de resultados con primera identificación de núcleos resultado de etapa de contextualización, entre otros	4/05/2024	14/05/2024	10	NO
1,27	Identificación de Núcleos	4/05/2024	14/05/2024	10	SI
1,28	Presentación de Resultados Identificación de Núcleos	14/05/2024	14/05/2024	1	NO
1,3	**Priorización de Núcleos**	**14/04/2024**	**14/05/2024**	**30**	
1,31	Levantamiento y análisis de Información por dimensiones para la construcción del Índice de Capacidades	14/04/2024	24/04/2024	10	SI
1,32	Consolidación de datos y construcción del Índice de Capacidades	21/04/2024	26/04/2024	5	
1,33	Aplicación de la normalización de resultados	26/04/2024	1/05/2024	5	SI
1,34	Análisis de los resultados a partir de la normalización	1/05/2024	8/05/2024	7	
1,35	Espacialización de los resultados del Índice de Capacidades	6/05/2024	21/05/2024	15	SI
1,36	Cruce de resultados con identificación de núcleos resultado de identificación	4/05/2024	14/05/2024	10	SI
1,37	Priorización de Núcleos	4/05/2024	14/05/2024	10	SI
1,38	Presentación de Resultados de Núcleos	14/05/2024	14/05/2024	1	NO
1,4	**Proyectos Gobierno Nacional**	**20/02/2024**	**7/06/2024**	**108**	
1,41	Levantamiento y análisis de Información por dimensiones de los proyectos de Gobierno Nacional	20/02/2024	15/05/2024	85	SI
1,42	Consolidación de información de proyectos de Gobierno Nacional	17/05/2024	7/06/2024	21	
2	**Fase II: Validación**	**6/06/2024**	**16/08/2024**	**71**	
2,1	Preparación logística y técnica de los Talleres	6/06/2024	9/08/2024	64	NO
2,2	Desarrollo de los Talleres en los municipios priorizados	15/07/2024	9/08/2024	25	NO
2,3	Elaboración de Informes y Actas asociadas al desarrollo de los Talleres	19/07/2024	16/08/2024	29	SI
2,4	Sistematización de información obtenida mediante el desarrollo de talleres y demás reuniones realizadas en territorio.	1/08/2024	16/08/2024	15	SI
3	**Fase III: Priorización de Proyectos y Visualización.**	**6/06/2024**	**7/10/2024**	**123**	
3,1	Matriz de prioridades para la selección de programas y proyectos	6/06/2024	23/09/2024	109	SI
3,2	Herramienta de Visualización de resultados metodológicos	12/08/2024	7/10/2024	60	SI
4	**Fase IV: Socialización, seguimiento y Control**	**8/10/2024**		**N/A**	
4,1	Elaboración de presentaciones e informes para los diversos stackeholders	8/10/2024		N/A	SI
4,2	Diseño e implementación de metodologías de seguimiento y control	8/10/2024		N/A	SI
4,3	Actualización periódica de la información	8/10/2024		N/A	SI
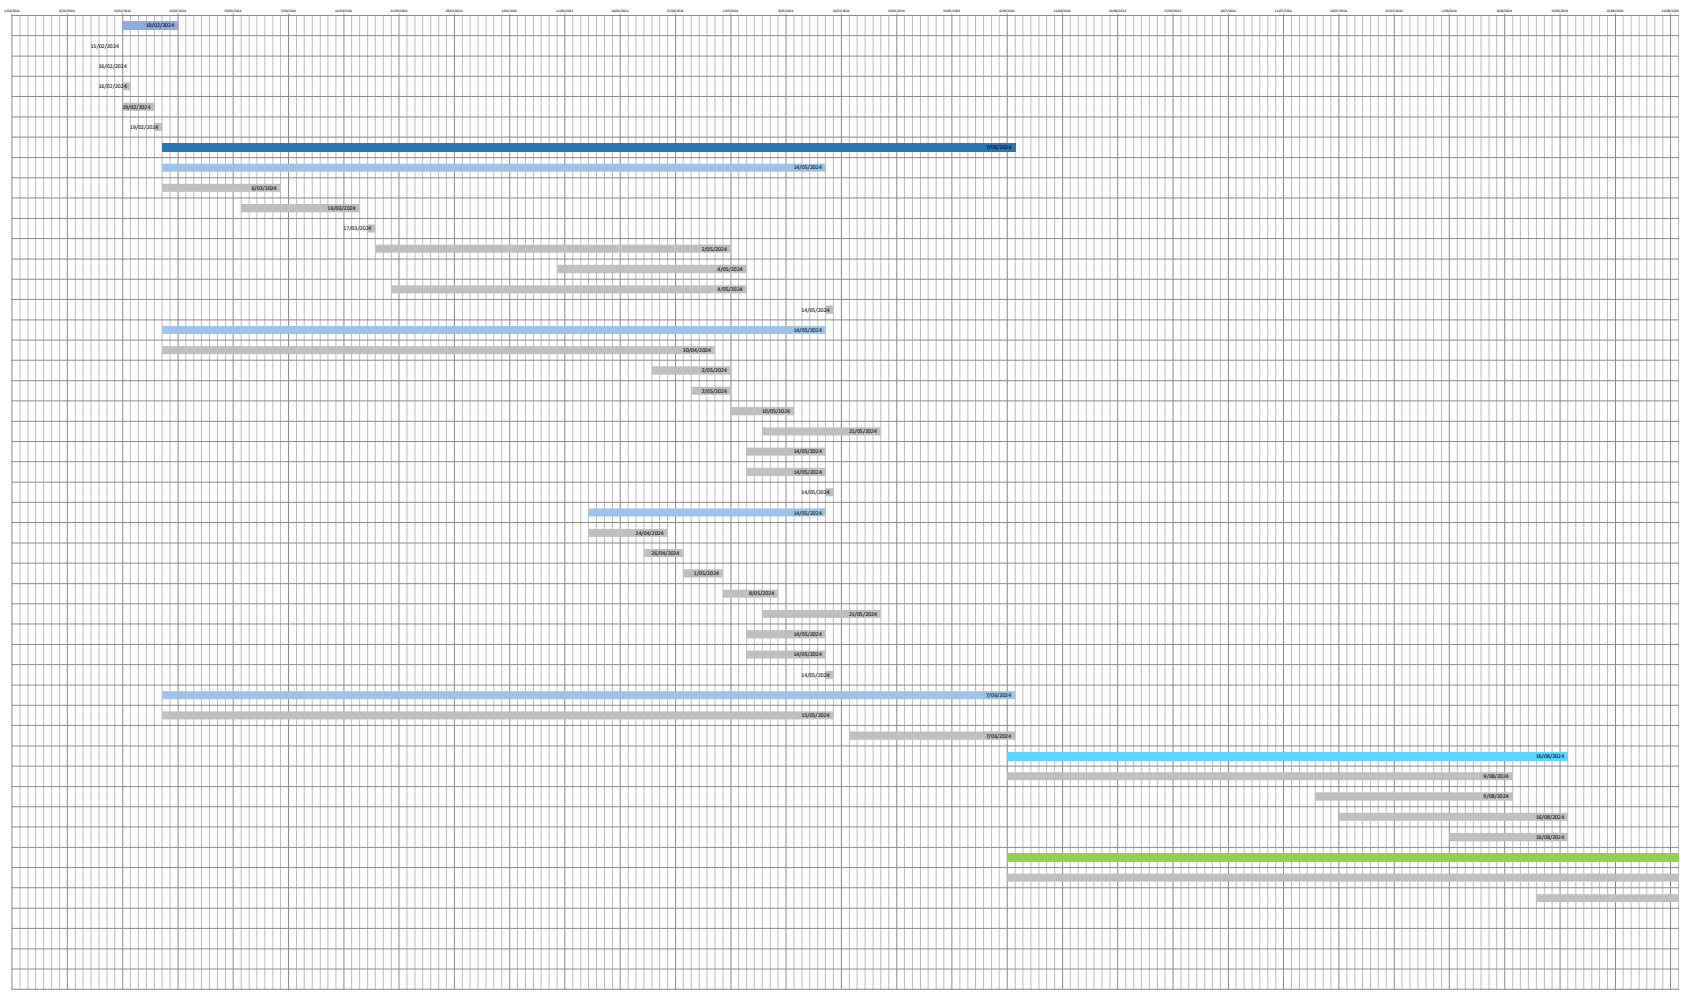
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
