



#### FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER.

#### CONVOCATORIA PUBLICA No. ART-C-001-2021

**OBJETO:** CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, LEGAL Y TÉCNICA EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART.

# TRASLADO PARA EL PROPONENTE No. 2. CONSORCIO GYG-INVER 2021 – FRENTE A OBSERVACIÓN PRESENTADA POR EL PROPONENTE No. 3. CONSORCIO EPIDAURO

FINDETER se permite poner en conocimiento, escrito y anexos por medio del cual el proponente No. 3. CONSORCIO EPIDAURO informa sobre certificación aportada por el integrante GYG CONSTRUCCIONES S.A.S., del proponente No. 2 CONSORCIO GYG-INVER 2021, expedida por el Fondo Rotatorio de la Policía de fecha 9 de marzo de 2012, manifestando que presuntamente no se ajusta a la realidad.

La observación y anexos aquí enunciados se encuentran incorporados en la parte inferior del presente documento de traslado.

EL PROPONENTE No. 2. CONSORCIO GYG-INVER podrá manifestarse respecto a la observación aquí trasladada, al correo electrónico tercerosfindeter@findeter.gov.co A MAS TARDAR EL 2 DE FEBRERO DE 2021 HASTA LAS 5:00 PM.

El presente documento se expide en Bogotá D.C. el primer (01) días del mes de febrero de dos mil veintiuno (2021).

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER

Bogotá D.C 28 de enero 2021

Señores

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER

Ciudad

ASUNTO: OBSERVACIONES A LOS PROPONENTES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. ART-C-001-2021

Cordial Saludo.

De acuerdo a lo establecido por ustedes en los términos de referencia del proceso, nos permitimos enviar nuestras observaciones a las ofertas presentadas por los proponentes:

#### CONSORCIO GYG-INVER 2021

**CONTRATO No1.** El integrante No.2 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S del consorcio GYG-INVER 2021, para certificar su experiencia en el proceso aporta una certificación expedida por el Fondo Rotatorio de la Policía de fecha 9 de marzo de 2012 en donde por la estructura de la certificación, observamos que esta presuntamente no se ajusta a la realidad.

La anterior situación fue verificada al realizar consultas de la misma certificación que fue presentada por el integrante No.2 GYG CONSTRCCIONES S.AS, para acreditar su experiencia ante el registro único de proponentes y en diferentes licitaciones, en lo cual se evidenció lo siguiente:

1. Si bien FINDETER no exige que los contratos se encuentren reportados en el Registro Único de Proponentes, dicha empresa aportó la certificación original en su RENOVACIÓN del año 2014, páginas 108 a la 110. Sin embargo, la certificación que aportan para la presente Convocatoria aparentemente es la misma; pero si detallamos la distribución de los costos de las actividades relacionadas en el contrato, estos costos son diferentes, como se muestra a continuación:


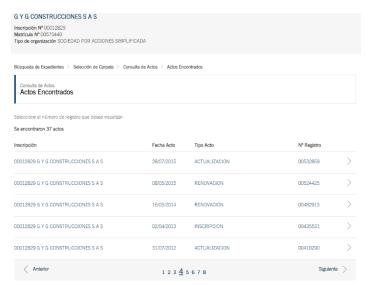


Ilustración 1: CONSULTA GENERAL DE ACTOS GYG CONSTRUCCIONES LTDA

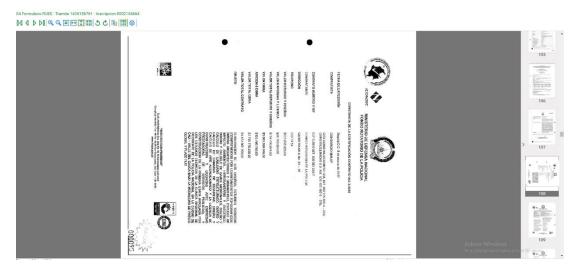

#### CONSTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN CONTRATO 057-3-2010

FECHA DE EXPEDICIÓN	Bogolá D.C. 9 de marzo de 2012
Charles De Mail Molosoft	Dogota D.C. o on marzo the rote

CONTRATISTA CONSORCIO MALAY

GYG CONSTRUCCIONES LTDA, NIT. 800.215 466-4 ~ 70%

CONSTRUCLINICAS S.A. NIT. 830 105 192-9 - 30%

CONTRATO NÚMERO Y NIT 057-3-2010 NIT. 900.367.200-7

CONTRATANTE FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

DIRECCIÓN GARRERA 66 A No. 43 – 18

TELEFONO 220 71 54

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$623,020,920,00
VALOR EXPENSAS Y LICENCIA	\$91.709.954,00

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS \$714,730,874,00

VALOR OBRA \$3.563.390.046,00

ADICION 6 OBRA \$195.786.780,00

VALOR TOTAL OBRA \$3,759,176,826,00

VALOR TOTAL CONTRATO \$4.473 907.700,00

Ilustración 3: Valores de la certificación del proponente en el RUP

#### CONSTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN CONTRATO 057-3-2010

FECHA DE EXPEDICIÓN	Bogotá D.C. 9 de marzo de 2012
CONTRATISTA	CONSORCIO MALAY
	GYG CONSTRUCCIONES LTDA. NIT. 800.215.466-4- 709 CONSTRUCLINICAS SAS NIT. 830.105.192-9- 30%
CONTRATO NÚMERO Y NIT	057-3-2010 NIT. 900.367.200-7
CONTRATANTE	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
DIRECCIÓN	CARRERA66 A No. 43 - 18
TELEFONO	220 71 54
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$703.020.920,00
VALOR EXPENSAS Y LICENCIA	\$91.709.954,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$794.730.874,00
VALOR OBRA	\$3.483.390.046,00
ADICION 6 OBRA	\$195.786.780,00
VALOR TOTAL OBRA	\$3.679.176.826,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$4.473.907.700,00

Ilustración 4: Valor de la certificación presentada en el proceso por el proponente

 Adicionalmente revisando algunos procesos licitatorios en donde la firma se presenta como proponente, encontramos que la firma G Y G aportó la certificación que se encuentra registrada en el registro único de proponentes y no la presentada en el presente proceso. (ver procesos como el CP-007-2018).




Ilustración 5: Proponentes del proceso CP-007-2018

₩ VERIFICACION RUES.zip	2.024.925	2.024.925	Archivo WinRAR ZIP	11/07/2018 12:	A3B689FB
VERIFICACION FINANCIERA.zip	3.788.316	3.788.316	Archivo WinRAR ZIP	11/07/2018 12:	1967187C
GARANTIA DE SERIEDAD.zip	348.242	348.242	Archivo WinRAR ZIP	11/07/2018 3:0	185E9737
EXPERIENCIA GENERAL.zip	3.374.239	3.374.239	Archivo WinRAR ZIP	11/07/2018 11:	DD0E5C3E
EXPERIENCIA ESPECIFICA.zip	4.528.186	4.528.186	Archivo WinRAR ZIP	11/07/2018 11:	802B7A02
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE.zip	2.612.039	2.612.039	Archivo WinRAR ZIP	11/07/2018 12:	5EE89008
AVAL DE LA PROPUESTA.zip	320.993	320.993	Archivo WinRAR ZIP	11/07/2018 12:	A8A2D00F
ANTECEDENTES FISCALES.zip	157.434	157.434	Archivo WinRAR ZIP	11/07/2018 11:	E1A369DD
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS_2.zip	205.856	205.728	Archivo WinRAR ZIP	11/07/2018 11:	4854D600
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS_1.zip	205.856	205.728	Archivo WinRAR ZIP	11/07/2018 11:	4854D600
₹ RUT GYG.pdf	517.809	513.752	Documento Adob	11/07/2018 11:	E58C4BD3
RUP GYG 28 JUN 2018.pdf	445.706	311.783	Documento Adob	11/07/2018 11:	6D49F2DA
CO1_OTLCNTNR_112400080_CO1_RPL_610588.pdf	8.333	7.075	Documento Adob	12/07/2018 4:2	5D4A301E
CO1_OTLCNTNR_112400079_CO1_RPL_610588.pdf	27.631	25.276	Documento Adob	12/07/2018 4:2	73AE6858
🔁 62. Anexo 11 - Oferta Economica.pdf	100.181	94.342	Documento Adob	12/07/2018 12:	562FFF94
🛂 50. DISEÑADOR ESTRUCTURAL 2.pdf	2.388.892	2.104.097	Documento Adob	11/07/2018 2:5	C5112ED
🔁 49. DISEÑADOR ESTRUCTURAL 1.pdf	485.578	354.623	Documento Adob	11/07/2018 2:5	F7F50710
🔁 48. DISEÑADOR ARQUITECTONICO 2.pdf	1.618.800	1.519.212	Documento Adob	11/07/2018 2:5	FBB1163A
🔁 47. DISEÑADOR ARQUITECTONICO 1.pdf	955.736	825.936	Documento Adob	11/07/2018 2:5	498C356E
🔁 46. DIRECTOR.pdf	660.459	583.333	Documento Adob	11/07/2018 2:5	A2F63578
🔁 45. ANEXO 12 EXPERIENCIA DEL PERSONAL.pdf	236.664	207.884	Documento Adob	11/07/2018 2:5	8F5DF559
🔁 35. ANEXO 1- ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	318.191	292.012	Documento Adob	11/07/2018 11:	97B1B688
🔁 34. ANEXO FORMATO SARLAFT PERSONA JURIDICA.pdf	741.226	734.492	Documento Adob	11/07/2018 11:	E8076C55
26. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	171.367	162.527	Documento Adob	11/07/2018 11:	1EDF6D35
🔁 25. FORMULARIO No. 10- INFORMACION PARA EL SIIF.pdf	94.280	88.664	Documento Adob	11/07/2018 11:	ED4FD710
🔁 23. RIT GYG.pdf	39.203	37.973	Documento Adob	11/07/2018 11:	4DF2B4BE
🔁 22. CEDULA DE CIUDADANIA CEE.pdf	198.923	157.494	Documento Adob	11/07/2018 11:	1B78FDA9
<sup>™</sup> 21. FORMULARIO No. 9- COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD.pdf	94.530	88.769	Documento Adob	11/07/2018 11:	FCF4FCA

Ilustración 6. Propuesta de la firma GYG CONSTRUCCIONES PROCESO CP-007-2018

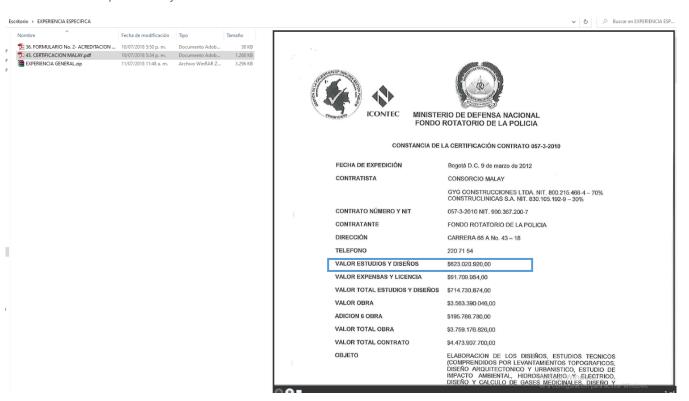


Ilustración 7: CERTIFICACION MALAY Presentada por GYG CONSTRUCCIONES EN EL PROCESO CP-007-2018

#### **PROCESO CME 022-2020**

Información

Número del proceso CME 022-2020

Título CONSULTORÍA CAUCA - PUTUMAYO

Estado Proceso adjudicado y celebrado

Tipo de proceso Contratación régimen especial (con ofertas)

Proceso Régimen especial

Unidad de contratación SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios No

Lista de oferentes publicada

Fecha de publicación 12/1/2020 4:26:47 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)



			Carpeta de archivos		
FINANCIERO_2.rar	795.389	795.389	Archivo WinRAR	1/12/2020 11:0	A36B746E
FINANCIERO_1.rar	795.389	795.389	Archivo WinRAR	1/12/2020 11:0	A36B746E
ECONOMICA.rar	583.800	583.542	Archivo WinRAR	1/12/2020 3:47	BD536E0D
ANTECEDENTE JUDICIAL.rar	50.095	50.095	Archivo WinRAR	1/12/2020 11:0	7CEFC6B6
≥11. VINCULACION FAB.rar	5.331.308	5.331.308	Archivo WinRAR	1/12/2020 2:47	43BBDB60
3. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.rar	47.942	47.871	Archivo WinRAR	1/12/2020 11:0	C375DCE8
■ 6. BOLETIN RESPONDABLES,rar	78.529	78.201	Archivo WinRAR	1/12/2020 10:5	8F21E781
≥ 5. CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES.rar	524.825	524.825	Archivo WinRAR	1/12/2020 10:5	BAAE1131
2. EXPERIENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.rar	1.225.515	1.225.515	Archivo WinRAR	1/12/2020 10:5	2C485D74
2. DISCAPACITADOS.rar	527.647	527.647	Archivo WinRAR	1/12/2020 11:0	75079FFC
3. APOYO INDUSTRIA.rar	204.733	204.733	Archivo WinRAR	1/12/2020 11:0	DD610D2F
1. PERSONAL MINIMO REQUERIDO.rar	8.112.800	8.112.800	Archivo WinRAR	1/12/2020 3:44	C1EFABBD
1. MIPYMFS.rar	1.602.228	1.602.228	Archivo WinRAR	1/12/2020 11:0	17F20458
1. EXPERIENCIA.rar	14.960.941	14.960.941	Archivo WinRAR	1/12/2020 3:46	1DAB5976
■ 1. CARTA DE PRESENTACION.rar	3.424.140	3.424.140	Archivo WinRAR	1/12/2020 10:5	964C57FC
12 NO APLICA.pdf	105.212	98.940	Documento Adob	1/12/2020 10:5	61BB0480
MANIFESTACION DE NO INCURSION EN PRACTICAS ANTICOMPETITIVAS.pdf	169.408	137.646	Documento Adob	1/12/2020 11:0	95B04C28
1 of the struction of the structure of	2.188.906	2.172.925	Documento Adob	1/12/2020 2:47	A071AB32
12 CO1_OTLCNTNR_322620554_CO1_RPL_1840503.pdf	9.456	8.190	Documento Adob	1/12/2020 3:51	2C5D3CA6
12 CO1_OTLCNTNR_322620553_CO1_RPL_1840503.pdf	27.776	25.596	Documento Adob	1/12/2020 3:51	F3949D77
🔁 ANEXO 12A CONSENTIMIENTO PARA LA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 1.pdf	216.922	209.045	Documento Adob	1/12/2020 11:0	6BF33C3C
11-11. Rnmc Carlos 11-11.pdf	39.519	34.309	Documento Adob	1/12/2020 11:0	4315E48E
12 3. RUP GYG-19 Nov 2020.pdf	571.213	412.123	Documento Adob	20/11/2020 3:4	A7CE1760

#### Ilustración 8: Propuesta en el proceso CME 022-2020

THE EVE ADICIONAL ESPECIFICA FOR

1. EXPERIENCIA HABILITANTE rar	5.195.866		66 Archivo Wi		39 0E2694C7	
↑ 🕦 EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE GRUPO 1.rar - archivo RAR, tamaño descomprimido 2.366.408 bytes						
Nombre		Tamaño	Comprimido	Тіро	Modificado	CRC32
				Carpeta de archivos		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE.pdf		661.795	559.224	Documento Adob	1/12/2020 3:36	1F801DAC
CERTIFICACION MALAY FINpdf		755.858	655.099	Documento Adob	12/11/2020 10:	0F25C682
Certificacion CAPRICHO.pdf		197.990	189.871	Documento Adob	12/01/2017 1:3	18E37B4D
Certificacion barranquillita 2015 - actividades.pdf		123.181	114.940	Documento Adob	24/12/2018 10:	E7796139
Certificacion 2015 - 369.pdf		191.613	183.540	Documento Adob	11/07/2018 12:	3A3E8394
🔁 ACTA LIQUIDACIÒN 33.pdf		435.971	346.140	Documento Adob	15/02/2012 10:	0753207F

0.764.724 0.764.724 Archive Win PAP 1/12/2020 2:26 2/26001E

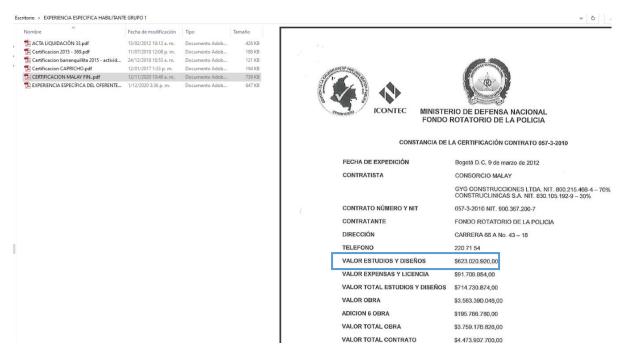


Ilustración 9: CERTIFICACIÓN APORTADA EN EL PROCESO CME-022-2020

Por lo anterior, se evidencia que el proponente alteró la certificación para cumplir en el presente proceso induciendo a la entidad al error de habilitarlos tecnicamente, y, de acuerdo al numeral 15. CAUSALES DE RECHAZO de los términos de referencia, literal 23. "Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanación, siendo verificados se establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificación de requisitos habilitantes.". (El subrayado y la negrilla es nuestra). Solicitamos al comité técnico evaluador la propuesta del proponente CONSORCIO GYG-INVER 2021 sea RECHAZADA, ya que el valor real de los estudios y diseños es de \$623.020.920 y no \$703.020.920 como pretenden mostrar.

3. Adicionalmente, de acuerdo a los términos de referencia subcapítulo II, numeral 3. Requisitos Habilitantes de Orden Técnico. En su NOTA 5. La entidad establece que no son válidos para acreditar experiencia licencias de construcción, intervención, reparación, ampliación y/o de urbanismo y en el CONTRATO No. 1., de acuerdo con la certificación original del integrante GYG CONSTRUCCIONES LTDA, los valores son:

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS \$623.020.920,00

VALOR EXPENSAS Y LICENCIA \$91.709.954,00

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS \$714.730.874.00

De acuerdo a lo anterior el valor de expensas y licencia no debe ser tenido en cuenta para sumar al valor total de los estudios y diseños, como se indica en las notas 1 y 2 del numeral 3 los terminos de referencia: **Nota 1:** "El proponente debe tener en cuenta que en caso de presentar certificaciones que evidencien la ejecución de actividades adicionales a las solicitadas en los ordinales i) y ii), la Entidad evaluará los valores correspondientes a las actividades solicitadas para el presente proceso(...) **Nota 2:** "El valor de otros proyectos, alcances, actividades o experiencias diferentes a la solicitada aquí, NO serán tenidos en cuenta para efectos de acreditar la condición particular de valor"(...) (El subrayado y la cursiva son nuestros) por lo cual la entidad debio tomar el valor de los estudios y diseños el cual equivale a 1.163.22 SMMLV y esté afectado por el 70% que tiene de participación es 814.25 SMMLV por lo que el proponente no cumple

con la condición A. de los aspectos técnicos de dichos términos el cual establece que: *El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.4 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso (982.18 SMML V)*, con lo cual el proponente tampoco cumple con los criterios de selección establecidos, por lo que su propuesta debe ser RECHAZADA.

#### MC ARQUITECTOS S.A

Según lo establecido en los términos de condiciones del proceso Subcapitulo II numeral 3.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE-En todo caso, no se aceptarán experiencia y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de esta hayan hecho parte. Y de acuerdo al contrato No.2 presentado por MC ARQUITECTOS S.A en su oferta, se puede evidenciar en la certificación de dicho contrato que el proponente actuó en calidad de subcontratista; por otra parte la entidad no debe tener en cuenta la certificación así el proponente haya sido parte del CONSORCIO CERTEZA en cuanto dicha certificación actuaría como auto certificación según el parámetro número ii, mencionado anteriormente.

De acuerdo a lo anterior solicitamos a la entidad calificar a este proponente **NO HÁBIL** en el aspecto técnico y **RECHAZAR** su propuesta, toda vez que este no cumple con los criterios mínimos del proceso.

Agradecemos la atención prestada,

CABRIEL ANTONIO CURE HAKIM

CONSORCIO EPIDAURO REPRESENTANTE LEGAL





#### CONSTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN CONTRATO 057-3-2010

FECHA DE EXPEDICIÓN

Bogotá D.C. 9 de marzo de 2012

CONTRATISTA

CONSORCIO MALAY

GYG CONSTRUCCIONES LTDA, NIT, 800.215 468-4 - 70%

CONSTRUCLINICAS S.A. NIT. 830 105 192-9 - 30%

CONTRATO NÚMERO Y NIT

057-3-2010 NIT. 900.367.200-7

CONTRATANTE

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

DIRECCIÓN

GARRERA 66 A No. 43 - 18

TELEFONO

220 71 54

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS

\$623,020,920,00

VALOR EXPENSAS Y LICENCIA

\$91.709.954,00

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS

\$714,730,874.00

VALOR OBRA

\$3,563,390,046,00

ADICION 6 OBRA

\$195,786,780,00

VALOR TOTAL OBRA

VALOR TOTAL CONTRATO

\$3,759.176,826,00 \$4,473,907,700,00

OBJETO

ELABORACION DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS (COMPRENDIDOS POR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, HIDROSANITARIO Y ELECTRICO, DISEÑO Y CALCULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, DISEÑO Y CALCULO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, DISEÑO Y CALCULO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, DISEÑO Y CALCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y LA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS), Y

PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS), Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA ARROJADA POR LOS ESTUDIOS TECNICOS DE LA CLINICA REGIONAL DE OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE CALI - VALLE DEL CAUCA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO

GLOBAL Y PLAZO FIJO





"SERVICIO CON PROBIDAD"

Sedu Administrativa: Crs. 66a No. 43-18 Commutador 220 0460

Complejo industrial: Crs. 48 No. 46-58 Sur Commutador 240 0559 - 564 8788

YMOV. JORDO JOV.CO





CLASIFICACIÓN SEGÚN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA(S) SIGUIENTE (S) ACTIVIDAD (ES) Y ESPECIALIDAD (ES)

COMO CONSULTOR: ACTIVIDAD 02 - CONSULTOR ESPECIALIDAD 02 · INDUSTRIA GRUPO 21 - CONSTRUCCION ESPECIALIDAD 08 - DESARROLLO URBANO

GRUPO 03 - SERVICIOS URBANOS GRUPO 06 - ADMINISTRACION URBANA GRUPO 08 - DISEÑO ARQUITECTONICO ESPECIALIDAD 10 - OTROS

GRUPO 04 - GESTION DE PROYECTOS GRUPO 05 - SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

COMO CONSTRUCTOR: ACTIVIDAD 01 - CONSTRUCTOR ESPECIALIDAD 02 - OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES GRUPO 12 - MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL ESPECIALIDAD 04 - EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO GRUPO 02 - EDIFICACIONES MAYORES DE 500 mº Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTS GRUPO 05 - PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

GRUPO 07 - ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO GRUPO 08 - ESTRUCTURAS METALICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL

TRES PUNTO DOS (3.2) MESES - NOVENTA Y SEIS (96) DIAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y HASTA EL 20 DE

**CONTRATO ADICIONAL 1 PRORROGA** 

CONTRATO ADICIONAL 2 PRORROGA

CONTRATO ADICIONAL 3 PROFROGA

FECHA INICIO ESTUDIOS Y DISEÑOS

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

PRORROGA 1

FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS

FECHA INICIACIÓN OBRA

FECHA DE TERMINACIÓN OBRA

CONTRATO ADICIONAL 4 PRORROGA

FECHA DE ENTREGA ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATO ADICIONAL 5 PRORROGA CONTRATO ADICIONAL 6 PRORROGA

FECHA DE TERMINACIÓN

DICIEMBRE PARA LA EJECLICIÓN DE LA OBRA

SETENTA Y CINCO (76) DÍAS CALENDARIO

OCHENTA Y CINCO (85) DIAS CALENDARIO

CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO

19 DE JULIO DE 2010

20 DE DICIEMBRE DE 2010

HASTA EL 15 DE MARZO DE 2010

15 DE MARZO DE 2011

15 DE MARZO DE 2011

2 DE MAYO DE 2011

30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

20 DE NOVIEMBRE DE 2011

30 DE NOVIEMBRE DE 2011

15 DE DICIEMBRE DE 2011

15 DE DICIEMBRE DE 2011









RECIBO FINAL DE LAS OBRAS

17 ENERO 2012

ÁREA DISEÑADA

31.782,21 M2

ÁREA CONSTRUIDA

2.481,93 M2

ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA

2.481,93 M2

**ACTIVIDADES EJECUTADAS** ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, PERMISOS - Y LICENCIAS. ARGITHETONICO, PERMISOS Y LICENCIAS, PLANEACIÓN URBANISTICA (DISEÑO DE AREAS EXTERIORES Y ESPACIO PUBLICO), ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO Y CÁLCULO HIDROSANITARIO, DISEÑO Y CÁLCULO REO DE GASES MEDICIALES DISEÑO Y CÁLCULO REO DE GASES MEDICIALES DISEÑO Y CÁLCULO REO DE GASES DE CONTRA DE CARRESTERA MEDICINALES, DISEÑO Y CÁLCULO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, DISEÑO Y CÁLCULO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, DISEÑO Y

CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO

**ACTIVIDADES EJECUTADAS** ETAPA DE OBRA

Administrativo

PRELIMINARES, CIMIENTOS, PILOTAJE, DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS, MAMPOSTERIA, PAÑETES, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MUROS DE CONTENCIÓN, CUBIERTAS, PISOS - BASES Y TANQUE SUBTERRÂNEO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

CALIDAD

F.E. 09/03/12

BUENA

CUMPLIMIENTO

CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO











#### CONSTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN CONTRATO 057-3-2010

FECHA DE EXPEDICIÓN

Bogotá D.C. 9 de marzo de 2012

CONTRATISTA

CONSORCIO MALAY

GYG CONSTRUCCIONES LTDA. NIT. 800.215.466-4 - 70%

CONSTRUCLINICAS S.A. NIT. 830.105.192-9 - 30%

CONTRATO NÚMERO Y NIT

057-3-2010 NIT. 900.367.200-7

CONTRATANTE

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

DIRECCIÓN

CARRERA 66 A No. 43 - 18

**TELEFONO** 

220 71 54

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS

\$623.020.920,00

VALOR EXPENSAS Y LICENCIA

\$91.709.954,00

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS

\$714.730.874,00

VALOR OBRA

\$3.563.390.046,00

ADICION 6 OBRA

\$195.786.780,00

VALOR TOTAL OBRA

\$3.759.176.826,00

VALOR TOTAL CONTRATO

\$4.473.907.700,00

**OBJETO** 

ELABORACION DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS (COMPRENDIDOS POR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, HIDROSANITARIO Y ELECTRICO, DISEÑO Y CALCULO DE GASES MEDICINALES, DISEÑO Y CALCULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, DISEÑO Y CALCULO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, DISEÑO Y CALCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y LA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y LICENCIAS ANTE DE **PRESTADORAS SERVICIOS** PUBLICOS), CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ARROJADA POR LOS ESTUDIOS TECNICOS DE LA CLINICA REGIONAL DE OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE CALI - VALLE DEL CAUCA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO **GLOBAL Y PLAZO FIJO** 









CLASIFICACIÓN SEGÚN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA(S) SIGUIENTE (S) ACTIVIDAD (ES) Y ESPECIALIDAD (ES)

COMO CONSULTOR:

ACTIVIDAD 02 - CONSULTOR ESPECIALIDAD 02 - INDUSTRIA GRUPO 21 - CONSTRUCCION

ESPECIALIDAD 08 - DESARROLLO URBANO

GRUPO 03 - SERVICIOS URBANOS GRUPO 06 - ADMINISTRACION URBANA GRUPO 08 - DISEÑO ARQUITECTONICO ESPECIALIDAD 10 - OTROS

GRUPO 04 - GESTION DE PROYECTOS GRUPO 05 - SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA COMO CONSTRUCTOR:

**ACTIVIDAD 01 - CONSTRUCTOR** 

ESPECIALIDAD 02 - OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES

GRUPO 12 - MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL

ESPECIALIDAD 04 - EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO GRUPO 02 - EDIFICACIONES MAYORES DE 500  $\mathrm{m^2}$  Y DE ALTURAS

MAYORES DE 15 MTS

GRUPO 05 - PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y

**COMPLEMENTARIAS** 

GRUPO 07 - ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO

GRUPO 08 - ESTRUCTURAS METALICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL

TRES PUNTO DOS (3.2) MESES – NOVENTA Y SEIS (96) DIAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y HASTA EL 20 DE DICIEMBRE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

CONTRATO ADICIONAL 1 PRORROGA

SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO

CONTRATO ADICIONAL 2 PRORROGA

OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO

**CONTRATO ADICIONAL 3 PRORROGA** 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO

FECHA INICIO ESTUDIOS Y DISEÑOS

19 DE JULIO DE 2010

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

20 DE DICIEMBRE DE 2010

PRORROGA 1

HASTA EL 15 DE MARZO DE 2010

FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS

15 DE MARZO DE 2011

FECHA DE ENTREGA ESTUDIOS Y DISEÑOS

15 DE MARZO DE 2011

FECHA INICIACIÓN OBRA

2 DE MAYO DE 2011

FECHA DE TERMINACIÓN OBRA

30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONTRATO ADICIONAL 4 PRORROGA

20 DE NOVIEMBRE DE 2011

**CONTRATO ADICIONAL 5 PRORROGA** 

30 DE NOVIEMBRE DE 2011

**CONTRATO ADICIONAL 6 PRORROGA** 

15 DE DICIEMBRE DE 2011

FECHA DE TERMINACIÓN

15 DE DICIEMBRE DE 2011









**RECIBO FINAL DE LAS OBRAS** 

17 ENERO 2012

ÁREA DISEÑADA

31.782,21 M2

ÁREA CONSTRUIDA

2.481,93 M2

ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA

2.481,93 M2

**TOTAL PISOS CONSTRUIDOS** 

01 SOTANOS Y 4 PISOS (INCLUIDA CUBIERTA)

ACTIVIDADES EJECUTADAS ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, PERMISOS Y LICENCIAS, PLANEACIÓN URBANISTICA (DISEÑO DE AREAS EXTERIORES Y ESPACIO PUBLICO), ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO Y CÁLCULO HIDROSANITARIO, DISEÑO Y CALCULO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, DISEÑO Y CÁLCULO RED DE GASES MEDICINALES, DISEÑO Y CÁLCULO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, DISEÑO Y CÁLCULO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO.

ACTIVIDADES EJECUTADAS ETAPA DE OBRA

PRELIMINARES, CIMIENTOS, PILOTAJE, DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS, MAMPOSTERIA, PAÑETES, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MUROS DE CONTENCIÓN, CUBIERTAS, PISOS -- BASES Y TANQUE SUBTERRÁNEO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ESTRUCTURA DE CONTENCION PARA SOTANO Y CUARTOS TECNICOS, ESTRUCTURAS HIDRAULICAS PARA EL DRENAJE

**CALIDAD** 

BUENA

**CUMPLIMIENTO** 

CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO





F.E. 09/03/12








TENIENDO EN CUENTA LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y QUE LA INFORMACIÓN APORTADA EN EL RUP ES PUBLICA SE PROCEDE A REALIZAR LA CONSULTA DE LA CERTIFICACIÓN DEL PROPONENTE EN LOS EXPEDIENTES DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

- 1. INGRESAR A LA PÁGINA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
- 2. INGRESAR A LA PESTAÑA TRÁMITES Y CONSULTAS
- 3. INGRESAR A BIBLIOTECA CCB CONSULTA DE EXPEDIENTES REGISTRO DE PROPONENTES

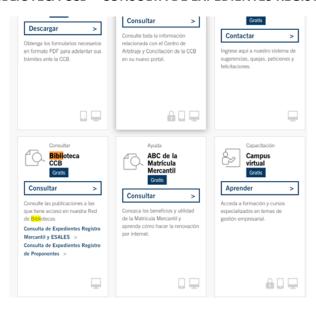

4. REALIZAR LA CONSULTA CON EL NIT Y RAZÓN SOCIAL DEL INSCRITO A CONSULTAR, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA PAGINA





# Consulta en línea de expedientes Búsqueda de Expedientes Proponentes Seleccione un criterio de búsqueda e ingrese la información solicitada: © Datos del Inscrito ○ Número de Inscripción Nombre o razón social: GYG CONSTRUCCIONES LTDA Tipo de Documento: NIT Número de Documento: 8002154664 Buscar


#### 5. SELECCIONAMOS EL PROPONENTE





# Consulta en línea de expedientes Búsqueda de Expedientes Proponentes Inscripciones Encontradas Seleccione el número de inscripción que desea consultar: Se encontró 1 resultado Nombre o Razón Social Inscripción No. G Y G CONSTRUCCIONES S A S Matrícula No.: 00575440 Tipo de Organización: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 00012829

#### 6. SELECCIONAMOS LA OPCIÓN ACTOS

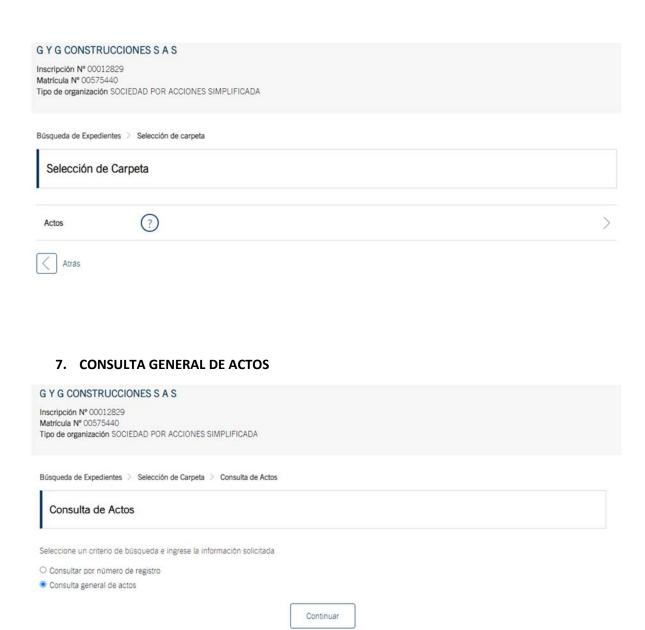

SELECCIONAREMOS EL ACTO DE RENOVACIÓN DEL AÑO 2014 PAGINA 4 DEL FORMULARIO

#### G Y G CONSTRUCCIONES S A S

Inscripción Nº 00012829 Matrícula Nº 00575440

Tipo de organización SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Búsqueda de Expedientes > Selección de Carpeta > Consulta de Actos > Actos Encontrados

Consulta de Actos Actos Encontrados

Seleccione el número de registro que desea visualizar:

Inscripción	Fecha Acto	Tipo Acto	Nº Registro	
00012829 G Y G CONSTRUCCIONES S A S	28/07/2015	ACTUALIZACION	00532859	>
00012829 G Y G CONSTRUCCIONES S A S	08/05/2015	RENOVACION	00524425	>
00012829 G Y G CONSTRUCCIONES S A S	16/05/2014	RENOVACION	00482915	>
00012829 G Y G CONSTRUCCIONES S A S	02/04/2013	INSCRIPCION	00435531	>
00012829 G Y G CONSTRUCCIONES S A S	31/07/2012	ACTUALIZACION	00410290	>
Anterior	1 2 3 4	5 6 7 8	Siguient	te >

#### **PÁGINAS 108-110**



# SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO 057-3-2010 EXPEDIDA POR EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA LA CUAL NO A SUFRIDO CAMBIOS Y/O ACLARACIONES DESPUÉS DE SU INSCRIPCIÓN EN DICHA ENTIDAD





#### CONSTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN CONTRATO 057-3-2010

FECHA DE EXPEDICIÓN

Bogotá D.C. 9 de marzo de 2012

CONTRATISTA

CONSORCIO MALAY

GYG CONSTRUCCIONES LTDA, NIT. 800.215 466-4 - 70%

CONSTRUCLINICAS S.A. NIT. 830 105 192-9 - 30%

CONTRATO NÚMERO Y NIT

057-3-2010 NIT, 900.367,200-7

CONTRATANTE

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

DIRECCIÓN

GARRERA 66 A No. 43 - 18

TELEFONO

220 71 54

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS

\$623.020.920,00

VALOR EXPENSAS Y LICENCIA

\$91.709.954,00

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS

\$714.730,874,00

VALOR OBRA

\$3.563,390,046,00

ADICION 6 OBRA

\$195,786,780,00

VALOR TOTAL OBRA

\$3,759,176,826,00

VALOR TOTAL CONTRATO

\$4,473 807,700,00

OBJETO

ELABORACION DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS (COMPRENDIDOS POR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, HIDROSANITARIO Y ELECTRICO, DISEÑO Y CALCULO DE GASES MEDICINALES, DISEÑO Y CALCULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, DISEÑO Y CALCULO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, DISEÑO Y CALCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y LA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS), Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ARROJADA POR LOS ESTUDIOS TECNICOS DE LA CLINICA REGIONAL DE OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE CALI - VALLE DEL CAUCA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO

GLOBAL Y PLAZO FIJO









CLASIFICACIÓN SEGÚN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA(S) SIGUIENTE (S) ACTIVIDAD (ES) Y ESPECIALIDAD

COMO CONSULTOR:
ACTIVIDAD 02 - CONSULTOR
ESPECIALIDAD 02 - INDUSTRIA
GRUPO 21 - CONSTRUCCION
ESPECIALIDAD 08 - DESARROLLO
URIANO
GRUPO 03 - SERVICIOS URBANOS
GRUPO 06 - ADMINISTRACION URBANA
GRUPO 06 - DISEÑO ARQUITECTONICO
ESPECIALIDAD 10 - GTROS
GRUPO 05 - SERVICIOS BASICOS DE
INGENICRIA

COMO CONSTRUCTOR:
ACTIVIDAD 01 - CONSTRUCTOR
ESPECIALIDAD 02 - OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES
GRUPO 12 - MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL
ESPECIALIDAD 04 - EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO
GRUPO 02 - EDIFICACIONES MAYORES DE 500 m³ Y DE ALTURAS
MAYORES DE 15 MTS
GRUPO 05 - PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y
COMPLEMENTARIAS
GRUPO 07 - ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO
GRUPO 08 - ESTRUCTURAS METALICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL

TRES PUNTO DOS (3.2) MESES - NOVENTA Y SEIS (96) DIAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y HASTA EL 20 DE DICIEMBRE PARA LA EJECLICIÓN DE LA OBRA

CONTRATO ADICIONAL 1 PRORROGA

SETENTA Y CINCO (76) DÍAS CALENDARIO

CONTRATO ADICIONAL 2 PRORROGA

OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO

**GONTRATO ADICIONAL 3 PRORROGA** 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO

FECHA INICIO ESTUDIOS Y DISEÑOS

19 DE JULIO DE 2010

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

20 DE DICIEMBRE DE 2010

PRORROGA 1

HASTA EL 15 DE MARZO DE 2010

FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS

15 DE MARZO DE 2011

FECHA DE ENTREGA ESTUDIOS Y DISEÑOS

15 DE MARZO DE 2011

FECHA INICIACIÓN OBRA

2 DE MAYO DE 2011

FECHA DE TERMINACIÓN OBRA

30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONTRATO ADICIONAL 4 PRORROGA

20 DE NOVIEMBRE DE 2011

CONTRATO ADICIONAL 5 PRORROGA

30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CONTRATO ADICIONAL 6 PRORROGA

15 DE DICIEMBRE DE 2011

Ilustración 2: Certificacion Renocacion RUP 2014 Pag. 109









RECIBO FINAL DE LAS OBRAS

17 ENERO 2012

ÁREA DISEÑADA

31.782,21 M2

ÁREA CONSTRUIDA

2.481,93 M2

ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA

2.481,93 M2

**ACTIVIDADES EJECUTADAS** ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, PERMISOS Y LICENCIAS. ARQUITECTÓNICO, PERMISOS Y LICENCIAS, PLANEACIÓN URBANISTICA (DISEÑO DE AREAS EXTERIORES Y ESPACIO PUBLICO), ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO Y CÁLCULO HIDROSANITARIO, DISEÑO Y CÁLCULO RED DE GASES MEDIGINALES, DISEÑO Y CÁLCULO DEL SISTEMA DE CABLEADO LISTRUCTURADO, DISEÑO Y CÁLCULO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, DISEÑO Y CÁLCULO DE AMBE ADONDICIONADO

CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO

**ACTIVIDADES EJECUTADAS** ETAPA DE OBRA

> ORRES Administrativo

PRELIMINARES, CIMIENTOS, PILOTAJE, DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS,
MAMPOSTERIA, PARETES, ESTRUCTURAS EN
CONCRETO, MUROS DE CONTENCIÓN, CUBIERTAS, PISOS - BASES Y TANQUE SUBTERRÂNEO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

CALIDAD

F.E. 09/03/12

BUENA

CUMPLIMIENTO

CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO





EN CONSTANCIA DE QUE LA CONSULTA REALIZADA SE PUEDE LLEVAR A CABO SIN ESTAR INCURRIENDO A ACCESO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEJAMOS COPIA DE LA CONSULTA EFECTUADA POR UNA DE LAS TÉCNICAS DE LA COMPAÑÍA EN OTRO PROCESO EL CUAL SE PRESENTABA EL SUCESO PLANTEADO



### Transcripción de la sesión de chat de Cámara de Comercio de Bogotá

[5:53:13 PM] Daniela Barrera se ha unido al chat

[5:53:13 PM] Andrea se ha unido al chat

[5:53:15 PM] Andrea: Buenas tardes Daniela, bienvenido al chat de la Cámara de

Comercio de Bogotá, mi nombre es Andrea, su asesora

virtual, ¿en qué le puedo colaborar?

[5:53:23 PM] Daniela Barrera: .

[5:53:30 PM] Andrea: Buenas tardes Daniela en qué le puedo servir?

[5:53:44 PM] Daniela Barrera: Buen dia

[5:54:11 PM] Andrea: Daniela, para responder a su inquietud de una forma más

precisa, lo transferiré a un asesor especializado.

[5:54:13 PM] Andrea: Hola, con gusto podemos atenderle en los siguientes

horarios de lunes a viernes de 8 am a 6 pm y los sábados de 9 am a 1 pm. Si se encuentra dentro del horario mencionado uno de nuestros asesores especializados continuará con su consulta, por favor permanezca en línea, de lo contrario lo invitamos a comunicarse en nuestro horario de atención.

[5:54:33 PM] Daniela Barrera: Deso saber si ouedo consultar informacion

[5:54:37 PM] Alejandra se ha unido al chat

[5:54:38 PM] Alejandra: Buen día mi nombre es Alejandra Infante con gusto

continuare atendiendo su consulta. Lo invito a calificar mi

servicio al finalizar ésta conversación

[5:55:43 PM] Daniela Barrera: Hola alejandra deseo saber si soy participante de una

contratacion publica puedo verificar el contrato aportado por otro oferente coincide con el que presento en la

licitacion

[5:57:28 PM] Alejandra: ¿El contrato ha sido registrado ante la Cámara de comercio

de Bogotá?

[5:57:47 PM] Daniela Barrera: si señora y tiene consecutivo en el RUp

[5:59:45 PM] Alejandra: Indiqueme el NIT del proponente.

[6:00:01 PM] Alejandra se ha unido al chat [6:00:36 PM] Daniela Barrera: 900436622-8

[6:03:03 PM] Alejandra: ¿La matricula corresponde a LOGIA 3 ASOCIADOS SAS?

[6:03:42 PM] Daniela Barrera: si señora

[6:04:55 PM] Alejandra: Usted de forma virtual puexe validar la información de

experiencia que la sociedad ha registrado

[6:05:03 PM] Alejandra: De igual forma en una certificación [6:06:25 PM] Daniela Barrera: ok, alejandra y me puedes indicar ¿

que pasos debo seguir?

[6:07:43 PM] Alejandra: Por medio del siguiente vinvulo podrá validar los

documentos registrados en el proceso de RUP. https://linea.ccb.org.co/gestionexpedientes/

proponentes/terminos-y-condiciones

[6:07:48 PM] Alejandra: Por medio del siguiente vinculo podrá realizar la solicitud de

su certificado https: //linea.ccb.org.co/ CertificadosElectronicosR/Index.html#/inicio

[6:11:46 PM] Alejandra: ¿Desea que le colabore con alguna otra inquietud señora

Daniela?

[6:12:18 PM] Daniela Barrera: ESTA CONVERSACION ME PUEDE SER ENVIADA A MI

CORREO ELECTRONICO?

[6:13:16 PM] Alejandra: En atención a su solicitud le informamos que el servicio de

chat de la CCB tiene la posibilidad de enviar esta conversación a su correo electrónico, al finalizar la conversación se habilitará la opción por este medio

[6:13:33 PM] Daniela Barrera: gracias Alejandra [6:13:35 PM] Daniela Barrera ha dejado el chat

Gracias por visitar y utilizar los Servicios virtuales de la Cámara de Comercio de Bogotá.
