

Bogotá D.C, febrero 26 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-008-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”.

Respetados Señores:

De acuerdo al informe de evaluación publicado en el portal de contratación de FINDETER y encontrándonos dentro del periodo previsto para el realizar observaciones al informe de evaluación según adenda No 2, nos permitimos manifestar lo siguiente:

CAPACIDAD TECNICA:

1. Se nos manifiesta que “Con la documentación aportada por el proponente NO CUMPLE con los requisitos habilitantes de orden técnico de los términos de referencia, razón por la cual recibe la condición de NO HABILITADO TÉCNICAMENTE, y deberá subsanar lo solicitado en los contratos aportados de orden 1 y 2 para continuar en el proceso de selección.”

RESPUESTA:

1. Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos en primera instancia renviar la información detallada para su oportuna revisión.

En los términos de referencia se establece que “En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE PARQUES, O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O, ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO CON UN ÁREA INTERVENIDA MÍNIMA de 1100 M2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato.”

Ahora bien, en la definición de espacio publico o urbanismo se tiene que: “Para efectos del presente proceso de selección se entenderán y aceptarán como proyectos de espacio público únicamente los siguientes: Parques o parques urbanos o alamedas o ciclo rutas o andenes o, vías urbanas articuladas en adoquín y/o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahías vehiculares en adoquín y/o concreto estampado, ejes ambientales, malecones, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre.”

En ese orden para los contratos No1 y No 2 se pretende acreditar las siguientes cantidades (documentos adjuntos) de la siguiente manera:

- En el contrato de orden 1 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CIV PRIORIZADOS EN EL SECTOR DE CARACOLÍ, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR Y EN EL SECTOR DE COMPOSTELA EN LA LOCALIDAD DE USME EN BOGOTÁ D.C" en los folios 14-18 del documento anexo se encuentra el acta de recibo y cantidades ejecutadas entre las que observamos las siguientes cantidades que aplican a los requerimientos de los términos de referencia:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de escaleras en concreto	M2	497.06
Anden concreto 3000 PSI (210 kg/cm2) Premezclado e=0.10m (incluye suministro, formaleteo, fundida y curado)	M2	1630.10
Estampado para concreto MR de pompeyanos, accesos vehiculares a predios y vías (acabado, suministro y mano de obra, incluye juego de moldes, color endurecedor de cuarzo, desmoldante en polvo color, sellado acrílico transparente semilustre)	M2	1630.10
Adoquín de arcilla TR. Liviano 20x10x6 cm (Suministro e instalación, incluye base 4cm mortero 2000 y arena de sello)	M2	722.73
Sardinel fundido en sitio en concreto premezclado de 3000 PSI suministro y construcción (Grava común) E=0.20m H=0.35m (incluye formaleta metálica, acero de refuerzo y alambre negro)	ML	795.14
	M2	159.02
<b>TOTAL</b>	<b>M2</b>	<b>4639.01</b>

Como se puede evidenciar el contrato de orden 1 tiene actividades con una sumatoria de 4639.01 M2 lo cual al aplicar el porcentaje de participación correspondiente (30%) nos da un total de 1391.7 M2, este valor es superior al exigido en los términos de referencia, el cual hace énfasis a un "ÁREA INTERVENIDA MÍNIMA de 1100 M2" Por lo anterior solicitamos al comité evaluador técnico que califique nuestro contrato como CUMPLE teniendo en cuenta la explicación anterior y el desglose de los documentos adjuntos.

- En el contrato de orden 2 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SSTMA PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CODIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ." en los folios 24-28 del documento anexo se encuentra el acta de recibo y cantidades ejecutadas entre las que observamos las siguientes cantidades que aplican a los requerimientos de los términos de referencia.

En el folio 24 se evidencia que se realizo interventoría a tres grupos, el Grupo 1 está compuesto por CIV correspondientes a andenes y vías peatonales y su sumatoria en área es de 1328.18 M2, en el grupo 2 está compuesto CIV correspondientes a andenes, vías peatonales y una vía vehicular, al realizar la segregación se tiene que la sumatoria es de 2586.73 M2, al momento de descontar el área de la vía vehicular que es de 668.53 se obtiene que para el grupo 2 es de 1918.2 M2.

Ahora bien, el grupo 3 que este compuesto netamente por vías vehiculares dentro de su componente se pueden evidenciar actividades netas de urbanismo y espacio público, estas actividades se pueden evidenciar en los folios 27 y 28 anexos a la presente comunicación, los cuales son los siguientes:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Concreto de 3000 PSI fundido en sitio para rampas de acceso E=0.10 m (incluye malla de refuerzo y formaleta)	M2	135.82
Adoquín de concreto A25 20x10x6 CM color gris	M2	11.64
Adoquín de arcilla 20x10x6 CM color terracota	M2	247.92
Adoquín de concreto A25 20x10x8 CM color gris	M2	276.81
Adoquín de concreto A25 20x10x8 CM color Amarillo	M2	22.88
Adoquín de concreto A25 20x10x8 CM color terracota	M2	22.88
<b>TOTAL</b>	<b>M2</b>	<b>717.95</b>

El G1 cuenta con un área intervenida de 1328.18 M2

El G2 cuenta con un área intervenida de 1918.20 M2


El G3 cuenta con un área intervenida de 717.95 M2

El total de área intervenida de espacio público y urbanismo del contrato de orden 2 es de 3964.33 M2 lo cual al aplicar el porcentaje de participación correspondiente (30%) nos da un total de 1189.3 M2, este valor es superior al exigido en los términos de referencia, el cual hace énfasis a un "ÁREA INTERVENIDA MÍNIMA de 1100 M2"

Por lo anterior solicitamos al comité evaluador técnico que califique nuestro contrato como CUMPLE teniendo en cuenta la explicación anterior y el desglose de los documentos adjuntos.

Dando alcance a la solicitud impuesta por el comité técnico evaluador en el informe de evaluación No 1 en donde se nos solicita aclarar y subsanar lo referente a la experiencia, solicitamos sea tenida en cuenta la presente comunicación y así mismo darnos habilidad técnica para la continuación del proceso.

Cordialmente,



**LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO**  
C.C 80.070.003 de Bogotá.  
Representante legal Suplente SEIING S.A.S BIC

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

<b>OBJETO:</b>	<b>"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO."</b>						
<b>PROPONENTE: SEIING SAS BIC</b>							
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA</b>				<b>SEIING SAS BIC</b>			
<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
<b>CONT. No.</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>VALOR EN SMMLV</b>	<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZ.</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>
1	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CIV PRIORIZADOS EN EL SECTOR DE CARACOLÍ, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR Y EN EL SECTOR DE COMPOSTELA EN LA LOCALIDAD DE USME EN BOGOTÁ D.C	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO Y URBANISMO	1038,995087	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	10/01/2017	03/03/2018	30%
2	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SSTMA PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CODIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO Y URBANISMO	880,4917298	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	14/02/2018	13/10/2018	30%

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.


Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO  
 CC 80.070.003 de Bogotá  
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  
 SEIING SAS BIC

CONTRATO NO 1


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> HABITAT Caja de la Vivienda Popular	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>		Código: 208-DGC-Ft-36	
			Versión: 7	Pág: 1 de 6
			Vigente desde: 17-01-2017	

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	594	<b>SUSCRITO EL:</b>	22/12/2016
<b>FECHA DE INICIO</b>	10/01/2017	<b>FECHA TERMINACIÓN DE</b>	03/03/2018
<b>DATOS CONTRATISTA</b>			
<b>Nombre y/o razón social:</b>	CONSORCIO INTERVENTORES 2016 conformado por (JASEN CONSULTORES S.A.S. - 70% Y SEILING S.A.S. - 30%)		NIT 901.035.925-7
<b>Nombre Rep. Legal:</b>	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX		C.C. 79.602.923
<b>OBJETO</b>			
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CIV PRIORIZADOS EN EL SECTOR DE CARACOLÍ, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y EN EL SECTOR DE COMPOSTELA EN LA LOCALIDAD DE USME EN BOGOTÁ D.C.			
<b>Plazo inicial</b>	DOCE MESES (12)	<b>Valor inicial</b>	\$721.057.160

<b>INFORMACION MODIFICACIONES</b>					
<b>Datos de prorrogas</b>			<b>Datos de adiciones</b>		
<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Tiempo</b>	<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>
1	22/12/2017	1 mes y 15 días calendario.	1	22/12/2017	\$90.649.440
<b>Plazo Total</b>	13 meses y 15 días calendario		<b>Valor Total</b>	\$811.706.600	
<b>Datos de Suspensiones</b>					
<b>Fecha suspensión 1</b>	15/06/2017		<b>Tiempo suspensión</b>	7 días calendario.	
<b>Datos otras modificaciones (Aclaratorios – Otrosí Modificatorios - Cesiones)</b>					
N/A		N/A			

<b>GARANTÍAS DEL CONTRATO</b>	
A continuación, se relaciona la garantía única y demás pólizas que ampararon el contrato, con los respectivos amparos constituidos, considerando únicamente los datos contenidos en la póliza inicial aprobada y su cobertura final en cuanto a vigencia y valor teniendo en cuenta el último certificado de modificación aprobado.	
GARANTÍA ÚNICA No. 21-44-101238060	EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

F.   
 *[Handwritten signature]*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>		Código: 208-DGC-Ft-36
			Versión: 7      Pág: 2 de 6
	Vigente desde: 17-01-2017		

Amparo: CUMPLIMIENTO			Amparo: CALIDAD DEL SERVICIO		
Valor	Vigencia		Valor	Vigencia	
	Inicio	Vencimiento		Inicio	Vencimiento
\$162.341.320	26/12/2016	03/09/2018	\$243.511.980	03/03/2018	03/03/2023
Amparo: SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES			Amparo: N.A		
Valor	Vigencia		Valor	Vigencia	
	Inicio	Vencimiento		Inicio	Vencimiento
\$121.755.990	26/12/2016	03/03/2021	N/A	N/A	N/A

En Bogotá D.C., a los **11 DIC 2018**, se reunieron KAROLL MCLANE GARCIA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía número 1.018.407.905, quien actúa en calidad de Directora de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular y Supervisor (a) para la liquidación del contrato, nombrada mediante Resolución No. 3299 de 2018 y Acta de Posesión del 6 de septiembre de 2018, en uso de las facultades otorgadas mediante Resolución No. 4400 de 2016 y el CONSORCIO INTERVENTORES 2016 identificado con NIT. 901.035.925-7, conformado por (JASEN CONSULTORES S.A.S.- 70% Y SELING S.A.S. – 30%), representado legalmente por ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX identificado con C.C. 79.602.923, en su calidad de Contratista Interventor, suscriben la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo.

Que, de conformidad con lo expuesto, las partes contratantes acuerdan:

**CLÁUSULA PRIMERA:** Liquidar de común acuerdo el contrato en mención, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el art. 217 del Decreto Nacional 019 de 2012 y en el artículo 11 de la ley 1150.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Que el contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero, el cual esta soportado por las órdenes de pago de un compromiso, expedidas por la Subdirección Financiera, las cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación:

ESTADO FINANCIERO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$721.057.160
VALOR ADICIONES			\$90.649.440
VALOR TOTAL CONTRATO			\$811.706.600
PAGOS			
FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR DEL CORTE	VALOR PAGADO	SALDO
24/05/2017	\$91.255.808	\$91.255.808	\$720.450.792



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Casa de la Vivienda Popular

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Código: 208-DGC-Ft-36

Versión: 7

Pág: 3 de 6

Vigente desde: 17-01-2017

25/07/2017	\$114.069.760	\$114.069.760	\$606.381.032
20/10/2017	\$86.162.797	\$86.162.797	\$520.218.235
25/10/2017	\$32.861.176	\$32.861.176	\$487.357.059
21/11/2017	\$39.056.702	\$39.056.702	\$448.300.357
24/11/2017	\$43.331.176	\$43.331.176	\$404.969.181
24/11/2017	\$32.861.176	\$32.861.176	\$372.108.005
21/12/2017	\$22.871.378	\$22.871.378	\$349.236.627
22/12/2017	\$32.861.176	\$32.861.176	\$316.375.451
27/12/2017	\$23.002.823	\$23.002.823	\$293.372.628
27/12/2017	\$66.370.957	\$66.370.957	\$227.001.671
20/02/2018	\$9.858.353	\$9.858.353	\$217.143.318
20/02/2018	\$1.437.152	\$1.437.152	\$215.706.166
20/02/2018	\$10.649.440	\$10.649.440	\$205.056.726
13/03/2018	\$68.704.495	\$68.704.495	\$136.352.231
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$675.354.369</b>		

### RESUMEN

<b>A. VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$811.706.600</b>
<b>B. VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$811.706.600</b>
<b>C. VALOR TOTAL PAGADO</b>	<b>\$675.354.369</b>
<b>D. VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA (B-C)</b>	<b>\$136.352.231</b>
<b>E. SALDO A LIBERAR (A - B)</b>	<b>\$0</b>


### INFORMACION PRESUPUESTAL

N° de Proyecto y/o Rubro de inversión	N° C.R.P.	Vigencia	Saldo	Saldo a Liberar	Saldo Pagar al Contratista
3-3-1-15-02-14-0208-134 (fuente 01-12 - Otros Distrito)	5795	2016	\$136.352.231	\$0	\$136.352.231
		Total	\$136.352.231	\$0	\$136.352.231

**OBSERVACIÓN:** El pago del valor de la presente acta se cancelará al contratista con cargo al rubro de "PASIVOS EXIGIBLES".

**CLÁUSULA TERCERA:** El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas



	Código: 208-DGC-Ft-36	
	Versión: 7	Pág: 4 de 6
	Vigente desde: 17-01-2017_	

y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten con posterioridad a la presente acta de liquidación en contra de la Caja de la Vivienda Popular, por motivos que, de la ejecución del presente Contrato, le sean imputables al contratista.

**CLÁUSULA CUARTA:** Que el objeto contratado fue realizado por el Contratista y recibido por la Caja de la Vivienda Popular a entera satisfacción, en el monto, cantidades y porcentajes arriba descritos como valor total ejecutado, de lo cual da fe el supervisor con la firma de la presente acta de liquidación.

**CLÁUSULA QUINTA:** Que, igualmente de acuerdo con la firma de la presente acta de liquidación el supervisor, deja constancia que EL CONTRATISTA, durante el plazo de ejecución del contrato, acreditó el pago de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 y demás normas que las reglamenten o complementen.

En cualquier caso, las reclamaciones relacionadas con este Contrato y el respectivo pago de salarios, parafiscales y aportes al sistema de seguridad social integral, será responsabilidad del Contratista aun después de la firma de la presente acta de liquidación.


**CLÁUSULA SEXTA:** Vencidos los términos de garantía de cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios y prestaciones sociales, el área a través del cual se adelantó la supervisión del contrato, emitirá en su momento una constancia de cierre del proceso de contratación.

**CLÁUSULA SÉPTIMA:** De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista ha recibido las sumas allí relacionadas, de las cuales se efectuaron las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, con excepción de las salvedades contenidas en la presente acta.

Nota: Se aclara que mediante adición No. 1 de fecha 22 de diciembre de 2017, se ajusta el valor del IVA de conformidad con la normatividad vigente.

Igualmente, que la Caja de la Vivienda Popular le adeuda las sumas relacionadas en el balance, sobre las cuales se efectuarán las retenciones de ley. Cumplido el pago mencionado, el Contratista declara a paz y salvo por todo concepto, salvo las excepciones mencionadas en la presente acta.

Se anexan los siguientes documentos que forman parte integral de la presente liquidación:


	Código: 208-DGC-Ft-36	
	Versión: 7	Pág: 5 de 6
	Vigente desde: 17-01-2017	



## ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO


No.	DESCRIPCION	No. DE FOLIOS
1	Solicitud de la Interventoría para liquidar, donde exprese que se cumplió con el objeto, en los componentes Técnico, Administrativo, Financiero, Social, Ambiental, S&SO y jurídico.	1
2	Informe Final del Contrato de Interventoría consolidando de conformidad los componentes Técnico, Social y SSTMA. Aprobado por la supervisión mediante oficio con radicado CORDIS 2018EE17512 de fecha 13 de septiembre de 2018	1
3	Balance General del contrato	1
4	Acta de terminación del contrato (formato 208-DGC-Ft-61)	2
5	Declaración paz y salvo emitida por el contratista de Interventoría, por todo concepto por compromisos adquiridos con terceros en el marco del contrato (proveedores, empleados etc.)	3
6	Certificación del contratista sobre las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y certificación sobre Parafiscales. Acompañada de igual forma por la certificación del contador y/o revisor fiscal del contratista.	6
7	Certificación de cumplimiento, emitidas por la supervisión en sus componentes Técnico, Social y Sisoma.	4
8	Modificaciones al Contrato legalizadas ante la CVP. (se anexan copias de: Contrato, Acta de inicio del contrato, Acta de suspensión del contrato y Modificación No.1).	14
9	Póliza actualizada (según las condiciones contractuales)	1
10	Copia Sábanas de pago	3
11	Copia Ordenes de pago	14
12	Copia correo sobre no salvedades por parte del contratista	1
	Total Folios	51

F.

*[Handwritten signature]*

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular</p>	<p align="center"><b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b></p>		Código: 208-DGC-Ft-36	
			<p>Versión: 7</p>	<p>Pág: 6 de 6</p>
	<p>Vigente desde: 17-01-2017</p>			

<p align="center"><b>DELEGADO DIRECCIÓN GENERAL</b></p>  <p align="center"><b>KAROLL MCLANE GARCÍA VARGAS</b> Directora de Mejoramiento de Barrios CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR</p>	<p align="center"><b>CONTRATISTA</b></p>  <p align="center"><b>ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX</b> Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES 2016</p>
<p>Por parte de la Dirección de Mejoramiento de Barrios: Proyectó: Oscar Ballesteros Carrillo – Contratista DMB. Revisó: Laura Sánchez Forero – Contratista DMB. Jorge Luis Tejada – Supervisor - DMB.</p> <p>Por parte de la Dirección Corporativa: Revisó: Doris Martínez Corredor – Abogada Contratista Dirección Corporativa y CID. Validó: Nicolás Andrés Guzmán – Abogado Contratista Dirección Jurídica CVP. Vo.Bo.: Carlos Felipe Gamboa Gamboa – Dirección de Gestión Corporativa y CID.</p>	

SALVEDADES AL ACTA
<p>En virtud del inciso final del artículo 11 de la ley 1150 de 2007 que dispone que: " Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo", con fecha 18 de octubre de 2018, mediante correo electrónico la DMB remitió al contratista <b>CONSORCIO INTERVENTORES 2016</b>, la presente acta de liquidación, para que una vez revisada, anotara sus observaciones y salvedades si las tuviere.</p> <p>En respuesta al correo electrónico remitido y con fecha 22 de octubre de 2018, el contratista a través del correo electrónico <a href="mailto:jasen.caracoli@gmail.com">jasen.caracoli@gmail.com</a> informa que:</p> <p align="center"><i>"revisada el acta, no se harán novedades (sic). atte Luis m peña Director de interventoría"</i></p> <p>Así las cosas y ante la manifestación del contratista de estar de acuerdo con el contenido de la presente acta de liquidación, la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular, procede a continuar con el trámite a la misma.</p>  <p align="center"><b>KAROLL MCLANE GARCÍA VARGAS</b> Directora de Mejoramiento de Barrios CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR</p>



## ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

Codigo: 238-445-F-17  
Versión: 1  
Pag: 1 de 3  
Firma desde: 16/03/2017

FECHA: 23 DE MARZO DE 2018

DEPENDENCIA

DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS C.V.P

CONTRATO DE OBRA No:

594

DE

2016

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SISO PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE LOS CIV PRIORIZADOS EN EL SECTOR DE CARACOL, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR Y EN EL SECTOR DE COMPOSTELA LOCALIDAD DE USME DE BOGOTÁ D.C.

OBJETO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 811.708.600,00

FECHA DE RECEPCION DEL CONTRATO

19 DE ENERO DE 2017

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

TRECE MESES Y QUINCE DIAS (13.5)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO

3 DE MARZO DE 2018

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORES 2016

INTERVENIOR:

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS

No. MODIFICACION	TIPO MODIFICACION	PLAZO	VALOR CONTRATO CON NA	VALOR ACUMULADO

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	TIPO DE ACTA	FECHA	PERIODO	DURACION	FECHA REANUDACION
1	ACTA DE INICIO	10/01/2017	DESDE 10/01/2017	HASTA 09/02/2017	15 DIAS
2	FECHA DE INICIO	10/01/2017			
3	FECHA DE TERMINACION			09/02/2017	
4	FECHA DE SUSCRIPCION	10/01/2017			
5	ACTA DE SUSPENSION		DESDE 15/06/2017	HASTA 21/06/2017	22/06/2017
6	TIEMPO DE SUSPENSION	7 DIAS CALENDARIO			7 DIAS CALENDARIO
7	INICIO SUSPENSION		DESDE 15/06/2017		
8	TERMINACION SUSPENSION			21/06/2017	
9	REINICIO SUSPENSION		DESDE 22/06/2017		
10	SUSCRIPCION SUSPENSION	15/06/2017			
11	ACTA DE APERTURA ETAPA II	PLAZO 7 SEPTIEMBRE	DESDE 10/06/2017	HASTA 10/01/2018	PLAZO 7 SEPTIEMBRE
12	PLAZO ETAPA	PLAZO 7 SEPTIEMBRE			PLAZO 7 SEPTIEMBRE
13	INICIO ETAPA II	10/06/2017			
14	TERMINACION ETAPA II			10/01/2018	
15	SUSCRIPCION INICIO ETAPA II	22/06/2017			
16	MODIFICACION No 1-PRORROGA Y ADICION	10 DIAS Y 10 HORAS			PLAZO 10 DIAS
17	NUEVO PLAZO CONTRATO	10 DIAS Y 10 HORAS			
18	NUEVA FECHA TERMINACION DEL CONTRATO			3/03/2018	
19	VALOR DE ESTA ADICION	\$ 96.548.440,00	DESDE 22/12/2017		
20	NUEVO VALOR DEL CONTRATO	\$ 811.708.600,00			
21	SUSCRIPCION PRORROGA Y ADICION	22/12/2017			
22	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	3/03/2018			
23	ACTA DE RECIBO LIQUIDACION DE OBRA	13/07/2018			

DISPONIBILIDAD Y RESERVAS PRESUPUESTALES:

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparen las obras ejecutadas y las obras canceladas son las siguientes:

## Disponibilidades Presupuestales

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
600	2016			\$ 721.057.160,00
1830	2017			\$ 10.849.440,00
1829	2017			\$ 80.000.000,00
TOTAL				\$ 811.706.600,00

## Reservas Presupuestales

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
5785	2018			\$ 721.057.160,00
4285	2017			\$ 10.849.440,00
4286	2017			\$ 80.000.000,00
TOTAL				\$ 811.706.600,00

ORDENES DE PAGO:

El valor ejecutado y pagado se relaciona e identifica


No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
10708	24/05/2017	3.3.1.15.02.14.0208.134	\$ 81.255.608,00	\$ 81.255.608,00
10947	25/06/2017	3.3.1.15.02.14.0208.134	\$ 114.088.780,00	\$ 114.088.780,00
11086	26/06/2017	3.3.1.15.02.14.0208.134	\$ 86.182.787,00	\$ 86.182.787,00
11089	26/06/2017	3.3.1.15.02.14.0208.134	\$ 32.861.178,00	\$ 32.861.178,00
11141	21/11/2017	3.3.1.15.02.14.0208.134	\$ 39.054.702,00	\$ 39.054.702,00
11149	24/11/2017	3.3.1.15.02.14.0208.134	\$ 32.861.178,00	\$ 32.861.178,00
11147	24/11/2017	3.3.1.15.02.14.0208.134	\$ 43.331.178,00	\$ 43.331.178,00
11176	21/12/2017	3.3.1.15.02.14.0208.134	\$ 22.871.378,00	\$ 22.871.378,00
11186	22/12/2017	3.3.1.15.02.14.0208.134	\$ 32.861.178,00	\$ 32.861.178,00
11196	27/12/2017	3.3.1.15.02.14.0208.134	\$ 68.378.957,00	\$ 68.378.957,00
11188	28/12/2017	3.3.1.15.02.14.0208.134	\$ 23.022.820,00	\$ 23.022.820,00
10708	20/02/2018	3.3.1.15.02.14.0208.134	\$ 8.858.353,00	\$ 8.858.353,00
10788	20/02/2018	3.3.1.15.02.14.0208.134	\$ 12.089.582,00	\$ 12.089.582,00
17081	13/03/2018	3.3.1.15.02.14.0208.134	\$ 68.704.495,00	\$ 68.704.495,00
TOTAL			\$ 875.354.968,00	\$ 875.354.968,00

En la ciudad de Bogotá d.c., a los 03 días del mes de marzo del año 2018, se suscitaron los siguientes: El Sr. José Carlos Cortés, como representante legal (debidamente autorizado) del consorcio interventores 2016 y por la CAJA DE VIVIENDA POPULAR Profesional especializada de apoyo a la Supervisión de mejoramiento de barrios Jorge Luis Tejada, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No 594 del año 2016 por parte de la Caja de Vivienda Popular, a la firma Contratista, en cumplimiento de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato de obra mencionada.



Remision de polizas se radica a la CVP con oficio N° C-Intercaracoll-584-2016-720
Polizas actualizadas proroga y adcion se radica con en la cvp con oficio N° C-Intercaracoll-584-2016-454

Nombre: José Luis Talleda  
Profesión: especialista de apoyo a la Supervisión mejoramiento de penales de la CVP  
Matrícula No. \_\_\_\_\_

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA</b>		Código: 208-DGC-Ft-61
			Versión: 1      Pág: 1
	Vigente desde: 23-05-2017		


#### DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO No:	594 DE 2016
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORES 2016
NÚMERO DE IDENTIFICACION:	901035925-7
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
ID REPRESENTANTE LEGAL:	79.623.923
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE LOS CIV PRIORIZADOS EN EL SECTOR DE CARACOLI, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR Y EN EL SECTOR DE LA COMPOSTELA EN LA LOCALIDAD DE USME EN BOGOTA D.C
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$811.706.600.00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	TRECE (13) MESES.- QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO:	10 ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 DE MARZO DE 2018
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	
<b>MODIFICACIONES</b>	
VALOR ADICIONADO:	\$90.649.440.00
PLAZO ADICIONAL:	UN MES Y QUINCE DIAS CALENDARIO
CESION:	N/A
OTROS:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A

En Bogotá, D.C., a los **TRES (3)** días del mes de Marzo del año 2018, se reunieron **Erick José Castillo Curieux**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.602.923, en su calidad de representante legal de **CONSORCIO INTERVENTORES 2016**, quien ejerce la Interventoría para la ejecución del Contrato No. 597 de 2016, Y **JORGE LUIS TEJADA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.7.553.703, en su calidad de **SUPERVISOR POR PARTE DE LA DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CVP** con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, de la terminación del mencionado Contrato, por terminación de las obras y vencimiento del plazo de ejecución del mismo.

COMPOSTELA - USME		
TRAMO	civ	Area M2
KR 6A ENTRE CL 81C S Y CL 82S	5003114	504,18
KR 6E ENTRE CL 81C S Y CL 82S	5003116	648,27
KR 6BIS ENTRE CL 81C S Y CL 82S	5003119	521,41
AREA TOTAL		1673,86





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>HABITAT Caja de la Vivienda Popular</small>	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA</b>		Código: 208-DGC-Ft-61	
			Versión: 1	Pág: 1
	Vigente desde: 23-05-2017			

TRAMO	civ	Area M2
CARACOLI - CIUDAD BOLIVAR		
Call77 S Entre KR 74G y KR 75	19003959	373,56
Call77 S Entre KR 75 y KR 75A	19003962	327,26
Call77 S Entre KR 74F y KR 74G	19003971	357,82
Call77 S Entre KR 73L y KR 74A	19003974	347,02
Call77 S Entre KR 74D y KR 74F	19003979	396,45
Call77 S Entre KR 75A y KR 75B	19003980	289,62
Call77 S Entre KR 74A y KR 74B	19003991	336,12
Call77 S Entre KR 74C y KR 74D	19003994	321,39
Call77 S Entre KR 73I y KR 73L	19003997	288,11
Call77 S Entre KR 74B y KR 74C	19003998	396,23
Call77 S Entre KR 75C y KR 75B	19004003	271,86
Call77 S Entre KR 73I y KR 73HBIS	19004007	281,67
Call77 S Entre KR 73HBIS y KR 73H	19004012	291,9
AREA TOTAL		4279,01

El estado actual del Contrato en mención corresponderá al reportado por el Interventor a través de su informe final.

En constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original y tres (3) copias con destino a la Dirección de Gestión Corporativa y CID, Interventoría, Contratista y a la carpeta de la Supervisión, a los 3 días del mes de MARZO de 2018.

  
**INTERVENTOR**  
 CONSORCIO INTERVENTORES 2016  
 NOMBRE: ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX  
 C.C.: 79.602.923.

  
**SUPERVISOR.**  
 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR C.V.P  
 NOMBRE: JORGE LUIS TEJADA  
 C.C.7.553.703





# CAJA VIVIENDA POPULAR

## ACTA FINAL DE OBRAS EJECUTADAS COMPOSTELA Y CARACOLI






OBJETO:		REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIAL, JURIDA, AMBIENTAL Y SISO PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE LOS CIV PRIORIZADOS EN EL SECTOR DE CARACOLI, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR Y EN EL SECTOR DE COMPOSTELA LOCALIDAD DE USME DE BOGOTÁ D.C				
CIV.		CIV-19004012, CIV-19004007, CIV-19003997, CIV-19003974, CIV-19003991, CIV-19003998, CIV-19003994, CIV-19003979, CIV-19003971, CIV-19003959, CIV-19003962 CIV-19003980, CIV-19004003, CIV-3003114, CIV-3003119, CIV-3003116.				
CONTRATO DE OBRA No		597 de 2016	CONTRATISTA		UNION TEMPORAL INTERVENCION VIAL VIC	NIT 901036648-6
REPRESENTANTE LEGAL		Luis Felipe Castro				
CONTRATO DE INTERVENTORIA		594 de 2016	INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVENTORES 2016	NIT901039925-7
REPRESENTANTE LEGAL		Erick Jose Castillo Curiuer				

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PORCENTAJE EJECUTADO	%
<b>PRELIMINARES</b>					
3007	REPLANTEO GENERAL	M2	6102,00	100%	100,00%
3378	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)	M2	95,82	100%	
3800	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	6102,00	100%	
4946	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO Z: CONSTA DE POSTES ROLLIZOS DE 1.90m DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30cm x 30cm, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO (INCL. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION).	ML/ME	3200,42	100%	
<b>EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES</b>					
10093	EXCAVACION MANUAL + RETIRO SUELO BLANDO + TRASIEGO (<50m)	M3	4469,37	100%	
10360	EXCAVACION MECANICA+RETIRO SUELO BLANDO	M3	5285,05	100%	
4155	EXCAVACION MECANICA EN ROCA (Incluye Cargue)	M3	552,20	100%	
3041	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposicion final de sobrantes.	ML	0,00	100%	
8022	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Incluye cargue). No incluye transporte y disposicion final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.20m.	M2	1002,15	100%	
4269	DEMOLICION MUROS e=0.15m (Incluye cargue)	M2	292,61	100%	
3466	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposicion final de sobrantes.	M3	111,05	100%	
4849	DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).	ML	84,30	100%	
4850	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	M3	22,49	100%	
4618	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	547,47	100%	
12508	DIA DE TRASIEGO CON DOS (2) AYUDANTES	DD	715,73	100%	
NP 4869	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICION	UN	76,00	100%	
<b>RELLENOS</b>					
3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	46,62	100%	
3090	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	1607,35	100%	
3052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	2254,84	100%	
1454	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	M3	917,26	100%	
4161	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBS_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	754,50	100%	
4158	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	516,71	100%	
3018	RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRAZACION (Suministro y Extendido)	M3	5,61	100%	
4838	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACION 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION).	M3	151,42	100%	
<b>CONCRETOS</b>					
3748	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	505,05	100%	
3644	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado, Incl. Sumin, Formateo y Colocación. No Incl. Refuerzo, Curado)	M3	798,48	100%	
5422	CONCRETO 4000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado, Incl. Sumin, Formateo y Colocación. No Incl. Refuerzo, Curado).	M3	80,79	100%	
3639	CONCRETO 3500 PSI PARA VIGA (Premezclado, Incluye Sumin., Formateo y Colocación. No Incl. Refuerzo, Curado)	M3	77,62	100%	
4588	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO	M2	487,06	100%	
6047	PISO EN CONCRETO (210 Kg/cm2) GRAVA 1" O 3/4" ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES,	M2	0,00	0%	
6137	PISO EN CONCRETO (210 Kg/cm2) GRAVA 1" O 3/4" ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES,	M2	0,00	0%	
4751	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	1847,58	100%	

301. P

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PORCENTAJE EJECUTADO	%
4034	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incl. Sumin. e Instalación)	M2	2597,80	100%	
3425	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 kg/c-m2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formateo, Fundido y Curado)	M2	1620,10	100%	
4039	SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado, Inc. Sumin. Formateo. y Concl.)	ML	0,00	0%	
6099	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MAND DE OBRA, INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE).	M2	1630,10	100%	
4137	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x6cm (Suministro e Instalación, Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	0,00	100%	
4598	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación, Incluye Base 4cm mortero 2000 y Arena de Sello)	M2	722,73	100%	
	Concreto Ciclopeo 2500 psi. Premezclado + Traslago	M3	53,51	100%	
NP 3729	CONCRETO 1500 PSI PARA SOLADOS (Premezclado, Incluye Suministro y Colocación)	M3	64,41	100%	
NP 3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	2374,53	100%	
NP 3911	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO, CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO	ML	1145,09	100%	
NP 3887	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	1145,09	100%	
	MURO ESTRUCTURAL 2 VISTAS e=14	M2	291,14	100%	
NP 4291	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090. 3v.2	ML	0,00	100%	
NP 4292	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	0,00	100%	
NP 4293	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	71,03	100%	
NP 5642	PARETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (Incluye Suministro e Instalación)	M2	213,00	100%	
RED SANITARIA Y PLUVIAL					100,00%
3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0,00	0%	
3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	129,45	100%	
3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	275,55	100%	
3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	602,20	100%	
4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	97,00	100%	
6075	CODO PVC 45° D=8" (Suministro e Instalación)	UN	0,00	100%	
3479	PLACA FONDO D=1.95m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio, Incl. Sumin.)	UN	11,00	100%	
3471	CEJINERO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Incl. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeable.)	ML	40,90	100%	
6183	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D=1.20m x 0.60m e=0.10m h=0.75m (Incl. Suministro e Inst. No Incl. Anillo de Ajuste, Anillo de Tapa y Tapa)	UN	15,00	100%	
5169	PLAFONADO DE POZOS (Incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.90 x0.28x0.025m, cinta de señalización cel 4 rollo 500mx0.10m y señalización tubular colombina plástica).	UN	18,00	100%	
7041	TAPA PARA POZO EN CONCRETO	UN	0,00	0%	
3779	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m, Incluye Suministro y Construcción, Incluye Marco y Tapa, No Incl. Base y Cañuela)	UN	64,00	100%	
	CAÑUELA EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA POZOS DE INSPECCION	UN	12,00	100%	
	CAÑUELA EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA CAJAS DE INSPECCION	UN	144,00	100%	
5878	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSP.EC. (Prefabricada, Incluye Suministro e Instalación, Incluye Tapa)	UN	39,00	100%	
	CODO PVC 90° D=8" (Suministro e Instalación)	UN	3,00	100%	
	TEE PVC 90° 8" X 8" (Suministro e Instalación)	UN	3,00	100%	
3151	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezcla)	UN	0,00	100%	
7041	TAPA Y ANILLO EN POLIPROPILENO RECICLADO PARA POZO	UN	0,00	100%	
NP 4103	TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)	ML	924,00	100%	
NP 3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0,00	100%	
NP 3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	5,00	100%	
NP 3902	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0,00	100%	
NP 3883	SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado, Incl. Sumin. Form. Ref. y Constr. Incl. Tapa)	UN	24,00	100%	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PORCENTAJE EJECUTADO	%
NP 7364	REILLA SUMIDERO TRANSVERSAL 50 X 50	UN	72,00	100%	
NP 5015	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).	UN	1,00	100%	
	FILTRO FRANCES TUBO 100mm		29,50	100%	
NP 5180	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tubería perforada D=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 o similar).	ML	35,50	100%	
NP1	CODO 45° NOVAFORT 6" PARA ALCANTARILLADO (Suministro e Instalación)	UN	194,00	100%	
NP2	CAJA DE INSPECCION 0.60X0.60M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H= 0,6 A 1,0 M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).	UN	36,00	100%	
NP3	CAJA DE INSPECCION 0.60X0.60M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H= 1,0 A 1,5 M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).	UN	32,00	100%	
NP4	CAJA DE INSPECCION 0.60X0.60M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H= 1,5 A 2 M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).	UN	12,00	100%	
NP5	PLAPONADO DE CAJAS DE INSPECCION	UN	144,00	100%	
RED ACUEDUCTO					100,00%
3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	18,00	100%	
5172	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tubería PF, reposición de cajilla en polipropileno para medidor, registros y accesorios, longitud promedio = 6.5mt).	UN	146,00	100%	
3687	CAJA PARA VALVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)	UN	8,00	100%	
4402	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO USO D=4" (Suministro e Instalación)	UN	3,00	100%	
5735	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (Suministro e Instalación)	ML	980,00	100%	
4136	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (Suministro e Instalación)	UN	300,00	100%	
4851	REPARACION DE ACOMETIDA HIDRAULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERIA EXISTENTE E INSTALACION DE TUBERIA NUEVA).	UN	146,00	100%	
NP 4419	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (Suministro e Instalación)	UN	6,00	100%	
NP 5602	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (Suministro e Instalación)	UN	4,00	100%	
NP 4872	REDUCCION CONCENTRICA HD EL 4" x 3". SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	4,00	100%	
NP 5601	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (Suministro e Instalación)	UN	3,00	100%	
NP 3522	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3" (Suministro e Instalación)	UN	2,00	100%	
NP 3538	CODO G.RAD. PVC 11.25º TIPO U.M. D=3" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	100%	
NP6	EMPATE TUBERIAS DE ACUEDUCTO	UN	3,00	100%	
ACEROS					100,00%
3709	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	105724,01	100%	
4233	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	2679,64	100%	
NP7	DOVELAS CANASTILLAS PASAJUNTAS	ML	714,86	100%	
MOBILIARIO URBANO					100,00%
3858	POSTE METALICO AP, H=6m TIPO M130 SENCILLO (Inc. Sumin., Izaje, Apomado, Inst., Base según Norma AP330 y Luminaire 70W)	UN	0,00	100%	
3452	LUMINARIA DE SODIO 150W PARA AP (Inc. Suministro e Instalación, Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc. Brazo Soporte)	UN	0,00	100%	
5040	HAYUELO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.	UN	0,00	100%	
5172	SIEMBRA DE GRAMA (Incluye Suministro e instalación, No incluye Tierra Negra)	M2	2,00	100%	
3403	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1.40m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)	UN	7,00	100%	
6102	CENEFALINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TACTIL AVERTA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACION e= 4cm Y ARENA DE SELLO).	ML	183,80	100%	
5181	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (Grava común E=0.20m H=0.35m (Incluye formaleta metálica, acero de refuerzo y alambre negro).	ML	795,14	100%	
3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	94,96	100%	
3401	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (Suministro e Instalación)	UN	0,00	100%	
3400	BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (Suministro e Instalación)	UN	0,00	100%	
4920	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN..	UN	0,00	100%	
5131	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (Incluye Instalación, dados de concreto 3000 PSI grava común de 0.20 x 0.20 mt y pintura). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	32,50	100%	
NP 5952	BARANDA METALICA M-81 (Instalado y Pintado).	ML	877,87	100%	

Sup. J.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PORCENTAJE EJECUTADO	%
NP 3015	RETIRO DE POSTES DE APLA (Incluye Traslado a Sitio de Acopio)	UN	0,00	100%	
NP 4949	CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.40m) INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm <sup>2</sup> ), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA.	UN	0,00	100%	
	PLANTA ORNAMENTAL BUGANVILLAS	UN	156,00	100%	
NP 5225	PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	310,80	100%	
NP 5227	PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	152,46	100%	
NP 5220	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	ML	310,80	100%	
NP 5223	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	109,70	100%	
NP 5450	SEÑAL VERTICAL GRUPO 1 (60CMX60CM) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7,00	100%	
NP 5292	SEÑAL DOBLE DE 60 cm REFLECTIVA ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SP/SK/SI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	100%	
NP 6035	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TURISTICAS TIPO CUADRADO DE 75cm DE LADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	0,00	100%	
NP 5242	ESTOPEROL METALICO CON ESPIGO	UN	1882,00	100%	
NP 155	TRASLADO DE REDES DE GAS NATURAL	UN	12,00	100%	

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaron fallas imputables a mala calidad de la obra, la Caja de la Vivienda Popular deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 16 días del mes de julio de 2018

Firma  
Nombre: Luis Felipe Castro  
Representante legal  
UNION TEMPORAL INTERVENCIÓN VIAL CIV

Firma  
Nombre: Erick José Castillo Curielux  
Representante legal  
Consorcio Interventores 2016

Firma  
Nombre: M<sup>te</sup> Antonio Castillo Castillo  
Supervisor Mejoramiento de barrios de la CVP  
Caja de la Vivienda Popular



# CAJA VIVIENDA POPULAR

## ACTA FINAL DE OBRAS EJECUTADAS COMPOSTELA Y CARACOLI






OBJETO:		REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIAL, JURIDA, AMBIENTAL Y SISO PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCION DE LOS CIV PRIORIZADOS EN EL SECTOR DE CARACOLI, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR Y EN EL SECTOR DE COMPOSTELA LOCALIDAD DE USME DE BOGOTÁ D.C				
CIV.		CIV-19004012, CIV-19004007, CIV-19003997, CIV-19003974, CIV-19003991, CIV-19003998, CIV-19003994, CIV-19003979, CIV-19003971, CIV-19003959, CIV-19003962 CIV-19003980, CIV-19004003, CIV-3003114, CIV-3003119, CIV-3003116.				
CONTRATO DE OBRA No		597 de 2016	CONTRATISTA		UNION TEMPORAL INTERVENCION VIAL VIC	NIT 901036648-6
REPRESENTANTE LEGAL		Luis Felipe Castro				
CONTRATO DE INTERVENTORIA		594 de 2016	INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVENTORES 2016	NIT901039925-7
REPRESENTANTE LEGAL		Erick Jose Castillo Currier				

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PORCENTAJE EJECUTADO	%
<b>PRELIMINARES</b>					
3007	REPLANTEO GENERAL	M2	6102,00	100%	100,00%
3378	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)	M2	95,82	100%	
3800	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	6102,00	100%	
4946	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES ROLLIZOS DE 1.90m DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30cm x 30cm, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO (INCL. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION).	ML/ME	3200,42	100%	
<b>EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES</b>					
10093	EXCAVACION MANUAL + RETIRO SUELO BLANDO + TRASIEGO (<50m)	M3	4469,37	100%	
10360	EXCAVACION MECANICA+RETIRO SUELO BLANDO	M3	5285,05	100%	
4155	EXCAVACION MECANICA EN ROCA (Incluye Cargue)	M3	552,20	100%	
3041	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposicion final de sobrantes.	ML	0,00	100%	
8022	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Incluye cargue). No incluye transporte y disposicion final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.20m.	M2	1002,15	100%	
4269	DEMOLICION MUROS e=0.15m (Incluye cargue)	M2	292,61	100%	
3466	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposicion final de sobrantes.	M3	111,05	100%	
4849	DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).	ML	84,30	100%	
4850	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	M3	22,49	100%	
4618	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	547,47	100%	
12508	DIA DE TRASIEGO CON DOS (2) AYUDANTES	DD	715,73	100%	
NP 4869	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICION	UN	76,00	100%	
<b>RELLENOS</b>					
3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	46,62	100%	
3090	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	1607,35	100%	
3052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	2254,84	100%	
1454	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	M3	917,26	100%	
4161	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBS_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	754,50	100%	
4158	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	516,71	100%	
3018	RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRAZACION (Suministro y Extendido)	M3	5,61	100%	
4838	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACION 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACION).	M3	151,42	100%	
<b>CONCRETOS</b>					
3748	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	505,05	100%	
3644	CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado, Incl. Sumin, Formateo y Colocación. No Incl. Refuerzo, Curado)	M3	798,48	100%	
5422	CONCRETO 4000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado, Incl. Sumin, Formateo y Colocación. No Incl. Refuerzo, Curado).	M3	80,79	100%	
3639	CONCRETO 3500 PSI PARA VIGA (Premezclado, Incluye Sumin., Formateo y Colocación. No Incl. Refuerzo, Curado)	M3	77,62	100%	
4588	CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO	M2	487,06	100%	
6047	PISO EN CONCRETO (210 Kg/cm2) GRAVA 1" O 3/4" ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES,	M2	0,00	0%	
6137	PISO EN CONCRETO (210 Kg/cm2) GRAVA 1" O 3/4" ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES,	M2	0,00	0%	
4751	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	1847,58	100%	

301. 2

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PORCENTAJE EJECUTADO	%
4034	GEOTEXTIL T. RESIST. ULYMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	2597,80	100%	
3425	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 kg/c-m2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formateo, Fundido y Curado)	M2	1630,10	100%	
4039	SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado, Inc. Sumin. Formateo. y Const.)	ML	0,00	0%	
6099	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANDO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE).	M2	1630,10	100%	
4137	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	0,00	100%	
4598	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm mortero 2000 y Arena de Sello)	M2	722,73	100%	
	Concreto Ciclopeo 2500 psi. Premezclado + Traslago	M3	53,51	100%	
NP 3729	CONCRETO 1500 PSI PARA SOLADOS (Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)	M3	64,41	100%	
NP 3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	2374,53	100%	
NP 3911	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO, CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO	ML	1145,09	100%	
NP 3887	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	1145,09	100%	
	MURO ESTRUCTURAL 2 VISTAS e=14	M2	291,14	100%	
NP 4291	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090. 3v.2	ML	0,00	100%	
NP 4292	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	0,00	100%	
NP 4293	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	71,03	100%	
NP 5642	PARETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (Incluye Suministro e Instalación)	M2	213,00	100%	
RED SANITARIA Y PLUVIAL					100,00%
3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0,00	0%	
3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	129,45	100%	
3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	275,55	100%	
3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	602,20	100%	
4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	97,00	100%	
6075	CODO PVC 45° D=8" (Suministro e Instalación)	UN	0,00	100%	
3479	PLACA FONDO D=1.95m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio, Incl. Sumin.	UN	11,00	100%	
3471	CEJINERO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeable.)	ML	40,90	100%	
6183	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D=1.20m x 0.60m e=0.10m h=0.75m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste, Aro-Tapa y Tapa)	UN	15,00	100%	
5169	PLAFONADO DE POZOS (Incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.90 x0.28x0.025m, cinta de señalización cel 4 rollo 500mx0.10m y señalización tubular colombina plástica).	UN	18,00	100%	
7041	TAPA PARA POZO EN CONCRETO	UN	0,00	0%	
3779	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UN	64,00	100%	
	CAÑUELA EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA POZOS DE INSPECCION	UN	12,00	100%	
	CAÑUELA EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA CAJAS DE INSPECCION	UN	144,00	100%	
5878	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSP.EC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	39,00	100%	
	CODO PVC 90° D=8" (Suministro e Instalación)	UN	3,00	100%	
	TEE PVC 90° 8" X 8" (Suministro e Instalación)	UN	3,00	100%	
3151	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezcla	UN	0,00	100%	
7041	TAPA Y ANILLO EN POLIPROPILENO RECICLADO PARA POZO	UN	0,00	100%	
NP 4103	TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)	ML	924,00	100%	
NP 3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0,00	100%	
NP 3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	5,00	100%	
NP 3902	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" CON FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0,00	100%	
NP 3883	SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado, Incl. Sumin. Form. Ref. y Constr. Incl. Tapa)	UN	24,00	100%	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PORCENTAJE EJECUTADO	%
NP 7364	REILLA SUMIDERO TRANSVERSAL 50 X 50	UN	72,00	100%	
NP 5015	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).	UN	1,00	100%	
	FILTRO FRANCES TUBO 100mm		29,50	100%	
NP 5180	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6m x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tubería perforada D=4", grava común 1/2" y geotextil NT 4000 o similar).	ML	35,50	100%	
NP1	CODO 45° NOVAFORT 6" PARA ALCANTARILLADO (Suministro e Instalación)	UN	194,00	100%	
NP2	CAJA DE INSPECCION 0.60X0.60M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H= 0,6 A 1,0 M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).	UN	36,00	100%	
NP3	CAJA DE INSPECCION 0.60X0.60M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H= 1,0 A 1,5 M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).	UN	32,00	100%	
NP4	CAJA DE INSPECCION 0.60X0.60M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H= 1,5 A 2 M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).	UN	12,00	100%	
NP5	PLAPONADO DE CAJAS DE INSPECCION	UN	144,00	100%	
RED ACUEDUCTO					100,00%
3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	18,00	100%	
5172	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tubería PF, reposición de cajilla en polipropileno para medidor, registros y accesorios, longitud promedio = 6.5mt).	UN	146,00	100%	
3687	CAJA PARA VALVULA 0.4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)	UN	8,00	100%	
4402	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (Suministro e Instalación)	UN	3,00	100%	
5735	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (Suministro e Instalación)	ML	980,00	100%	
4136	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (Suministro e Instalación)	UN	300,00	100%	
4851	REPARACION DE ACOMETIDA HIDRAULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERIA EXISTENTE E INSTALACION DE TUBERIA NUEVA).	UN	146,00	100%	
NP 4419	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (Suministro e Instalación)	UN	6,00	100%	
NP 5602	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (Suministro e Instalación)	UN	4,00	100%	
NP 4872	REDUCCION CONCENTRICA HD EL 4" x 3". SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	4,00	100%	
NP 5601	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (Suministro e Instalación)	UN	3,00	100%	
NP 3522	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=3" (Suministro e Instalación)	UN	2,00	100%	
NP 3538	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=3" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	100%	
NP6	EMPATE TUBERIAS DE ACUEDUCTO	UN	3,00	100%	
ACEROS					100,00%
3709	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	105724,01	100%	
4233	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	2679,64	100%	
NP7	DOVELAS CANASTILLAS PASAJUNTAS	ML	714,86	100%	
MOBILIARIO URBANO					100,00%
3858	POSTE METALICO AP, H=6m TIPO M130 SENCILLO (Inc. Sumin., Izaje, Apomado, Inst., Base según Norma AP330 y Luminaire 70W)	UN	0,00	100%	
3452	LUMINARIA DE SODIO 150W PARA AP (Inc. Suministro e Instalación, Inc. Bombillo y Fotocelda con Base. No Inc. Brazo Soporte)	UN	0,00	100%	
5040	HAYUELO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). SUMINISTRO Y PLANTACION.	UN	0,00	100%	
5172	SIEMBRA DE GRAMA (Incluye Suministro e instalación, No incluye Tierra Negra)	M2	2,00	100%	
3403	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1.40m. Inc. Suministro, Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra)	UN	7,00	100%	
6102	CENEFALINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TACTIL AVERTA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACION e= 4cm Y ARENA DE SELLO).	ML	183,80	100%	
5181	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (Grava común) E=0.20m H=0.35m (Incluye formaleta metálica, acero de refuerzo y alambre negro).	ML	795,14	100%	
3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	94,96	100%	
3401	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (Suministro e Instalación)	UN	0,00	100%	
3400	BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (Suministro e Instalación)	UN	0,00	100%	
4920	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN..	UN	0,00	100%	
5131	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (Incluye Instalación, dados de concreto 3000 PSI grava común de 0.20 x 0.20 mt y pintura). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	32,50	100%	
NP 5952	BARANDA METALICA M-81 (Instalado y Pintado).	ML	877,87	100%	

Sup. J.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PORCENTAJE EJECUTADO	%
NP 3015	RETIRO DE POSTES DE APLA (Incluye Traslado a Sitio de Acopio)	UN	0,00	100%	
NP 4949	CONTENEDOR DE RAICES (1.40m x 1.40m x 1.40m) INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/Cm <sup>2</sup> ), SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2", FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA.	UN	0,00	100%	
	PLANTA ORNAMENTAL BUGANVILLAS	UN	156,00	100%	
NP 5225	PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	310,80	100%	
NP 5227	PINTURA DE TRÁFICO Y/O IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	152,46	100%	
NP 5220	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	ML	310,80	100%	
NP 5223	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	109,70	100%	
NP 5450	SEÑAL VERTICAL GRUPO 1 (60CMX60CM) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7,00	100%	
NP 5292	SEÑAL DOBLE DE 60 cm REFLECTIVA ALTA DENSIDAD TIPO IV, EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SP/SP/SI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	100%	
NP 6035	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TURISTICAS TIPO CUADRADO DE 75cm DE LADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	0,00	100%	
NP 5242	ESTOPEROL METALICO CON ESPIGO	UN	1882,00	100%	
NP 155	TRASLADO DE REDES DE GAS NATURAL	UN	12,00	100%	

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaron fallas imputables a mala calidad de la obra, la Caja de la Vivienda Popular deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 16 días del mes de julio de 2018


Firma  
Nombre: Luis Felipe Castro  
Representante legal  
UNION TEMPORAL INTERVENCIÓN VIAL CIV

Firma  
Nombre: Erick José Castillo Curielux  
Representante legal  
Consorcio Interventores 2016

Firma  
Nombre: M<sup>te</sup> Antonio Castillo Castillo  
Supervisor Mejoramiento de barrios de la CVP  
Caja de la Vivienda Popular



## CONTRATO NO 2


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>US871AT</small> <small>Caja de la Vivienda Popular</small>	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA</b>		Código: 208-DGC-FI-61
			Versión: 1      Pág: 1
	Vigente desde: 23-05-2017		

#### DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO No:	707 DE 2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO JS
NÚMERO DE IDENTIFICACION:	901139963-4
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
ID REPRESENTANTE LEGAL:	79.623.923
OBJETO:	*REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA AMBIENTAL Y SSTMA PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL-CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C* – Grupos 1 – 2 – 3
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$642.858.944.00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO:	14 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE OCTUBRE DE 2018
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	
<b>MODIFICACIONES</b>	
VALOR ADICIONADO:	\$45.018.176.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	\$687.877,120.00
PLAZO ADICIONAL:	UN(1) MES
CESION:	N/A
OTROS:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A

En Bogotá, D.C., a los **TRECE (13)** días del mes de Octubre del año 2018, se reunieron **ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.602.923 , en su calidad de representante legal de **CONSORCIO JS**, quien ejerce la Interventoría para la ejecución del Contrato No. 707 de 2017, Y **KAROLL MACLANE GARCIA VARGAS**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.018.407.905 , en su calidad de, SUPERVISOR **POR PARTE DE LA DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CVP con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, de la terminación del mencionado Contrato, por terminación de las obras y vencimiento del plazo de ejecución del mismo.**

A continuación se relacionan los CIV ejecutados para cada uno de los grupos en cada frente de obra que fueron objeto de la presente Interventoría:

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> HABITAT Caja de la Vivienda Popular	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA</b>		Código: 208-DGC-Ft-61	
			Versión: 1	Pág: 1

**GRUPO 1, Contrato 700 de 2017- Ciudad Bolívar localidad 19:** Seis (6) CIV, tipo de intervención uno (1) vía vehicular y cinco (5) espacio público.

GRUPO 1 - CIUDAD BOLIVAR					
UPZ	Barrio	Codigo CIV	Nomenclatura y Tramos	Tipo De Proyecto	Area Estimada
68	EL TESORITO	19012225	KR 18H ENTRE CALLE 81B S Y CALLE 81C S	Anden	154,58
		19012244	KR 18H ENTRE CALLE 81D S Y CALLE 81C S	Anden	138,78
		19012250	KR 18I ENTRE CALLE 81D S Y CALLE 81C S	Via	575,12
67	NACIONES UNIDAS VISTA HERMOSA	19011267	KR 18R ENTRE CALLE 77 S Y CALLE 77A S	Anden	113,02
		19011108	KR 18P ENTRE CALLE 76 S Y CALLE 75A S	Anden	270
		19010902	KR 18K ENTRE CALLE 75A S Y CALLE 76 S	Anden	215,46
AREA TOTAL					1328,18

**GRUPO 2, Contrato 690 de 2017 - Usme localidad 5:** Cinco (5) CIV, tipo de intervención uno (1) vía vehicular y cuatro (4) espacio público.

GRUPO 2 - USME LOCALIDAD 5						
UPZ		BARRIO	CODIGO CIV	NOMENCLATURAS Y TRAMOS	TIPO DE PROYECTO	AREA ESTIMADA (M2)
No	Nombre					
52	LA FLORA	VILLA DIANA	5004703	CL 89A S ENTRE KR12G E Y KR 12HE	ANDEN	307
			5004713	CL 89A S ENTRE KR12F E Y KR 12GE	ANDEN	447
			5004723	CL 89A S ENTRE KR12F E Y KR 12DE	VIA	303,1
			5004725	CRA 12D E ENTRE CL 89S Y CL 89A S	VIA	861,1
59	ALFONSO LOEZ	PUERTA AL LLANO	30001896	KR 8CENTRE CK108S Y CL109 S	VIA VEHICULAR	668,53
AREA TOTAL						2586,73

**GRUPO 3, Contrato 688 de 2017 - Usme localidad 5 - y Rafael Uribe localidad 18:** Cuatro (4) CIV, tipo de intervención vía vehicular

GRUPO 3 - USME Y RAFAEL URIBE					
UPZ	BARRIO	CIV	NOMENCLATURA Y TRAMOS	TIPO DE PROYECTO	AREA ESTIMADA (M2)
56	DANUBIO AZUL	5000123	KR 4 ENTRE CALLE 57 S Y CALLE 58S	VIA VEHICULAR	259,61
		5000129	KR 3 BIS ENTRE DG 54 D S Y CALLE 54G S	VIA VEHICULAR	200,6
		5000320	DG62 S ENTRE KR2C Y KR 2	VIA VEHICULAR	384,75
65	LA PAZ	18006382	CALLE 54 S ENTRE KR48 Y KR48C	VIA VEHICULAR	128,26
AREA TOTAL					973,22
AREA TOTAL INTERVENIDA					4888,13 M2

El estado actual del Contrato en mención corresponderá al reportado por el Interventor a través de su informe final.

En constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original y tres (3) copias con destino a la Dirección de Gestión Corporativa y CID, Interventoría, Contratista y a la carpeta de la Supervisión, a los 13 días del mes de OCTUBRE de 2018.

INTERVENTOR.  
CONSORCIO US  
NOMBRE: ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX  
C.C.: 79.602.923.

SUPERVISORA.  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR C.V.P  
NOMBRE: KAROLI MACLANE GARCIA VARGAS  
C.C.: 1.018.407.905



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Casa de Vivienda Popular

## ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

Código: 208-MB-FI-17

Versión: 1 Pág: 1 de 3

Vigente desde: 18/09/2011

FECHA DD MM AA  
21 6 2018

DEPENDENCIA

DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS

CONTRATO DE OBRA No:

688

DE

2017

OBJETO DEL CONTRATO:

" EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CODIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV),  
UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS ANEXO TECNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 449.021.713,00

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

14

(DIA)

DE

FEBRERO

(MES)

DE 2018

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

Cuatro (4) Meses

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO

21

(DIA)

DE

Junio

(MES)

DE 2018

CONTRATISTA:

CONSORCIO JOTA JOTA

INTERVENTOR:

CONSORCIO JS

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

Nº MODIFICACION	TIPO MODIFICACION	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
N.A	N.A		N.A	

SUSENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	TIPO DE ACTA		FECHA	PERIODO			DURACION	FECHA REANUDACION	DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE		HASTA				
1	N.A	N.A								
2										
3										
4										
TOTAL										

DISPONIBILIDAD Y RESERVAS PRESUPUESTALES:

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1429		3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 449.021.713,00

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

Código:208-MB-FI-17

Versión: 1 Pág: 1 de 3

Vigente desde: 16/09/2011

Reservas Presupuestales

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
4104	3/08/2018	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 449.021.714,00

ORDENES DE PAGO:

El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
17277	Abril 12 de 2018	3.3.1.15.02.14.02.14.0208-134	3.3.1.15.02.14.02.14.0208-134	\$ 134.706.514,00
17639	Junio 26 de 2018	3.3.1.15.02.14.02.14.0208-134	3.3.1.15.02.14.02.14.0208-134	\$ 45.327.671,00
17741	Julio 17 de 2018	3.3.1.15.02.14.02.14.0208-134	3.3.1.15.02.14.02.14.0208-134	\$ 72.967.226,00
17931	Octubre 1 de 2018	3.3.1.15.02.14.02.14.0208-134	3.3.1.15.02.14.02.14.0208-134	\$ 150.545.509,00

En la ciudad de Bogotá, a los Trece (13) días del mes de julio del año 2018, se reunieron los siguientes: Juan Carlos Briceño Chaves como representante legal o su delegado (dobidamente autorizado) de la firma contratista Erick Jose Castillo Curieux como representante o su delegado (dobidamente autorizado) de la firma interventora y el supervisor del contrato, o un delegado por la Caja de Vivienda Popular Milier Antonio Castillo, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No.688 del año 2017 por parte de la Caja de Vivienda Popular, a la firma Contratista, en cumplimiento de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato de obra mencionado.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

LOCALIZACION DE LAS OBRAS:

LOCALIDAD: 5  
UPZ: 57  
BARRIO: USME  
CODIGOS CVP:  
  
LOCALIDAD: 18  
UPZ: 55  
BARRIO: RAFAEL URIBE  
CODIGOS CVP:

NOMENCLATURA DE REFERENCIA:

kra 4 entre calle 57 Sy calle 58 sur - CIV 5000123 ; kra 3 bis entre dq 54 D Sur y calle 54G Sur CIV 5000129 , Dq 62 Sur entre kr 2c y kr 2 CIV 5000320

NOMENCLATURA DE REFERENCIA:


Calle 54 Sur entre kr 4 b y kr 4 c - CIV 18006382


VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor de la obra ejecutada:	\$ 421.750.535,00
Valor Mayores cantidades de obra ejecutadas:	\$ 107.382.306,00
Valor Items no previstos ejecutados:	\$ 45.834.876,00
Valor total ejecutado obra, Social y Sisoma	\$ 448.385.467,00
Valor total NO ejecutado	\$ 636.246,00


VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA POR CIV

CIV-500123 -CARRERA 4H ENTRE CALLE 57 S Y CALLE 58SUR	\$ 78.462.806,40
CIV- 500129 - CARRERA 3 Bis ENTRE Dq 54D Sur Y Calle 54G SUR	\$ 70.927.814,00
CIV- 500320 - Dq62 SUR ENTRE CARRERA 2C Y CARRERA 2	\$ 132.938.617,12
CIV- 18006382 - CALLE 54 SUR ENTRE CARRERA 4B ESTE Y CARRERA 4C	\$ 47.163.367,70
SUBTOTAL	\$ 329.492.605,00

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SAMITAP Caja de Vivienda Popular		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA							Código: 208-MB-FI-17 Versión: 1      Pág: 1 de 3 Vigente desde: 16/09/2011		
A.I.U. 28%		\$						\$	92.257.929,40		
TOTAL		\$						\$	421.750.535,00		
Componente Social Ejecutado		\$						\$	16.832.800,00		
Componente Sisoma Ejecutado		\$						\$	9.802.132,00		
TOTAL		\$						\$	448.385.467,00		
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA ( POR TRAMOS CVP SI APLICA):											
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CIV-5000123	CIV-5000129	CIV-5000320	IV-1880063	Total	V. UNIT	V. TOTAL		
1	PRELIMINARES										
1,1	REPLANTEO CON COMISION TOPOGRAFICA	M2	260,96	229,38	450	144,72	1085,06	\$ 570,00	\$ 618.484,20		
1,2	DESCAPOTE MANUAL ALTURA ENTRE 10 Y 15 CM - INCLUYE TRASIEGOS Y RETIRO DE SOBRESANTES A BOTADERO AUTORIZADO	M2	0	0	0	0	0	\$ 5.000,00	\$ -		
1,3	EXCAVACION MANUAL , INCLUYE TRASIEGOS, CARGUE Y RETIRO DE SOBRESANTES A BOTADERO	M3	62,15	59,51	156,04	56,46	334,16	\$ 43.500,00	\$ 14.535.960,00		
1,4	EXCAVACION MECANICA MATERIAL COMUN, INCLUYE TRASIEGOS, CARGUE Y RETIRO DE SOBRESANTES A BOTADERO	M3	140,75	98,7	200,38	72,9	512,73	\$ 28.500,00	\$ 14.612.805,00		
1,5	NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA DE LA SUBRASANTE	M2	185,2	121,86	212,5	91,12	610,68	\$ 1.400,00	\$ 854.952,00		
1,6	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CÁMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A BOTADERO )	M3	0,87	0	0	0	0,87	\$ 153.000,00	\$ 133.110,00		
1,7	DEMOLICION SARDINEL EN CONCRETO H=0,50M - INCLUYE TRASIEGOS, CARGUE Y RETIRO DE SOBRESANTES A BOTADERO	ML	0	0	0	0	0	\$ 6.350,00	\$ -		
1,8	DEMOLICION DE ESCALERAS (PIEDRA O CONCRETO) H= 0,10 - 0,35M, INCLUYE TRASIEGOS, CARGUE Y RETIRO DE SOBRESANTES A BOTADERO	M2	0	5,2	10,8	0	16	\$ 20.600,00	\$ 329.600,00		
1,9	DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO O PLACA DE ANDÉN EN CONCRETO ENTRE 0,1M - 0,25M INCLUYE TRASIEGOS, CARGUE Y RETIRO DE SOBRESANTES A BOTADERO	M2	143,47	71,75	156,8	60	432,02	\$ 24.500,00	\$ 10.584.490,00		
1,10	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA CON MADERA ROLLIZA CADA 3 METROS DE DISTANCIA. (ALTURA 2,5 METROS )	ML	89,18	96,68	130	58,6	374,46	\$ 16.000,00	\$ 5.991.360,00		
1,11	NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE LA SUBRASANTE	M2	151,8	93,96	137,5	79,5	462,76	\$ 2.550,00	\$ 1.180.038,00		
1,13	TRASLADO DE POSTES DE ENERGIA Y TELEFONOS (INCLUYE TRAMITES Y TRABAJO HASTA PUESTA EN SERVICIO DEL PORTE)	UN	0	0	0	1	1	\$ 2.020.000,00	\$ 2.020.000,00		
2	RELLENOS Y BASES										
2,2	RELLENO EN RAJON DE ARENISCAS, COLOCACION MANUAL (INCLUYE SELLO EN RECEBO COMUN DE 0,10M. SUMINISTRO Y EXTENDIDA)	M3	74,08	48,74	85	34,3	242,12	\$ 72.000,00	\$ 17.432.640,00		
2,3	SBG - C SUMINISTRO Y COMPACTACION MECANICA	M3	0	0	0	0	0	\$ 108.000,00	\$ -		
2,4	SBG - C SUMINISTRO, Y COMPACTACION MANUAL	M3	44,16	29,54	41,25	0	114,95	\$ 108.000,00	\$ 12.414.600,00		
2,5	SBG - B SUMINISTRO Y COMPACTACION MECANICA	M3	20,7	16,7	28,13	12,06	77,59	\$ 108.000,00	\$ 8.379.720,00		
2,9	GEOTEXTIL T- 2400 O SIMILAR	M2	138	111,36	187,5	80,4	517,26	\$ 7.600,00	\$ 3.931.176,00		
2,10	SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	14,28	25	84,9	12,24	136,42	\$ 45.000,00	\$ 6.138.900,00		
3	CONCRETOS Y MORTEROS										
3,2	CONCRETO DE 3000PSI FUNDIDO EN SITIO PARA FRANJA DE CONFINAMIENTO ANCHO 10 A 20CM POR ALTURA DE 0,20MT	ML	185,89	147,9	227	87,2	647,99	\$ 18.800,00	\$ 12.182.212,00		
3,3	ACERO DE REFUERZO 6000PSI 420 MPA (SUMINISTRO E INSTALACION)	KG	122,62	147,26	419,3	64,77	753,95	\$ 2.690,00	\$ 2.028.125,50		
3,4	CONCRETO DE 3000PSI FUNDIDO EN SITIO PARA RAMPAS DE ACCESO E=0,10MT (INCLUYE MALLA DE REFUERZO Y FORMALETAS)	M2	64,34	29,93	30,46	11,09	135,82	\$ 55.000,00	\$ 7.470.100,00		
3,6	CONCRETO DE 3000PSI PARA VIGAS DE ESCALERAS CON MAS DE DOS ESCALONES SECCION DE 0,47 X 0,3MT (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETAS, SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	0	51,6	0	0	51,6	\$ 144.000,00	\$ 7.430.400,00		
3,7	CONCRETO DE 3000PSI PARA VIGAS DE ESCALERAS CON HASTA DOS ESCALONES SECCION DE 0,47 X 0,3MT (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETAS, SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	0	0	18,42	0	18,42	\$ 128.800,00	\$ 2.372.496,00		
3,8	CONCRETO DE 3000PSI PARA ESCALONES DE ESCALERAS SEGUN DISEÑO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETAS, SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	9,2	10,8	0	4	24	\$ 110.000,00	\$ 2.640.000,00		
4	MAMPOSTERIA Y MUROS DE CONTENCIÓN										
4,3	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 1 EN MAMPOSTERIA H=1,0 MT INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ZARPA DE CIMENTACION Y FORMALETAS	ML	6,95	11,2	4	11,8	33,95	\$ 350.000,00	\$ 11.882.500,00		
4,4	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 2 EN MAMPOSTERIA H=1,8 MT INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ZARPA DE CIMENTACION Y FORMALETAS	ML	9	9,6	0	0	18,6	\$ 545.000,00	\$ 10.137.000,00		

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Caja de Vigilancia Popular										<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA</b>		Código:208-MB-Ft-17	
										Versión: 1		Pág: 1 de 3	
										Vigente desde: 16/09/2011			
4,5	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 3 EN MAMPOSTERÍA H=2,15 MT. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ZARPA DE CIMENTACIÓN Y FORMALETA	ML	0	0	0	0	0	0	0	\$	810.000,00	\$	-
4,6	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 4 EN CONCRETO DE 3000PSI H=2,65 MT. VASTAGO DE 0,25MT. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ZARPA DE CIMENTACIÓN Y FORMALETA	ML	0	0	6,75	0	0	0	6,75	\$	1.020.000,00	\$	6.885.000,00
4,9	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 7 EN CONCRETO DE 3000PSI H=2,3-1,8 MT. VASTAGO 0,3M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ZARPA DE CIMENTACIÓN Y FORMALETA (DANUBIO CIV 320)	UN	0	0	1	0	0	0	1	\$	4.300.000,00	\$	4.300.000,00
4,12	FILTRO PERIMETRAL DE 0,3 X 0,3 SEGÚN DISEÑO INCLUYE GEOTEXTIL, GRAVA, TUBERÍA Y EXCAVACIÓN	ML	0	0	10	0	0	0	10	\$	32.000,00	\$	320.000,00
5	ADOQUINES Y PREFABRICADOS												
5,1	ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X8 CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0	0	0	11,64	0	0	11,64	\$	50.000,00	\$	582.000,00
5,5	ADOQUIN DE ARCILLA 20 X 10 X 6 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) COLOR TERRACOTA	M2	40,5	55,22	134,4	17,8	0	0	247,92	\$	58.000,00	\$	14.379.360,00
5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO TACTIL (0,40X0,40X0,06) - ALERTA A-55 GUÍA A-56	ML	26,5	11,6	17,77	2,5	0	0	58,37	\$	27.500,00	\$	1.605.175,00
5,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE EMBOQUILLADO	ML	26,2	61,46	16,8	35,9	0	0	140,36	\$	43.000,00	\$	6.035.480,00
5,9	ADOQUIN DE CONCRETO 20 X 10 X 8 CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 5CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	138	111,36	0	27,45	0	0	276,81	\$	70.500,00	\$	19.515.105,00
5,10	ADOQUIN DE CONCRETO 20 X 10 X 8 CM COLOR AMARILLO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 5CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0	0	0	22,88	0	0	22,88	\$	81.000,00	\$	1.853.280,00
5,12	ADOQUIN DE CONCRETO 20 X 10 X 8 CM COLOR TERRACOTA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 5CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	0	0	0	22,88	0	0	22,88	\$	63.000,00	\$	1.441.440,00
5,15	BOLARDO CIRCULAR PREFABRICADO 10U M60 ABUSARDADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2	10	4	4	0	0	20	\$	116.000,00	\$	2.320.000,00
6	REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS												
6,2	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE H=0,5M. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES)	UN	0	0	5	0	0	0	5	\$	355.000,00	\$	1.775.000,00
6,3	POZO DE INSPECCIÓN SEGÚN NORMA EAAB - H=2,0M - PAÑETADO POR DENTRO Y FUERA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PLACA DE FONDO, CARGUE, PASOS)	UN	0	0	0	1	0	0	1	\$	4.150.000,00	\$	4.150.000,00
6,5	TUBERÍA NOVAFORT D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO EN GRAVILLA DE 1/2 Y RECEBO SEGÚN NORMA EAB)	ML	0	0	0	16	0	0	16	\$	53.000,00	\$	848.000,00
6,7	TUBERÍA NOVAFORT D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO EN GRAVILLA DE 1/2 Y RECEBO SEGÚN NORMA EAB)	ML	0	0	0	0	0	0	0	\$	110.000,00	\$	-
6,8	NIVELACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D=1/2"	UN	11	5	17	5	0	0	38	\$	30.500,00	\$	1.159.000,00
6,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO DE 1/2" SEGÚN NORMA EAB 024 (INCLUYE REGISTRO Y ACCESORIOS)	UN	11	5	34	5	0	0	55	\$	78.000,00	\$	4.290.000,00
6,10	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EXISTENTE - INCLUYE TRASIEGOS, CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES	UN	11	5	17	5	0	0	38	\$	33.000,00	\$	1.254.000,00
6,11	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,8 X 0,8 ALTURA DE 1,2MT (INCLUYE CAÑUELA, TAPA EN CONCRETO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO POR AMBAS CARAS)	UN	11	5	18	5	0	0	39	\$	450.000,00	\$	17.550.000,00
6,13	LIMPIEZA DE POZOS MANUAL (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	0	0	5	0	0	0	5	\$	48.000,00	\$	240.000,00
6,14	LIMPIEZA DE SUMIDERO MANUAL (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	0	0	0	0	0	0	0	\$	51.600,00	\$	-
6,15	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA. Y ANCLAJE PUNTUAL NE-002 V.5.1	ML	48,6	49,3	132,4	18,9	0	0	249,2	\$	14.000,00	\$	3.488.800,00
6,16	INSPECCIÓN DE TUBERÍA. Y ANCLAJE PUNTUAL NE-002 V.5.1	UN	0	0	0	0	0	0	0	\$	970.000,00	\$	-
6,17	INSPECCIÓN DE REDES CON EQUIPO ROBOTICO CCTV DE 6" A 24" SEGÚN NORMA EAAB NS-058 V. 3, 2	ML	48,6	49,3	126,4	18,9	0	0	243,2	\$	12.000,00	\$	2.918.400,00
6,18	CARGUE PARA POZO D=1,7 INCLUYE TAPA PLÁSTICA NO RECICLABLE SEGÚN NORMA EAAB	UN	1	0	1	0	0	0	2	\$	1.840.000,00	\$	3.680.000,00
6,19	CARGUE PARA POZO D=1M INCLUYE TAPA PLÁSTICA NO RECICLABLE SEGÚN NORMA EAAB	UN	0	0	0	0	0	0	0	\$	1.158.818,00	\$	-
6,20	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN Y EMBOQUILLADO	UN	43	43,5	0	33,5	0	0	120	\$	53.000,00	\$	6.360.000,00
6,23	SUMIDERO SEGÚN DISEÑO (H=1,3 ANCHO 0,72M LARGO 1,17MT INCLUYE REJILLA DE 0,5 X 0,9 MT, REFUERZO Y FORMALETA)	UN	1	1	1	0	0	0	3	\$	1.450.000,00	\$	4.350.000,00
6,24	ENTIBADO EN MADERA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PUNTALES DE 2 X 4 CM CADA 0,20 CM Y CODALES DE 0,03 X 0,03 CADA 1,2 Y LARGUEROS DE 0,10 X 0,20 CADA 1,6)	ML	0	0	0	0	0	0	0	\$	43.000,00	\$	-



<div>  <div> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SANTAY Caja de Vivienda Popular </div> </div> <div> <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA</b> </div> <div> Código: 208-MB-Fl-17  Versión: 1      Pág: 1 de 3  Vigente desde: 16/08/2011 </div>											
6,25	TUBERÍA DE 3" RED PRESIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ACCESORIOS	ML	0	0	0	0	0	\$	12.900,00	\$	-
6,26	CAJILLA PARA CONTADOR DE ACUEDUCTO (CAJILLA PLÁSTICA SEGÚN NORMA EAB)	UN	11	5	17	5	38	\$	165.000,00	\$	6.270.000,00
6,27	RED DE 4" PVC RDE 21 SUMINISTRO E INSTALACION	ML	0	0	75	0	75	\$	48.000,00	\$	3.600.000,00
6,30	UNION 4" RDE 21 SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0	0	2	0	2	\$	74.000,00	\$	148.000,00
6,32	REDUCCION DE 4" A 3" RDE-21 SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0	0	0	0	0	\$	136.000,00	\$	-
6,33	TAPONES DE 4" RDE-21 SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0	0	2	0	2	\$	242.500,00	\$	485.000,00
6,34	CODO DE 45GRADOS DE 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0	0	3	0	3	\$	217.000,00	\$	651.000,00
6,37	TUBERIA DE CONCRETO EXTRAREFORZADO DE 10" INCLUYE GRAVA DE 1/2" Y RELLENO SEGÚN NORMA EAB.	ML	0	0	0	0	0	\$	210.000,00	\$	-
6,38	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" INCLUYE GRAVA DE 1/2" Y RELLENO SEGÚN NORMA EAB.	ML	6	10	0	18,5	34,5	\$	84.000,00	\$	2.898.000,00
6,40	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 8" INCLUYE GRAVA DE 1/2" Y RELLENO SEGÚN NORMA EAB.	ML	0	0	0	0	0	\$	71.000,00	\$	-
6,42	ANCLAJES EN CONCRETO PARA UNIONES DE 3" 4" SEGÚN DISEÑO HIDRAULICO	UN	0	0	0	0	0	\$	82.000,00	\$	-
7	SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO										
7,2	BARANDA METALICA M-81 PREFABRICADA (INCLUYE INSTALACIÓN, DADOS DE CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 MTS Y PINTURA), SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	14,86	10,32	10,19	0	35,37	\$	220.000,00	\$	7.781.400,00
7,3	SEÑAL TRANSITO VERTICAL - ESPECIFICACION SDM - GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3	4	4	4	15	\$	350.000,00	\$	5.250.000,00
8	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 1.0	Suministro e instalación de Sardinol especial A-100 para rampa	UN	12	0	14	0	26	\$	33.267,00	\$	864.942,00
NP 2.0	Suministro e instalación de Sardinol especial A-10	ML	33,6	0	51,4	62	147	\$	47.414,00	\$	6.969.858,00
NP 3.0	Suministro e instalación MR 41 para placa de espesor de 20 cms incluye dovola de 1" y corte y sellado de juntas	M3	0	0	46,66	0	46,66	\$	599.522,00	\$	27.973.696,52
SUBTOTAL										\$	329.492.605,22
28% AIU										\$	92.257.929,48
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA										\$	421.750.535,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS										\$	-
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES										\$	421.750.535,00
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD						VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Componente Gestion SOCIAL	GI	1						\$ 16.832.800,00	\$ 16.832.800,00	
2	Componente Gestion SISOMA	GI	1						\$ 9.802.132,00	\$ 9.802.132,00	
VALOR TOTAL DL CONTRATO, OBRA, SOCIAL Y SISOMA										\$	448.385.467,00
RELACION DE GARANTIAS DEL CONTRATO:											
RELACION DE ACCIONES LEGALES EN PROCESO											
CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No DE EXPEDIENTE							
RELACION DE SANCIONES REALIZADAS AL CONTRATO:											
N.A											
RESOLUCION No	SANCIONES	FECHA									
	OBJETO	3/12/2018									





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MAYORAT  
Caja de Vivienda Popular

## ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

Código: 208-MB-FI-17

Versión: 1

Pág: 1 de 3

Vigente desde: 16/06/2011

### RELACION DE GARANTÍAS DEL CONTRATO:

Garantías	Nombre Asegurador	No. Póliza	Vigencia		No de Certificado Modificadorio	Valor Asegurado
			Fecha de Iniciación	Fecha de Vencimiento		
Buen Manejo de Anticipo	SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101165390	22/02/2018	23/06/2019	Anexo 4	\$ 134.706.513,90
Salarios y Prestaciones Sociales	SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101165390	22/02/2018	23/06/2021	Anexo 4	\$ 67.353.256,95
Calidad del Servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101165390	13/07/2018	13/07/2023	Anexo 4	\$ 224.510.856,50
Cumplimiento del Contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101165390	22/02/2018	23/06/2019	Anexo 4	\$ 134.706.513,90
VALOR TOTAL ASEGURADO						\$ 561.277.141,25

### CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

### PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO





Valor total concedido: \$134.706.514,00  
Valor total amortizado: \$134.706.514,00

### RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

CORTE DE OBRA No.	PERIODO	VALOR COSTO DIRECTO	VALOR AIU	VALOR TOTAL	VR IVA	VR TOTAL	VALOR AMORTIZADO	VALOR NETO
1	Marzo 22 a abril 21 de 2018	\$ 44.673.911,20	\$12.508.695,14	\$ 57.182.606,34		\$ 57.182.606,34	\$ 19.426.145,00	\$ 64.753.816,26
2	Abril 22 a mayo 21 de 2018	\$ 76.959.956,00	\$21.551.587,68	\$ 98.521.543,68		\$ 98.521.543,68	\$ 31.271.668,00	\$ 104.238.894,02
3	Mayo 21 a Junio 21 de 2018	\$ 207.849.038,02	\$58.197.730,65	\$ 266.046.768,67		\$ 266.046.768,67	\$ 84.008.701,00	\$ 279.392.756,67
4								
TOTALES							\$134.706.514,00	\$ 448.385.466,95

### RECIBO DE DOCUMENTOS

N.A

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA</b>			Código: 208-MB-FI-17
				Versión: 1      Pág: 1 de 3
				Vigente desde: 16/08/2011
<b>CLASE DE DOCUMENTO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>NUMERO DE COPIAS</b>	
N.A	N.A	N.A	N.A	
<p>La liquidación del contrato no releva al interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.</p> <p>Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, la Caja de la Vivienda Popular deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.</p> <p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los <u>_(13) Trece _</u> días del mes de <u>Julio_</u> de <u>2018_</u>.</p>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p></p> <p>Firma</p> <p>Nombre: Juan Carlos Briceño Chavez</p> <p>Representante legal: Contratista</p> <p>CONSORCIO Jota Jota</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p></p> <p>Firma</p> <p>Nombre</p> <p>Millor Antonio Castillo</p> <p>Supervisor del Contrato</p> <p>Director Millor Antonio Castillo Barrios C.V.P.</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p></p> <p>Firma</p> <p>Nombre :ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX</p> <p>Representante legal: Interventoría</p> <p>Consortio JS</p> </div> </div>				



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

# ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

Código 208-M8-FI-17

Versión: 1

Pág. 1 de 3

Vigente desde: 15/09/2011

DEPENDENCIA

DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS

FECHA

DD	MM	AA
29	11	2018

CONTRATO DE OBRA N°:

690

DE

2017

OBJETO DEL CONTRATO.

" EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CODIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO"

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$

1.085.547.045,00

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

14

DE

FEBRERO

DE

2018

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

Siete (7) Meses

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO

13

DE

Septiembre

DE

2018

CONTRATISTA

BELISARIO ALFREDO DE LEON NARVAEZ

INTERVENIOR:

CONSORCIO JS

## CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No. MODIFICACION	TIPO MODIFICACION	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
No0	Inicial	Seis(6) Meses	\$ 977.070.600	\$ 977.070.600,00
No1	Adición y prórroga	Un (1) Mes	\$ 108.476.445	\$ 1.085.547.045,00

## SUSPENSIÓN (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	TIPO DE ACTA		FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION	DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA				
1	N.A	N.A		N.A					
2									
3									
4									
TOTAL									

## DISPONIBILIDAD Y RESERVAS PRESUPUESTALES:


Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:


### Disponibilidades Presupuestales

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1430	11/10/2017	3-3-1-15-02-14-0203-134	3-3-1-15-02-14-0203-134	\$ 977.070.600,00
1030	3/03/2018	208-01-3-3-1-15-02-14-0203-14	208-01-3-3-1-15-02-14-0203-14	\$ 108.476.445,00


### Reservas Presupuestales


No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
3996	14/12/2017	3-3-1-15-02-14-0203-134	3-3-1-15-02-14-0203-134	\$ 977.070.600,00
3996	13/03/2018	208-01-3-3-1-15-02-14-0203-14	208-01-3-3-1-15-02-14-0203-14	\$ 108.476.445,00

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ</b> SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA</b>	Código: 209-MB-PV-17 Versión: 1    Pág. 1 de 3 Vigente desde: 15/09/2011								
<b>ORDENES DE PAGO:</b> El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación:										
	No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR					
	17119	22/03/2018	3.3.1.15.02.14.0208.134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 283.121.180,00					
	17749	23/07/2018	3.3.1.15.02.14.0208.134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 47.316.977,00					
	17766	26/07/2018	3.3.1.15.02.14.0208.134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 84.617.607,00					
	17770	18/08/2018	3.3.1.15.02.14.0208.134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 223.333.650,00					
	17861	24/08/2018	3.3.1.15.02.14.0208.134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 185.122.010,00					
	18039	21/12/2018	3.3.1.15.02.14.0208.134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 133.193.010,00					
					<b>\$ 976.604.434,00</b>					
En la ciudad de Bogotá, a los Veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2018, se reunieron los siguientes: Belisario Alfredo de Leon Narvaez como representante legal o su delegado (debidamente autorizado) de la firma contratista Erick Jose Castillo Curieux como representante o su delegado (debidamente autorizado) de la firma interventora y el supervisor del contrato, o un delegado por la Caja de Vivienda Popular Karol Garcia, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No. 690 del año 2017 por parte de la Caja de Vivienda Popular, a la firma Contratista, en cumplimiento de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato de obra mencionado.										
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA QUE SE RECIBE:</b> La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.										
<b>LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS:</b>										
LOCALIDAD:	USME No 5		NOMENCLATURA DE REFERENCIA:							
UPZ:	52	CIV-5004725- CARRERA 12 D ESTE ENTRE CALLE 69 Y 83A SUR								
BARRIO:	VILLA DIAHA		CIV-5004703- CALLE 83A SUR ENTRE CARRERA 12G ESTE Y CARRERA 12 H ESTE							
CODIGOS CVP:	5004725-5004703-5004713-5004724		CIV-5004713- CALLE 83A SUR ENTRE CARRERA 12G ESTE Y CARRERA 12 F ESTE							
			CIV-5004724- CALLE 83A SUR ENTRE CARRERA 12F ESTE Y CARRERA 12 D ESTE							
LOCALIDAD:	USME No 5		NOMENCLATURA DE REFERENCIA:							
UPZ:	52		CIV-30001899- CARRERA 8C ENTRE CALLE 108 S Y CALLE 109 SUR							
BARRIO:	UERTA AL LLANO									
CODIGOS CVP:	30001899									
<b>VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:</b>										
Valor de la obra ejecutada:			\$	1.043.926.039,00						
Valor Mayores cantidades de obra ejecutadas:			\$	287.087.402,00						
Valor Items no previstos ejecutados:			\$	141.381.626,10						
Valor total de la obra:			\$	1.085.116.039,00						
<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA POR CIV</b>										
	CIV-30001899- CARRERA 8C ENTRE CALLE 108 S Y CALLE 109 SUR		\$	310.556.387,00						
	CIV-5004725- CARRERA 12 D ESTE ENTRE CALLE 69 Y 83A SUR		\$	283.121.180,00						
	CIV-5004703- CALLE 83A SUR ENTRE CARRERA 12G ESTE Y CARRERA 12 H ESTE		\$	84.573.063,00						
	CIV-5004713- CALLE 83A SUR ENTRE CARRERA 12G ESTE Y CARRERA 12 F ESTE		\$	62.833.688,00						
	CIV-5004724- CALLE 83A SUR ENTRE CARRERA 12F ESTE Y CARRERA 12 D ESTE		\$	58.658.701,00						
SUBTOTAL			\$	803.028.039,00						
ALU	30%		\$	249.908.009,00						
<b>TOTAL</b>			\$	1.043.926.039,00						
<b>CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA (POR TRABO CVP SI APLICAR)</b>										
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Pla Al Llano CIV 1- 30001899	VILLA DIAHA CIV 1- 5004725	DIAHA CIV 1- 5004703	DIAHA CIV 1- 5004713	DIAHA CIV 1- 5004724	Total	V. UNIT	V. TOTAL
1	<b>PRELIMINARES</b>									
1.1	REPLANTEO CON COMISION TOPOGRAFICA	M2	693,47	591,76	156,34	174,93	159,54	1776,04	\$ 562	\$ 998.134,48
1.2	DESCAPOTE MANUAL ALTURA ENTRE 10 Y 15 CM - INCLUYE TRASIEGOS Y RETIRO DE SOBANTES A BOTADERO AUTORIZADO	M2		96,1		65,9	14,3	176,3	\$ 4.969	\$ 876.034,70
1.3	EXCAVACION MANUAL, INCLUYE TRASIEGOS, CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A BOTADERO	M3	650,66	668,14	188,01	181,4	148,93	1833,14	\$ 45.734	\$ 83.836.824,76
1.4	EXCAVACION MECANICA MATERIAL COMUN, INCLUYE TRASIEGOS, CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A BOTADERO	M3	373,66	262,7	128,87	128,7	148,8	1042,73	\$ 30.011	\$ 31.293.370,03
1.5	NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA DE LA SUBRASANTE	M2	374,85	346	112,28	121,87	104,61	1059,61	\$ 1.372	\$ 1.453.784,92
1.7	DEMOLICION SARDINEL EN CONCRETO H=0,50M - INCLUYE TRASIEGOS, CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A BOTADERO	ML				0	0	0	\$ 6.249	\$ -

<div>  <div> <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ</b>  <small>CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO</small> </div> </div>											
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA											
										Código: 208-M3-FI-17	
										Versión: 1	Pág. 1 de 3
										Vigencia desde: 16/09/2011	
1.8	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS (PIEDRA O CONCRETO) H=0,10 - 0,35M. INCLUYE TRASIEGOS, CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A BOTADERO	M2				0	0	0	\$	20.221	\$ -
1.9	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO O PLACA DE ANDÉN EN CONCRETO ENTRE 0,1M - 0,25M. INCLUYE TRASIEGOS, CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A BOTADERO	M2	138,21	94		52,2	0	284,41	\$	25.415	\$ 7.228.280,15
1.10	CERRAMIENTO EN POLISOMERA CON MADERA ROLLIZA CADA 3 METROS DE DISTANCIA (ALTURA 2,6 METROS)	ML	257	197,78	65	70	61	650,78	\$	16.264	\$ 10.584.285,92
1.11	NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE LA SUBRASANTE	M2	370,04	292,8	123,97	140,8	103,88	1031,29	\$	2.513	\$ 2.591.631,77
1.13	TRASLADO DE POSTES DE ENERGIA Y TELEFONOS (INCLUYE TRAMITES Y TRABAJO HASTA PUESTA EN SERVICIO DEL PORTE)	UN				0	0	0	\$	2.002.929	\$ -
2	<b>RELLENOS Y BASES</b>										
2.2	RELLENO EN RAJON DE ARENOSA. COLOCACION MANUAL (INCLUYE SELLO EN RECEBO COMUN DE 0,10M. SUMINISTRO Y EXTENDIDA)	M3	183,32	216,39	59,44	67,88	44,93	571,86	\$	73.853	\$ 42.240.961,88
2.3	SBG - C SUMINISTRO Y COMPACTACION MECANICA	M3			33,68	36,56	0	70,24	\$	106.852	\$ 7.505.284,48
2.4	SBG - C SUMINISTRO, Y COMPACTACION MANUAL	M3	110,92	111,91	28,31	33,36	28,82	313,32	\$	111.852	\$ 35.045.468,64
2.5	SBG - B SUMINISTRO Y COMPACTACION MECANICA	M3				0	0	0	\$	108.270	\$ -
2.9	GEOTEXTIL T- 2400 O SIMILAR	M2	450,31	436,1	151,73	163,78	143,68	1346,6	\$	7.638	\$ 10.277.692,80
2.10	SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	282,69	289,2	64,38	58,9	95,98	791,15	\$	47.128	\$ 37.285.317,20
3	<b>CONCRETOS Y MORTEROS</b>										
3.2	CONCRETO DE 3000PSI FUNDIDO EN SITIO PARA FRANJA DE CONFINAMIENTO ANCHO 10 A 20CM POR ALTURA DE 0,20MT	ML	186,3	174,3	45,36	41,35	48,24	495,65	\$	18.834	\$ 9.333.188,70
3.4	CONCRETO DE 3000PSI FUNDIDO EN SITIO PARA RAMPAS DE ACCESO E=0,10MT (INCLUYE MALLA DE REFUERZO Y FORMALETA)	M2	70,01	27,7	0,96	6	5,4	110,07	\$	55.618	\$ 6.121.873,26
3.6	CONCRETO DE 3000PSI PARA VIGAS DE ESCALERAS CON MAS DE DOS ESCALONES SECCION DE 0,47 X 0,3MT (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	19,42	4,3	0	7,4	0	31,12	\$	143.526	\$ 4.466.529,12
3.7	CONCRETO DE 3000PSI PARA VIGAS DE ESCALERAS CON HASTA DOS ESCALONES SECCION DE 0,47 X 0,3MT (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	3,4			0	0	3,4	\$	125.940	\$ 428.196,00
3.8	CONCRETO DE 3000PSI PARA ESCALONES DE ESCALERAS SEGUN DISEÑO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	ML	27,65	13,6	29,95	8,82	80,02	\$	111.170	\$ 8.895.823,40
4	<b>MAMPOSTERIA Y MUROS DE CONTENCIÓN</b>										
4.3	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 1 EN MAMPOSTERIA H=1,0 MT INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ZARPA DE CIVENTACION Y FORMALETA	ML		15,8		0	3	18,8	\$	349.579	\$ 6.572.085,20
4.4	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 2 EN MAMPOSTERIA H=1,8 MT INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ZARPA DE CIVENTACION Y FORMALETA	ML	92,7	101,8	33,4	3,2	8,5	239,4	\$	561.187	\$ 134.348.167,80
4.5	MURO DE CONTENCIÓN TIPO 3 EN MAMPOSTERIA H=2,15 MT INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ZARPA DE CIVENTACION Y FORMALETA	ML	27,38	0	2,08	0	0	29,46	\$	811.095	\$ 23.894.858,70
4.12	FILTRO PERIMETRAL DE 0,3 X 0,3 SEGUN DISEÑO INCLUYE GEOTEXTIL, GRAVA, TUBERIA Y EXCAVACION	ML	101,82	114	39,2	36,2	11,5	302,72	\$	31.662	\$ 9.584.720,64
5	<b>ADOQUINES Y PREFABRICADOS</b>										
5.1	ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2				0	0	0	\$	49.542	\$ -
5.2	ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM COLOR AMARILLO (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2				0	0	0	\$	59.027	\$ -
5.4	ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM COLOR TERRACOTA (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2				0	0	0	\$	58.586	\$ -
5.6	ADOQUIN DE ARCILLA 20 X 10 X 6 CM (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO) COLOR TERRACOTA	M2	205,06	184,37	67,34	73,27	56,03	696,07	\$	61.030	\$ 36.378.152,10
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO TACTIL (0,40X0,40X0,08) - ALERTA A-55 GUIA A-56	ML		16,3	1,05	6,75	6,5	30,6	\$	27.544	\$ 842.846,40
5.8	BORDILLO PREFABRICADO A-50 SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE EMBOQUILLADO	ML	93,72	112,65	52	70,1	41	369,47	\$	44.559	\$ 16.463.213,73
5.9	ADOQUIN DE CONCRETO 20 X 10 X 8 CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE 6CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2				0	0	0	\$	73.052	\$ -
5.10	ADOQUIN DE CONCRETO 20 X 10 X 8 CM COLOR AMARILLO (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE 6CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2				0	0	0	\$	79.729	\$ -
5.12	ADOQUIN DE CONCRETO 20 X 10 X 8 CM COLOR TERRACOTA (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE 6CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2				0	0	0	\$	62.739	\$ -

87

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO</div>		ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA								<div>Código: 2018-03-FI-17</div> <div>Versión: 1    Pág: 1 de 3</div> <div>Vigente desde: 15/09/2011</div>			
5.15	BOLARDO CIRCULAR PREFABRICADO 1DU MRO ABUSARDADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN					0	0	0	\$	118.416	\$	-
6	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS												
6.2	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE, H=0.5M. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES)	UN	1	4	2	2	2	11	\$	348.658	\$	3.835.238,00	
6.3	POZO DE INSPECCION SEGÚN NORMA EAAB - H=2.0M - PAÑETADO POR DENTRO Y FUERA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PLACA DE FONDO, CARGUE, PASOS)	UN	2	1		0	0	3	\$	4.325.594	\$	12.976.782,00	
6.5	TUBERÍA NOVAFORT D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO EN GRAVILLA DE 1/2 Y RECEBO SEGÚN NORMA EAB)	ML	105,09	28,55		11	5,2	147,84	\$	53.751	\$	7.946.547,84	
6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO DE 1/2" SEGÚN NORMA EAB 024 (INCLUYE REGISTRO Y ACCESORIOS)	UN	27	29	4	5	5	70	\$	79.581	\$	5.570.670,00	
6.10	DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCIÓN EXISTENTE - INCLUYE TRASIEGOS, CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES	UN	28	29	3	5	3	66	\$	32.966	\$	2.175.756,00	
6.11	CAJA DE INSPECCION DE 0.8 X 0.8 ALTURA DE 1,2MT (INCLUYE CAÑUELA, TAPA EN CONCRETO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO POR AMBAS CARAS)	UN	26	29	3	5	3	66	\$	451.528	\$	29.800.848,00	
6.13	LIMPIEZA DE POZOS MANUAL (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	1	3		0	1	5	\$	47.860	\$	239.300,00	
6.14	LIMPIEZA DE SUMIDROS MANUAL (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	1		1	0	0	2	\$	50.460	\$	100.920,00	
6.15	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDONEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA	ML		48,1	28,6	57,9	58,4	191	\$	14.338	\$	2.738.558,00	
6.16	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 600M. INCLUYE DESINFECTACIÓN DE TUBERÍA Y ANCLAJE PUNTUAL NE-002 V.6.1	UN				0	0	0	\$	987.898	\$	-	
6.17	INSPECCION DE REDES CON EQUIPO ROBOTICO CCTV DE 6" A 24" SEGÚN NORMA EAAB HS-058 V. 3.2	ML		48,1	28,6	57,9	58,4	191	\$	12.168	\$	2.324.088,00	
6.18	CARGUE PARA POZO D=1,7 INCLUYE TAPA PLASTICA NO RECICLABLE SEGÚN NORMA EAAB	UN	2	1		0	0	3	\$	1.810.742	\$	5.432.226,00	
6.20	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE MORTERO DE NIVELACION Y EMBOQUILLADO	UN		8,9	12	0	0	20,9	\$	55.078	\$	1.151.130,20	
6.23	SUMIDERO SEGÚN DISEÑO (H=1,3 ANCHO 0,72M LARGO 1,17MT INCLUYE REJILLA DE 0,5 X 0,8 MT, REFUERZO Y FORMALETA)	UN	4	3	1	1	1	10	\$	1.444.992	\$	14.449.920,00	
6.24	ENTRADO EN MADERA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PUNTALES DE 2 X 4 CM CADA 0,20 CM Y CODALES DE 0,03 X 0,03 CADA 1,2 Y LARGUEROS DE 0,10 X 0,20 CADA 1,6)	ML	60			0	0	60	\$	42.256	\$	2.535.360,00	
6.25	TUBERÍA DE 3" RED PRESIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ACCESORIOS	ML				0	0	0	\$	12.666	\$	-	
6.26	CAJILLA PARA CONTADOR DE ACUEDUCTO (CAJILLA PLASTICA SEGÚN NORMA EAAB)	UN	27	29	1	4	0	61	\$	169.334	\$	10.329.374,00	
6.27	RED DE 4" PVC RDE 21 SUMINISTRO E INSTALACION	ML				0	0	0	\$	48.392	\$	-	
6.29	TEE DE 4" RDE 21 SUMINISTRO E INSTALACION	UN				0	0	0	\$	286.299	\$	-	
6.30	UNION 4" RDE 21 SUMINISTRO E INSTALACION	UN				0	0	0	\$	72.474	\$	-	
6.32	REDUCCION DE 4" A 3" RDE-21 SUMINISTRO E INSTALACION	UN				0	0	0	\$	133.412	\$	-	
6.34	CODO DE 45GRADOS DE 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN				0	0	0	\$	212.236	\$	-	
6.35	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO, EN ACERO INOXIDABLE CON PRESION DE TRABAJO 230PSI D=4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN				0	0	0	\$	571.770	\$	-	
6.37	TUBERIA DE CONCRETO EXTRAREFORZADO DE 10" INCLUYE GRAVA DE 1/2" Y RELLENO SEGÚN NORMA EAB.	ML				0	0	0	\$	215.385	\$	-	

<div>  <div> <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA</b> </div> <div> Código 208-M2-P-17  Versión: 1      Pág. 1 de 3  Vigente desde: 18/09/2011 </div> </div>												
6.39	TUBERIA DE CONCRETO S/UPLE DE 12" INCLUYE GRAVA DE 1/2" Y RELLENO SEGUN NORMA EAB.	ML				0	0	0	\$	84.272	\$ -	
6.41	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA DE CONTROL D=4" Y 3" SEGUN NORMA EAB-027, INCLUYE TAPA PLASTICA SIN CAJILLA ALURA H= 1MT	UN		1		0	0	1	\$	463.453	\$ 463.453,00	
6.42	ANCLAJES EN CONCRETO PARA UNIONES DE 3' 4" SEGUN DISEÑO HIDRAULICO	UN				0	0	0	\$	80.269	\$ -	
7	<b>SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO</b>											
7.2	BARANDA METALICA M-31 PREFABRICADA (INCLUYE INSTALACION, DADOS DE CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN DE 0 20 X 0 20 X 0 40 MTS Y PINTURA) SUMINISTRO E INSTALACION	ML	124,7	107,08	32,52	3,25	12,35	279,87	\$	227.420	\$ 63.648.035,40	
7.3	SEÑAL TRANSITO VERTICAL - ESPECIFICACION SDM - GRUPO 1 (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN				0	0	0	\$	353.772	\$ -	
8	<b>PRECIOS NO PREVISTOS</b>											
NP-1	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PERA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3				0	0	0	\$	110.301	\$ -	
NP-2	TUBERIA PVC U.M EXT CORRUGADO ANT LISO U.M NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye suministro e instalación)	ML	102	45		0	0	147	\$	77.124	\$ 11.337.228,00	
NP-3	TUBERIA PVC U.M EXT CORRUGADO ANT LISO U.M NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e instalación)	ML	9,45	10,2	3,4	2,8	2	27,85	\$	46.386	\$ 1.291.850,10	
NP-4	CONCRETO 1600 PSI (Hecho en Obra 1:3:6 con arena y grava de río)	M3	6,49	11,36	3,83	1,67	1,1	24,45	\$	248.895	\$ 6.085.482,75	
NP-5	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibracompactor)	M3	56,23	52,73	21,28	22,72	23,14	176,1	\$	117.371	\$ 20.669.033,10	
NP-6	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 60-100 (cemento asfáltico 60-100) (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibracompactor y compactador de llantas)	M3	38,77	40,58	14,44	15,55	14,57	123,91	\$	542.922	\$ 67.273.465,02	
NP-7	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2				0	0	0	\$	1.845	\$ -	
NP-8	IVPR-VACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	323,09	334,04	120,36	129,59	121,37	1028,45	\$	2.040	\$ 2.098.038,00	
										<b>SUBTOTAL</b>	\$	803.020.030,19
										<b>IVA 19%</b>	\$	240.806.009,06
										<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA</b>	\$	1.043.826.039,00
										<b>VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS</b>	\$	-
										<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES</b>	\$	1.043.826.039,00
<b>ITEMS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>							<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
1	Componente Gestion SOCIAL	GI	1							\$	28.070.000,00	
2	Componente Gestion SISOMA	GI	1							\$	18.120.000,00	
										<b>VALOR TOTAL EJECUTADO, OBRA SOCIAL Y SISOMA</b>	\$	1.089.118.039,00
<b>RELACION DE GARANTIAS DEL CONTRATO:</b>												
<b>RELACION DE ACCIONES LEGALES EN PROCESO</b>												
<b>CLASE</b>	<b>ETAPA PROCESAL</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESPACHO</b>	<b>Nº DE EXPEDIENTE</b>								
N.A	N.A	N.A										
<b>RELACION DE SANCIONES REALIZADAS AL CONTRATO:</b>												
<b>SANCIONES</b>												
<b>RESOLUCION No.</b>	<b>OBJETO</b>	<b>FECHA</b>										
N.A	N.A											



# ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

Código 208-MS-PH-17  
Versión: 1 Pág. 1 de 3  
Vigente desde: 15/09/2011

## RELACION DE GARANTÍAS DEL CONTRATO

Garantías	Nombre Asegurador	No. Póliza	Vigencia		No de Certificado Modificador	Valor Asegurado
			Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento		
Buen Manejo de Anticipo	Seguros del Estado	11-44-101114392	14/02/2018	14/03/2020	ANEXO 4	\$ 325.664.113,50
Salarios y Prestaciones Sociales	Seguros del Estado	11-44-101114392	14/02/2018	15/09/2018	ANEXO 4	\$ 325.664.113,50
Calidad del Servicio	Seguros del Estado	11-44-101114392	14/02/2018	15/09/2021	ANEXO 4	\$ 162.832.058,00
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado	11-44-101114392	5 AÑOS		ANEXO 4	\$ 542.773.622,50
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros del Estado	11-44-101026127	14/02/2018	15/09/2018	ANEXO 4	\$ 156.248.400,00
VALOR TOTAL ASEGURADO						\$ 1.513.182.205,50

## CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.





## PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO


Valor total concedido: \$293.121.180,00  
Valor total amortizado: \$293.121.180,00

## RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

CORTE DE OBRA N°	PERIODO	VALOR COSTO DIRECTO	VALOR IRI	VALOR TOTAL	VRNA	VR TOTAL	VALOR AMORTIZADO	VALOR NETO
1	DEL 14/02/2018 AL 31/03/2018	\$ 4.028.532,00	\$ 1.207.960,00	\$ 5.234.492,00		\$ 5.234.492,00	\$ 1.570.348,00	\$ 3.664.144
2	DEL 1/04/2018 AL 30/04/2018	\$ 40.250.329,00	\$ 12.075.099,00	\$ 52.325.428,00		\$ 62.361.190,00	\$ 18.708.357,00	\$ 43.652.833
3	DEL 1/05/2018 AL 31/05/2018	\$ 88.943.853,00	\$ 26.683.156,00	\$ 115.627.009,00		\$ 120.739.438,00	\$ 38.221.831,00	\$ 84.517.607
4	DEL 1/06/2018 AL 30/06/2018	\$ 240.451.777,00	\$ 72.135.533,00	\$ 312.587.310,00		\$ 319.048.071,00	\$ 95.714.421,00	\$ 223.333.650
5	DEL 1/07/2018 AL 31/07/2018	\$ 208.755.905,00	\$ 62.626.771,00	\$ 271.382.676,00		\$ 278.745.729,00	\$ 83.623.719,00	\$ 195.122.010
6	DEL 1/08/2018 AL 13/09/2018	\$ 220.591.633,00	\$ 68.177.490,00	\$ 288.769.123,00		\$ 190.475.514,00	\$ 57.282.504,00	\$ 133.193.010
Final						\$ 108.511.605,00		
TOTALES		\$ 803.020.029,00	\$ 240.906.009,00	\$ 1.043.926.038,00		\$ 1.085.116.039,00	\$ 293.121.180	\$ 693.483.254



 <b>ALCALDIA MAYOR</b> <b>DE BARRIOS</b> <b>CIUDAD DE BOGOTÁ</b>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA</b>			Código 208-MB-P-17 Versión: 1      Pág. 1 de 3 Vigente desde: 15/09/2011
	<b>RECIBO DE DOCUMENTOS</b>			
	N/A			
<b>CLASE DE DOCUMENTO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>NUMERO DE COPIAS</b>	
N/A	N/A	N/A	N/A	
<p>La liquidación del contrato no releva al Interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.</p> <p>Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaran fallas imputables a mala calidad de la obra, la Cija de la Vivienda Popular deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.</p> <p>Para constancia de lo anterior, firman la presente esta los que en ella intervinieron a los <u>29</u> Veintinueve <u>de</u> días del mes de <u>Noviembre</u> de <u>2018</u>.</p>				
Firma  Nombre: Beisario Alfredo de Leon Narvaez Representante legal Contratista		Firma  Nombre: Efraim Jose Castillo Claveux Representante legal Interventoria Consorcio JS		
Firma  Nombre: Karol Supervisor del Contrato Director Mejoramiento de Barrios C.V.P				

 <b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARIA DEL HABITAT</b> <b>CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR</b> <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA</b>		<b>CVP-DMB-RDO-001</b>	
<b>VERSIÓN</b>		<b>1</b>	
<b>PÁGINA</b>		<b>1</b>	<b>DE 3</b>
<b>FECHA</b>		<b>20</b>	<b>11</b>
<b>2018</b>			


  

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS C.V.P
CONTRATO DE OBRA No:	000 DE 2017
OBJETO DEL CONTRATO.	EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO. GRUPO 2.

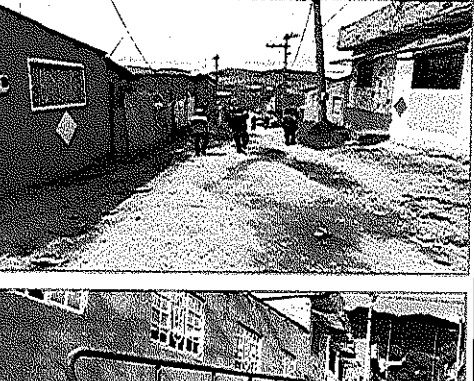
  

ANEXO FOTOGRAFICO	
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS SECTOR USME	
ESTADO DE LAS OBRAS RECIBIDAS	

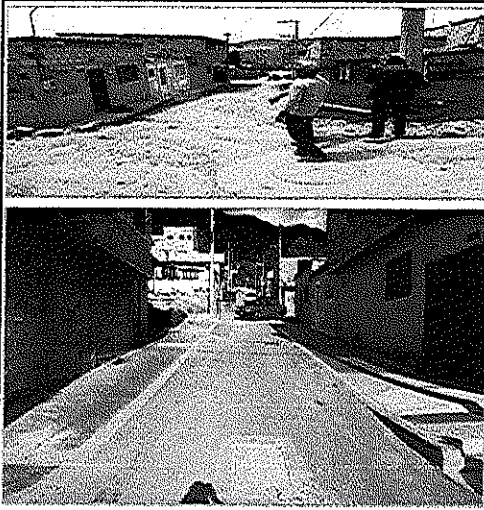
  

FOTOGRAFIA No 1.					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">LOCALIZACIÓN:</td> <td>VILLA DIANA - CIV 5004725 CARRERA 12 D ESTE ENTRE CALLE 89 Y 89A SUR</td> </tr> <tr> <td>DESCRIPCIÓN:</td> <td>Via en Asfalto y Andenes en adoquín de arcilla</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Excavación mecánica para la estructura de la vía</li> <li>- Estabilización de fallos encontrados en la subrasante</li> <li>- Excavación manual para la construcción de la nueva red de alcantarillado pluvial en tubería 12" novofort.</li> <li>- Renovación de acometidas de aguas residuales por tipo de material (gres), cambio de diámetro (menor a 6") o deterioro de la existente.</li> <li>- Construcción de 1 pozo (intermedio) como estructura de inspección de la nueva red de alcantarillado pluvial.</li> <li>- Rellenos para tubería de alcantarillado pluvial, cama de 10cm en mixto y relleno restante en subbase granular B-200.</li> <li>- Mejoramiento de la subrasante con rajón de 30cm mas sello en B-200 de 10cm, para la estructura vial.</li> <li>- Instalación de geotextil T-2400</li> <li>- Relleno de 15cm de base granular tipo A para la conformación de la estructura vial.</li> <li>- Instalación de bordillo A-80 para el confinamiento de la vía.</li> <li>- Imprimación con emulsión asfáltica.</li> <li>- Instalación de carpeta asfáltica de rodadura MD-12 de 12cm.</li> <li>- Construcción de 3 sumideros especiales (1 al inicio, 1 intermedio y 1 al final de tramo), según diseños hidráulicos con el fin de drenar la escorrentía del CIV.</li> <li>- Demoliciones de andenes.</li> <li>- Construcción de muros de contención tipo 1, 2 y 3 los cuales incluyeron: excavación manual, instalación de solado de limpieza de 5cm, construcción de zapas en concreto de 3000 psi, instalación de mampostería estructural, pañete interno para los muros, construcción de viga cinta en concreto de 3000 psi e instalación de filtro perimetral con tubería perforada PVC 3".</li> <li>- Excavación manual para la estructura de los andenes</li> <li>- Relleno en subbase granular tipo B-200 para terrazas conformadas por los muros de contención.</li> <li>- Demolición y construcción de cajas de aguas residuales bajo normas de la EAB.</li> <li>- Relleno en subbase granular tipo C de 30cm para la estructura de los andenes.</li> <li>- Instalación de adoquín de arcilla asentado sobre arena-cemento.</li> <li>- Instalación de marcos y tapas para cajas de aguas residuales, cajillas para medidores de agua potable.</li> <li>- Construcción de cintas de ajuste y franjas de confinamiento.</li> <li>- Construcción de escaleras y rampas de acceso vehicular en concreto de 3000psi.</li> <li>- Instalación de barandas M-51.</li> </ul>	LOCALIZACIÓN:	VILLA DIANA - CIV 5004725 CARRERA 12 D ESTE ENTRE CALLE 89 Y 89A SUR	DESCRIPCIÓN:	Via en Asfalto y Andenes en adoquín de arcilla
LOCALIZACIÓN:	VILLA DIANA - CIV 5004725 CARRERA 12 D ESTE ENTRE CALLE 89 Y 89A SUR				
DESCRIPCIÓN:	Via en Asfalto y Andenes en adoquín de arcilla				

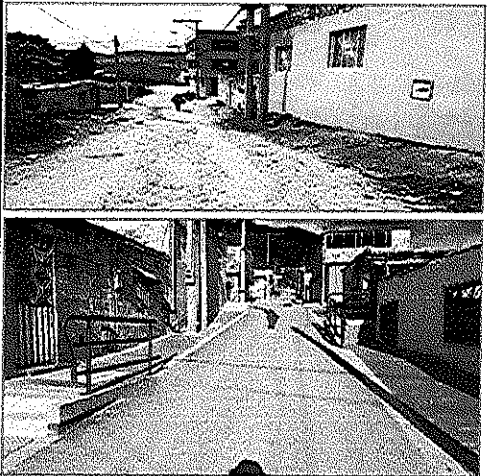
FOTOGRAFIA No 2.					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">LOCALIZACIÓN:</td> <td>VILLA DIANA - CIV 5004703 CALLE 89A SUR ENTRE CARRERA 12G ESTE Y CARRERA 12 H ESTE</td> </tr> <tr> <td>DESCRIPCIÓN:</td> <td>Via en Asfalto y Andenes en adoquín de arcilla</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Excavación mecánica para la estructura de la vía</li> <li>- Estabilización de fallos encontrados en la subrasante</li> <li>- Renovación de acometidas de aguas residuales por tipo de material (gres), cambio de diámetro (menor a 6") o deterioro de la existente.</li> <li>- Mejoramiento de la subrasante con rajón de 40cm mas sello en B-200 de 10cm, para la estructura vial.</li> <li>- Instalación de geotextil T-2400</li> <li>- Relleno en subbase granular tipo B para la conformación de la estructura vial.</li> <li>- Relleno de 15cm de base granular tipo A para la conformación de la estructura vial.</li> <li>- Instalación de bordillo A-80 para el confinamiento de la vía.</li> <li>- Imprimación con emulsión asfáltica.</li> <li>- Instalación de carpeta asfáltica de rodadura MD-12 de 12cm.</li> <li>- Construcción de 1 sumidero especial (al final de tramo), según diseños hidráulicos con el fin de drenar la escorrentía del CIV.</li> <li>- Demoliciones de andenes.</li> <li>- Construcción de muros de contención tipo 1 y 2 los cuales incluyeron: excavación manual, instalación de solado de limpieza de 5cm, construcción de zapas en concreto de 3000 psi, instalación de mampostería estructural, pañete interno para los muros, construcción de viga cinta en concreto de 3000 psi e instalación de filtro perimetral con tubería perforada PVC 3".</li> <li>- Excavación manual para la estructura de los andenes</li> <li>- Relleno en subbase granular tipo B-200 para terrazas conformadas por los muros de contención.</li> <li>- Demolición y construcción de cajas de aguas residuales bajo normas de la EAB.</li> <li>- Relleno en subbase granular tipo C de 30cm para la estructura de los andenes.</li> <li>- Instalación de adoquín de arcilla asentado sobre arena-cemento.</li> <li>- Instalación de marcos y tapas para cajas de aguas residuales, cajillas para medidores de agua potable.</li> <li>- Construcción de cintas de ajuste y franjas de confinamiento.</li> <li>- Construcción de escaleras y rampas de acceso vehicular en concreto de 3000psi.</li> <li>- Instalación de barandas M-51.</li> </ul>	LOCALIZACIÓN:	VILLA DIANA - CIV 5004703 CALLE 89A SUR ENTRE CARRERA 12G ESTE Y CARRERA 12 H ESTE	DESCRIPCIÓN:	Via en Asfalto y Andenes en adoquín de arcilla
LOCALIZACIÓN:	VILLA DIANA - CIV 5004703 CALLE 89A SUR ENTRE CARRERA 12G ESTE Y CARRERA 12 H ESTE				
DESCRIPCIÓN:	Via en Asfalto y Andenes en adoquín de arcilla				

FOTOGRAFIA No 3.



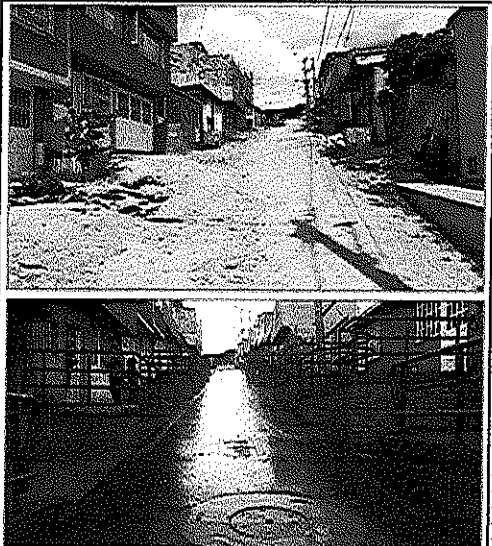
LOCALIZACION:	VILLA DIANA - CIV 5004713 CALLE 89A SUR ENTRE CARRERA 12G ESTE Y CARRERA 12 F ESTE
DESCRIPCION:	Via en Asfalto y Andenes en adoquin de arcilla
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estabilización de fallas encontradas en la subrasante</li> <li>- Renovación de acometidas de aguas residuales por tipo de material (gres), cambio de diámetro (menor a 6") o deterioro de la existente.</li> <li>- Mejoramiento de la subrasante con rajón de 40cm mas sello en B-200 de 10cm, para la estructura vial.</li> <li>- Instalación de filtro lateral en toda la longitud del tramo vial</li> <li>- Instalación de geotextil T-2400</li> <li>- Relleno de 30cm de subbase granular tipo B para la conformación de la estructura vial.</li> <li>- Relleno de 15cm de base granular tipo A para la conformación de la estructura vial.</li> <li>- Instalación de bordillo A-80 para el confinamiento de la vía.</li> <li>- Imprimación con emulsión asfáltica.</li> <li>- Instalación de carpeta asfáltica de rodadura MD-12 de 12cm.</li> <li>- Construcción de 1 sumidero especial (al final de tramo), según diseños hidráulicos con el fin de drenar la escorrentía del CIV.</li> <li>- Demoliciones de andenes.</li> <li>- Construcción de muros de contención tipo 1 y 2 los cuales incluyeron: excavación manual, instalación de solado de limpieza de 5cm, construcción de zarpas en concreto de 3000 psi, instalación de mampostería estructural, pañete interno para los muros, construcción de viga cinta en concreto de 3000 psi e instalación de filtro perimetral con tubería perforada PVC 3".</li> <li>- Excavación manual para la estructura de los andenes</li> <li>- Relleno en subbase granular tipo B-200 para terrazas conformadas por los muros de contención.</li> <li>- Demolición y construcción de cajas de aguas residuales bajo normas de la EAB.</li> <li>- Relleno en subbase granular tipo C de 30cm para la estructura de los andenes.</li> <li>- Instalación de adoquin de arcilla asentado sobre arena-cemento.</li> <li>- Instalación de marcos y tapas para cajas de aguas residuales, cajillas para medidores de agua potable.</li> <li>- Construcción de cintas de ajuste y franjas de confinamiento.</li> <li>- Construcción de escaleras y rampas de acceso vehicular en concreto de 3000psi.</li> <li>- Instalación de barandas M-81.</li> </ul>	

FOTOGRAFIA No 4.



LOCALIZACION:	VILLA DIANA - CIV 5004724 CALLE 89A SUR ENTRE CARRERA 12F ESTE Y CARRERA 12 D ESTE
DESCRIPCION:	Via en Asfalto y Andenes en adoquin de arcilla
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Excavación mecánica para la estructura de la vía</li> <li>- Estabilización de fallas encontradas en la subrasante</li> <li>- Renovación de acometidas de aguas residuales por tipo de material (gres), cambio de diámetro (menor a 6") o deterioro de la existente.</li> <li>- Mejoramiento de la subrasante con rajón de 30cm mas sello en B-200 de 10cm, para la estructura vial.</li> <li>- Instalación de geotextil T-2400</li> <li>- Relleno de 15cm de base granular tipo A para la conformación de la estructura vial.</li> <li>- Instalación de bordillo A-80 para el confinamiento de la vía.</li> <li>- Imprimación con emulsión asfáltica.</li> <li>- Instalación de carpeta asfáltica de rodadura MD-12 de 12cm.</li> <li>- Construcción de 1 sumidero especial (al final de tramo), según diseños hidráulicos con el fin de drenar la escorrentía del CIV.</li> <li>- Demoliciones de andenes.</li> <li>- Construcción de muros de contención tipo 1 y 2 los cuales incluyeron: excavación manual, instalación de solado de limpieza de 5cm, construcción de zarpas en concreto de 3000 psi, instalación de mampostería estructural, pañete interno para los muros, construcción de viga cinta en concreto de 3000 psi e instalación de filtro perimetral con tubería perforada PVC 3".</li> <li>- Excavación manual para la estructura de los andenes</li> <li>- Relleno en subbase granular tipo B-200 para terrazas conformadas por los muros de contención.</li> <li>- Demolición y construcción de cajas de aguas residuales bajo normas de la EAB.</li> <li>- Relleno en subbase granular tipo C de 30cm para la estructura de los andenes.</li> <li>- Instalación de adoquin de arcilla asentado sobre arena-cemento.</li> <li>- Instalación de marcos y tapas para cajas de aguas residuales, cajillas para medidores de agua potable.</li> <li>- Construcción de cintas de ajuste y franjas de confinamiento.</li> <li>- Construcción de escaleras y rampas de acceso vehicular en concreto de 3000psi.</li> <li>- Instalación de barandas M-81.</li> </ul>	

FOTOGRAFIA No 5.



LOCALIZACION:	PUERTA AL LLANO - CIV 30001896 CARRERA 80 ENTRE CALLE 106 S Y CALLE 100 SUR
DESCRIPCION:	Via en Asfalto y Andenes en adoquin de arcilla
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Excavación mecánica para la estructura de la vía</li> <li>- Estabilización de fallas encontradas en la subrasante</li> <li>- Excavación manual para localización, retiro, demolición y remplazo de tubería de alcantarillado pluvial de 8" en concreto a 12" en novafort, en toda la longitud del segmento vial.</li> <li>- Renovación de acometidas de aguas residuales por tipo de material (gres), cambio de diámetro (menor a 6") o deterioro de la existente.</li> <li>- Construcción de 2 pozos (inicial e intermedio) como estructuras de inspección de la renovada red de alcantarillado pluvial.</li> <li>- Rellenos para tubería de alcantarillado pluvial, cama de 10cm en máx y relleno restante en subbase granular B-200.</li> <li>- Mejoramiento de la subrasante con rajón de 30cm mas sello en B-200 de 10cm, para la estructura vial.</li> <li>- Relleno de 15cm de base granular tipo A para la conformación de la estructura vial.</li> <li>- Instalación de bordillo A-80 y sardinel A-10 para el confinamiento de la vía.</li> <li>- Imprimación con emulsión asfáltica.</li> <li>- Instalación de carpeta asfáltica de rodadura MD-12 de 12cm.</li> <li>- Construcción de 4 sumideros especiales (2 transversales al inicio, 1 intermedio y 1 al final de tramo), según diseños hidráulicos con el fin de drenar la escorrentía del CIV.</li> <li>- Demoliciones de andenes.</li> <li>- Construcción de muros de contención tipo 1, 2 y 3 los cuales incluyeron: excavación manual, instalación de solado de limpieza de 5cm, construcción de zarpas en concreto de 3000 psi, instalación de mampostería estructural, pañete interno para los muros, construcción de viga cinta en concreto de 3000 psi e instalación de filtro perimetral con tubería perforada PVC 3".</li> <li>- Excavación manual para la estructura de los andenes</li> <li>- Relleno en subbase granular tipo B-200 para terrazas conformadas por los muros de contención</li> <li>- Demolición y construcción de cajas de aguas residuales bajo normas de la EAB.</li> <li>- Relleno en subbase granular tipo C de 30cm para la estructura de los andenes.</li> <li>- Instalación de adoquin de arcilla asentado sobre arena-cemento.</li> <li>- Instalación de marcos y tapas para cajas de aguas residuales, cajillas para medidores de agua potable.</li> <li>- Construcción de cintas de ajuste y franjas de confinamiento.</li> <li>- Construcción de escaleras y rampas de acceso vehicular en concreto de 3000psi.</li> <li>- Instalación de barandas M-81.</li> </ul>	

## OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 29 días del mes de NOVIEMBRE de 2018

BELISARIO ALFREDO DE LEON NARVAEZ


CONTRATISTA

Matrícula Profesional No. No. 25204-29792 CND

ERICK JOSE CASTILLO GORIEUX

R.L. INTERVENTORIA CONSORCIO JS

Matrícula Profesional No. A25041997-7562223

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA</b>	Código 20M-MUP-17 Versión: 1      Pág. 1 de 3 Vigente desde: 10/09/2011																																																																
DEPENDENCIA: <u>DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS</u>		FECHA: <u>05</u> <u>11</u> <u>2018</u>																																																																
CONTRATO DE OBRA No: <u>700</u> DE <u>2017</u>																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO: <u>"EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO"</u>																																																																		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ <u>783.450.837,00</u>	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: <u>14</u> DE <u>FEBRERO</u> DE <u>2018</u> PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: <u>Sete (7) Meses</u> FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: <u>13</u> DE <u>SEPTIEMBRE</u> DE <u>2018</u>																																																																	
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VIAL BOGOTÁ</u> INTERVENTOR: <u>CONSORCIO JS</u>																																																																		
<b>CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:</b>																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. MODIFICACIÓN</th> <th>TIPO MODIFICACIÓN</th> <th>PLAZO</th> <th>VALOR CONTRATO CON IVA</th> <th>VALOR ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No.0</td> <td>INICIAL</td> <td>SE(SI) MESES</td> <td>\$ 643.410.880,00</td> <td>\$ 643.410.880,00</td> </tr> <tr> <td>No.1</td> <td>Adición y prórroga</td> <td>Un (1) mes</td> <td>\$ 140.048.757,00</td> <td>\$ 783.450.837,00</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			No. MODIFICACIÓN	TIPO MODIFICACIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO	No.0	INICIAL	SE(SI) MESES	\$ 643.410.880,00	\$ 643.410.880,00	No.1	Adición y prórroga	Un (1) mes	\$ 140.048.757,00	\$ 783.450.837,00																																																	
No. MODIFICACIÓN	TIPO MODIFICACIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO																																																														
No.0	INICIAL	SE(SI) MESES	\$ 643.410.880,00	\$ 643.410.880,00																																																														
No.1	Adición y prórroga	Un (1) mes	\$ 140.048.757,00	\$ 783.450.837,00																																																														
<b>SUSPENSIÓN(S), AMPLIACIÓN(S) DE SUSPENSIÓN (AS) Y REANUDACIÓN (S):</b>																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ACTA No.</th> <th colspan="2">TIPO DE ACTA</th> <th rowspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">PERÍODO</th> <th rowspan="2">DURACIÓN</th> <th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th> <th rowspan="2">DURACIÓN</th> <th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th> </tr> <tr> <th>S</th> <th>AS</th> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td></td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>			ACTA No.	TIPO DE ACTA		FECHA	PERÍODO		DURACIÓN	FECHA REANUDACIÓN	DURACIÓN	FECHA REANUDACIÓN	S	AS	DESDE	HASTA	1	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.					2										3										4										TOTAL									
ACTA No.	TIPO DE ACTA			FECHA	PERÍODO		DURACIÓN	FECHA REANUDACIÓN					DURACIÓN	FECHA REANUDACIÓN																																																				
	S	AS	DESDE		HASTA																																																													
1	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.																																																													
2																																																																		
3																																																																		
4																																																																		
TOTAL																																																																		
<b>DISPONIBILIDAD Y RESERVAS PRESUPUESTALES:</b> Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan los datos introducidos y los ajustes causados son los siguientes:																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Disponibilidades Presupuestales</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>FECHA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>RUBRO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1431</td> <td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td> <td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td> <td></td> <td>\$ 643.410.880,00</td> </tr> <tr> <td>1031</td> <td>208-01-3-3-1-15-02-14-0208-14</td> <td>208-01-3-3-1-15-02-14-0208-14</td> <td></td> <td>\$ 140.048.757,00</td> </tr> </tbody> </table>			Disponibilidades Presupuestales					No.	FECHA	CÓDIGO	RUBRO	VALOR	1431	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134		\$ 643.410.880,00	1031	208-01-3-3-1-15-02-14-0208-14	208-01-3-3-1-15-02-14-0208-14		\$ 140.048.757,00																																												
Disponibilidades Presupuestales																																																																		
No.	FECHA	CÓDIGO	RUBRO	VALOR																																																														
1431	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134		\$ 643.410.880,00																																																														
1031	208-01-3-3-1-15-02-14-0208-14	208-01-3-3-1-15-02-14-0208-14		\$ 140.048.757,00																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Reservas Presupuestales</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>FECHA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>RUBRO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4108</td> <td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td> <td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td> <td></td> <td>\$ 643.410.880,00</td> </tr> <tr> <td>2825</td> <td>208-01-3-3-1-15-02-14-0208-14</td> <td>208-01-3-3-1-15-02-14-0208-14</td> <td></td> <td>\$ 140.048.757,00</td> </tr> </tbody> </table>			Reservas Presupuestales					No.	FECHA	CÓDIGO	RUBRO	VALOR	4108	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134		\$ 643.410.880,00	2825	208-01-3-3-1-15-02-14-0208-14	208-01-3-3-1-15-02-14-0208-14		\$ 140.048.757,00																																												
Reservas Presupuestales																																																																		
No.	FECHA	CÓDIGO	RUBRO	VALOR																																																														
4108	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134		\$ 643.410.880,00																																																														
2825	208-01-3-3-1-15-02-14-0208-14	208-01-3-3-1-15-02-14-0208-14		\$ 140.048.757,00																																																														
<b>ORDENES DE PAGO:</b> <input type="checkbox"/> Valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>FECHA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>RUBRO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>17120</td><td>22/09/2018</td><td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td><td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td><td>\$ 193.022.254</td></tr> <tr><td>17747</td><td>18/07/2018</td><td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td><td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td><td>\$ 55.348.734</td></tr> <tr><td>17749</td><td>26/07/2018</td><td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td><td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td><td>\$ 60.308.532</td></tr> <tr><td>17747</td><td>29/07/2018</td><td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td><td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td><td>\$ 80.308.532</td></tr> <tr><td>17892</td><td>27/08/2018</td><td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td><td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td><td>\$ 169.890.836</td></tr> <tr><td>17845</td><td>28/08/2018</td><td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td><td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td><td>\$ 434.591</td></tr> <tr><td>14720</td><td>23/11/2018</td><td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td><td>3-3-1-15-02-14-0208-134</td><td>\$ 47.277.650</td></tr> </tbody> </table>			No.	FECHA	CÓDIGO	RUBRO	VALOR	17120	22/09/2018	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 193.022.254	17747	18/07/2018	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 55.348.734	17749	26/07/2018	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 60.308.532	17747	29/07/2018	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 80.308.532	17892	27/08/2018	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 169.890.836	17845	28/08/2018	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 434.591	14720	23/11/2018	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 47.277.650																								
No.	FECHA	CÓDIGO	RUBRO	VALOR																																																														
17120	22/09/2018	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 193.022.254																																																														
17747	18/07/2018	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 55.348.734																																																														
17749	26/07/2018	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 60.308.532																																																														
17747	29/07/2018	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 80.308.532																																																														
17892	27/08/2018	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 169.890.836																																																														
17845	28/08/2018	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 434.591																																																														
14720	23/11/2018	3-3-1-15-02-14-0208-134	3-3-1-15-02-14-0208-134	\$ 47.277.650																																																														
En la ciudad de Bogotá, a los Trece (13) días del mes de noviembre del año 2018, se reunieron los siguientes: Guillermo Burgos Onito como representante legal de CONSORCIO VIAL BOGOTÁ o su delegado (debidamente autorizado) de la firma contratista, Erick Jose Castillo Cunuhox como representante o su delegado (debidamente autorizado) de la firma interventora y el supervisor del contrato, o un delegado por la Caja de Vivienda Popular Karoli Garcia, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No.700 del año 2017 por parte de la Caja de Vivienda Popular, a la firma Contratista, en cumplimiento de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato de obra mencionado.																																																																		
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA QUE SE RECIBE:</b>																																																																		
La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.																																																																		



### LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR No 19  
UPZ: 08  
BARRIO: EL TESONITO  
CODIGO CVP: CIV 1912250-19912225-19912244

NOMENCLATURA DE REFERENCIA:  
 CIV-19917223-K-10M-Entre calle E108 y Calle E1C 2ur.  
 CIV-19917244-K-10M-Entre calle E109 y Calle E1C 9ur.  
 CIV-19917250-K-11M-Entre calle E109 y Calle E1C 9ur.

LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR No 18
UPE:	67
BARRO:	NACIONES UNIDAS
COORDEN. CVP:	CV 19011287-19011308

**NOMENCLATURA DE REFERENCIA:**

CTY-19011287-Kr 10P - Ruta calle 77 e y Calle 77A Sur  
CTY-19011108-Kr 10P - Ruta calle 76A y Calle 73A Sur

LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR No 19
UPZ:	07
BARRIO:	VISTA HERMOSA
CODIGOS CVP:	CIV 1921292

**NOMENCLATURA DE REFERENCIA:**

CIV-19010992-Kr 19K -Rmte calle 70AE y Calle 70A Sur

**VALOR TOTAL DE LA OBRA ELICITADA:**

Valor de la obra ejecutada:	1	627,450,661.00
Valor Mayores cantidades de obra ejecutadas:	1	372,094,781.00
Valor Itema no previstos ejecutados.	1	68,731,782.00
Valor total de la obra:	1	717,973,421.00

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA POR CV

[illegible]

## CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA POR TRAMOS CVP EN APLICACION

[illegible]

16

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA											Código: 335402-PL-17		
											Versión: 1		Page: 1 de 3
											Vigencia desde: 10/09/2011		
3,9	VIGA EXTERNA PARA ANCLAJE DE CIGARRAS DE 3000 PSI (0,20x0,40)	ML	11,84	14,00	12,50	5,72	3,25	7,30	54,41	\$	50,800	\$	2.704.028,00
3,9	VIGA INTERMEDIA PARA ANCLAJE DE CIGARRAS DE 3000 PSI (0,20x0,40)	ML	5,92	85,40	16,25	11,79	-	24,03	144,01	\$	50,800	\$	7.315.708,00
3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA RAMPA, DEPENDIENDO DE 10 M. INCLUYE REFUERZO CON MALLA ELÉCTRICOLADA DE 4MM ESPACIADA CADA 10 CM	M2	15,77	75,67	16,76	31,80	17,70	45,90	203,30	\$	53,823	\$	10.941.809,00
3,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA FRANJA DE AJUSTE 4x0,10	M2	-	-	-	-	-	-	-	\$	8,816	\$	-
3,12	MURO DE CONTENCIÓN TIPO B DE 1+0,30M INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ZAPATA DE CIMENTACIÓN Y FORMALETA	ML	-	17,02	-	-	-	-	17,02	\$	284,521	\$	4.842.547,00
3,14	MURO DE CONTENCIÓN TIPO T DE 1+0,30M INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ZAPATA DE CIMENTACIÓN Y FORMALETA	ML	9,83	36,05	12,87	54,80	-	43,80	157,37	\$	406,632	\$	64.305.575,00
4	ACERADO PARA PISO Y PREFABRICADOS												
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA PAVOT A-20 (0,20x0,30) (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RETIRO)	M2	105,28	157,94	97,85	184,00	61,66	211,00	617,73	\$	62,861	\$	51.419.650,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASQUEL (COMPARACION VISUAL A-20 0,20x0,30) (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RETIRO)	ML	39,80	83,04	79,70	84,30	49,30	140,22	476,46	\$	12,239	\$	5.340.923,00
4,3	CONSTRUCCIÓN FRANJA DE CEMENTAMENTO 0,10x0,30 CONCRETO DE 3000 PSI	ML	92,60	119,50	118,60	162,01	64,00	235,66	771,77	\$	27,270	\$	21.046.168,00
4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DORADO PREFABRICADO A-40 (0,20x0,30) (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RETIRO)	ML	-	21,49	-	26,05	27,41	5,93	80,88	\$	42,211	\$	3.414.026,00
4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARONCEL TIPO A-10 (0,20x0,30) (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RETIRO)	ML	35,90	89,55	-	-	48,13	-	173,64	\$	48,991	\$	3.506.797,00
4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIZA DE RESISTO A-100 PARA RAMPA (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RETIRO)	UN	2,00	18,60	6,00	6,00	4,00	8,00	44,60	\$	80,925	\$	3.609.255,00
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARONCEL ESPECIAL A-100 PARA RAMPA (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RETIRO)	UN	-	30,00	-	2,00	6,00	12,00	50,00	\$	45,796	\$	2.289.800,00
5	REDES DE AGUVEDUTO Y ALCANTARILLADO												
5,1	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON CAMARA CCTV PARA D=0 A 24"	ML	122,20	51,00	50,00	45,00	71,00	-	339,20	\$	10,346	\$	3.509.368,00
5,2	CONCEJO, LAVADO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SUMPACTOR ENTRE 0" Y 30"	ML	122,20	51,00	50,00	45,00	-	38,00	306,20	\$	14,442	\$	4.422.140,00
5,3	ENTRADO DISCONTINUO EN MADERA	M2	-	-	-	-	-	-	-	\$	22,217	\$	-
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE 1" EN PVC (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GRANALLAJE)	ML	-	-	-	-	-	-	-	\$	47,208	\$	-
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE 1 1/2" EN PVC (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GRANALLAJE)	ML	-	-	-	-	-	-	-	\$	96,355	\$	-
5,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE 2" DIAMAL PRHOS PU EN PVC PARA REDES DE AGUVEDUTO (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RETIRO)	ML	-	-	-	-	-	-	-	\$	21,364	\$	-
5,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE 4" DIAMAL PRHOS PU EN PVC PARA REDES DE AGUVEDUTO (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RETIRO)	ML	-	-	-	-	-	-	-	\$	38,865	\$	-
5,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE 6" DIAMAL PRHOS PU EN PVC PARA REDES DE AGUVEDUTO (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RETIRO)	ML	-	-	-	-	-	-	-	\$	82,146	\$	-
6,10	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGROS (0,70x0,70x0,70m) INCLUYE MARCO, TAPA, BRUJE Y CABLEAJE	UN	7,00	13,00	7,00	9,00	4,00	10,00	50,00	\$	363,207	\$	18.160.350,00
6,11	CONCRETO POZO DE INSPECCIÓN EN MANIPOSTERIA 8-0,25 D=1,70m EXTERIOR, INCLUYE PARED, GEOTEXTIL Y PAVILITE	ML	-	-	-	-	-	-	-	\$	400,326	\$	-
6,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA FONDO, CARTELA Y TAPA PARA POZOS DE INSPECCIÓN	UN	-	-	-	-	-	-	-	\$	2.290,961	\$	-
6,15	TUBERIA PE D=12" PARA ALCOMETRA DOMINILARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RETIRO)	ML	-	144,00	-	-	-	-	144,00	\$	1,734	\$	249.698,00
6,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTI	UN	10,00	16,00	12,00	5,00	3,00	11,00	57,00	\$	15,061	\$	858.477,00
6,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4"x6" EN PVC PARA REDES DE AGUVEDUTO	UN	-	8,00	-	-	-	-	3,00	\$	20,924	\$	62.772,00
6,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLAR DE DERIVACIÓN DE 6"x6" EN PVC PARA REDES DE AGUVEDUTO	UN	-	-	-	-	-	-	-	\$	24,805	\$	-
6,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJILLAS PARA MEDIDOR DE AGUA POTABLE (INCLUYE EL RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	10,00	16,00	12,00	6,00	3,00	11,00	58,00	\$	128,349	\$	7.444.242,00
6,21	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN REDES DE AGUVEDUTO DE HASTA 12" POR TRAMOS	UN	-	-	-	-	-	-	-	\$	401,080	\$	-
6,22	PRUEBA DE DESINFECCIÓN DE TUBERIAS EN REDES DE AGUVEDUTO DE HASTA 12" POR TRAMOS	UN	-	-	-	-	-	-	-	\$	401,080	\$	-
6,23	PRUEBA DE HERMETICIDAD PARA REDES DE ALCANTARILLADO POR TRAMOS	UN	-	-	-	-	-	-	-	\$	499,384	\$	-
6,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO G. RAD PVC 90° TIPO U.M D=4" NO INCLUYE ANCLAJE	UN	-	-	-	-	-	-	-	\$	123,075	\$	-
6,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO G. RAD PVC 45° TIPO U.M D=4" NO INCLUYE ANCLAJE	UN	-	-	-	-	-	-	-	\$	237,291	\$	-




86

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA												Codigo: 200-MD-FR-17	
												Version: 1	Pag: 1 de 3
												Vigencia: 01/01/2011	
6.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC 225° TIPO U.M. D=4", NO INCLUYE ANCLAJE	UN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 79.291	\$ -
6.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PRECION D=4", NO INCLUYE ANCLAJE	UN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 121.482	\$ -
6.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PRECION D=4", NO INCLUYE ANCLAJE	UN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 231.455	\$ -
6.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC TIPO U.M. 470°	UN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 123.253	\$ -
6.33	DECONTAMACION E INSTALACION DE HIDRANTE	UN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 188.565	\$ -
6.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS DE POCO DE ACUEDUCTO 470° (P.O.)	UN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 202.909	\$ -
6	VEGETACION												
6.3	TALA DE ARBOLES CLASE I (H=1M, INCLUYE CORTAR, RETIRO Y DISPOSICION FINAL MANUAL DE REMOLQUE URBANA CON ALTURA < 6m (20' UN RESGU) CON 7132 DEL 30/12/2011 DE LA SDM)	UN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 737.337	\$ -
7	MORILLON URBANO												
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLAPOO EN METRO TIPO 1402	UN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 128.832	\$ -
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRANZA 1431	ML	9,30	39,52	10,62	49,45	9,20	48,00	166,09	\$	261,923	\$ 43.502.791,00	
			-	-	-	-	-	-	-	\$	-	\$ -	
8	PRECIOS NO PREVISTOS												
NP-1	PADE GRANULAR 054 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	-	94,61	-	-	-	-	94,61	\$	117.371	\$ 11.104.470,00	
NP-2	LOS DE CONCRETO M145 (SUMINISTRO, FORMATEADO, COLACION Y ACABADO NO INCLUYE ACERO CLAPADO JUNTA)	M3	-	-	-	-	-	-	-	\$	456.909	\$ -	
NP-3	ACERO DE REFUERZO (incluye suministro, ligadura y fijacion)	KG	-	33,60	-	51,74	-	-	85,34	\$	2.499	\$ 213.265,00	
NP-4	SARDINEL DADO AIS PARA RAMPA (Suministro e instalación incluye 2cm Mortero 1:3)	UN	-	-	-	-	-	-	-	\$	39.472	\$ -	
NP-5	SARDINEL PRETENSADO ALTO RAMPA ANG (Suministro e instalación incluye 2cm Mortero de Nivelación 1:3)	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	\$	39.472	\$ -	
NP-6	TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.C. (incluye Suministro e instalación)	ML	12,20	100,30	12,70	12,90	-	15,50	153,60	\$	65.654	\$ 10.084.454,00	
NP-7	CONEXIONES HT TALLA VEE 200X100X10 PVC (Suministro e instalación)	UND	-	3,00	-	-	-	-	3,00	\$	60.175	\$ 180.525,00	
NP-8	NIVELACION DE PISO (Pavimento en Concreto 2000 PSI Hecho en Otro, 140-15cm, Incluye Suministro y Construcción)	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	\$	75.097	\$ -	
NP-9	GUARDORO LATERAL CL-100, H=125m (fundido en Odo, Goteo de Planchetas, Incl. Curvas, Puntos, Pies y Cuentas Incl. Tapas)	UNIDAD	-	2,00	-	-	-	-	2,00	\$	1.486.357	\$ 2.932.714,00	
NP-11	TAPON HO EXTREMO L=20 D=4"	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	\$	235.779	\$ -	
NP-12	TAPON HO EXTREMO L=20 D=4" (Suministro e instalación)	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	\$	102.287	\$ -	
NP-13	CODO CLAPD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (Suministro e instalación)	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	\$	102.926	\$ -	
NP-14	UNION DE REPARACION HO CL D=4" (Suministro e instalación)	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	\$	264.901	\$ -	
NP-15	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (Suministro e instalación)	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	\$	155.425	\$ -	
NP-16	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e instalación)	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	\$	90.992	\$ -	
NP-17	TEE HO EXTREMO L=20 D=4" (Suministro e instalación)	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	\$	293.069	\$ -	
NP-18	UNION PVC TIPO U.M. D= 2" (Suministro e instalación)	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	\$	42.603	\$ -	
NP-19	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (Suministro e instalación)	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	\$	68.211	\$ -	

99

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA										Codigo: 295-MD-FR-17																																																														
										Version: 1	Pag: 1 de 3																																																													
										Vigencia desde: 16/09/2011																																																														
NP-20	CASA PARA VALVULA 0.4x0.4x0.4m (palo y marco y tapa)	UN	-	1,00	-	-	-	1,00	-	2,00	\$	156.094	\$	312.188,00																																																										
NP-21	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MEDIO ASFALTO CONVENCIONAL R0-100 (preparado velozes 00-100) (suministro, extendido, nivelación y compactación con vibracompactor y compactador de tarde)	M3	-	18,56	-	-	-	-	-	18,56	\$	542.922	\$	10.076.832,00																																																										
NP-22	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MEDIO ASFALTO CONVENCIONAL R0-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación con vibracompactor y compactador de tarde)	M3	-	21,21	-	-	-	-	-	21,21	\$	578.214	\$	12.263.919,00																																																										
NP-23	APROXIMACION CON EMULSION ASFALTICA GRUPO 2 (suministro, Densado Superficies y Riego)	M2	-	265,13	-	-	-	-	-	265,13	\$	2.040	\$	540.865,00																																																										
NP-24	REGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA GRUPO 2 (suministro, Densado Superficies y Riego)	M2	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	1.845	\$	-																																																										
NP-25	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO ENZEM INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	2,12	\$	421.955	\$	892.435,00																																																										
NP-26	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO TRIANGULO CON ALTURA DE 75cm INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	3,84	\$	302.955	\$	1.070.946,00																																																										
NP-27	DEMARCAION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (m=2.3m, Termoplástico, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Mano de obra)	ML	-	-	-	-	-	-	-	-	\$	10.659	\$	-																																																										
NP-28	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.15m (m=2.3m, Termoplástico, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Mano de obra)	ML	-	30,00	-	-	-	-	-	30,00	\$	13.324	\$	399.720,00																																																										
NP-29	FLECHA DIRECCIONAL DE FRENTE A LA DERECHA (m=2.3m, Termoplástico, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Mano de obra)	UNIDAD	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	\$	193.647	\$	193.647,00																																																										
NP-30	DEMARCAION DE LINEA DE PASE PEATONAL CONTINUA A=0.3m (m=2.3m, Termoplástico, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Mano de obra)	ML	-	40,00	-	-	-	-	-	40,00	\$	26.649	\$	1.065.960,00																																																										
<b>SUBTOTAL</b>											\$	525.806.218,00																																																												
<b>IVA 10%</b>											\$	52.580.621,80																																																												
<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA</b>											\$	578.386.839,80																																																												
<b>VALOR TOTAL AJUSTES CALIDAD</b>											\$	-																																																												
<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAR ADITIVO</b>											\$	578.386.839,80																																																												
<b>VALOR UNITARIO</b>											\$	21.725.000																																																												
<b>VALOR TOTAL</b>											\$	12.600.000																																																												
<b>VALOR TOTAL AJUSTADO OBRA SOCIAL Y PREVENIA</b>											\$	717.875.839,80																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Comprobante Gestion Social</td> <td>CL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Comprobante Gestion PREVENIA</td> <td>CL</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>														ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	1	Comprobante Gestion Social	CL	1	2	Comprobante Gestion PREVENIA	CL	1																																															
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD																																																																					
1	Comprobante Gestion Social	CL	1																																																																					
2	Comprobante Gestion PREVENIA	CL	1																																																																					
<b>RELACION DE GARANTIAS DEL CONTRATO:</b>																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLASE</th> <th>ETAPA PROCESAL</th> <th>FECHA</th> <th>OBJETO</th> <th>FECHA</th> <th>NO DE EXPEDIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>														CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	OBJETO	FECHA	NO DE EXPEDIENTE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																																															
CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	OBJETO	FECHA	NO DE EXPEDIENTE																																																																			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																																																																			
<b>RELACION DE SANCIONES REALIZADAS AL CONTRATO:</b>																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REGLACION NR</th> <th>OBJETO</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>														REGLACION NR	OBJETO	FECHA	N/A	N/A	N/A																																																					
REGLACION NR	OBJETO	FECHA																																																																						
N/A	N/A	N/A																																																																						
<b>RELACION DE GARANTIAS DEL CONTRATO:</b>																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Garantia</th> <th rowspan="2">Nombre Asegurador</th> <th rowspan="2">No. Póliza</th> <th colspan="3">Vigencia</th> <th rowspan="2">No de Certificado Modificatorio</th> <th rowspan="2">Valor Asegurado</th> </tr> <tr> <th>Fecha de Inicialización</th> <th>Fecha de Vencimiento</th> <th>Fecha de Vencimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Buen Manejo de Anticipo</td> <td>Seguros del Estado</td> <td>11-44-101114532</td> <td>14/02/2018</td> <td>14/03/2020</td> <td>14/03/2020</td> <td>ANEXO</td> <td>\$ 235.037.891,10</td> </tr> <tr> <td>Salarios y Prestaciones Sociales</td> <td>Seguros del Estado</td> <td>11-44-101114532</td> <td>14/02/2018</td> <td>15/09/2019</td> <td>15/09/2019</td> <td>ANEXO 4</td> <td>\$ 235.037.891,10</td> </tr> <tr> <td>Calidad del Servicio</td> <td>Seguros del Estado</td> <td>11-44-101114532</td> <td>14/02/2018</td> <td>15/09/2021</td> <td>15/09/2021</td> <td>ANEXO 4</td> <td>\$ 117.518.945,35</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento del Contrato</td> <td>Seguros del Estado</td> <td>11-44-101114532</td> <td colspan="3">6 AÑOS</td> <td>ANEXO 4</td> <td>\$ 301.725.818,50</td> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td> <td>Seguros del Estado</td> <td>11-40-101026172</td> <td></td> <td>15/09/2019</td> <td></td> <td>ANEXO 4</td> <td>\$ 156.248.400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>VALOR TOTAL ASEGURADO</b></td> <td>\$ 1.130.572.948,05</td> </tr> </tbody> </table>														Garantia	Nombre Asegurador	No. Póliza	Vigencia			No de Certificado Modificatorio	Valor Asegurado	Fecha de Inicialización	Fecha de Vencimiento	Fecha de Vencimiento	Buen Manejo de Anticipo	Seguros del Estado	11-44-101114532	14/02/2018	14/03/2020	14/03/2020	ANEXO	\$ 235.037.891,10	Salarios y Prestaciones Sociales	Seguros del Estado	11-44-101114532	14/02/2018	15/09/2019	15/09/2019	ANEXO 4	\$ 235.037.891,10	Calidad del Servicio	Seguros del Estado	11-44-101114532	14/02/2018	15/09/2021	15/09/2021	ANEXO 4	\$ 117.518.945,35	Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado	11-44-101114532	6 AÑOS			ANEXO 4	\$ 301.725.818,50	Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros del Estado	11-40-101026172		15/09/2019		ANEXO 4	\$ 156.248.400,00	<b>VALOR TOTAL ASEGURADO</b>							\$ 1.130.572.948,05
Garantia	Nombre Asegurador	No. Póliza	Vigencia			No de Certificado Modificatorio	Valor Asegurado																																																																	
			Fecha de Inicialización	Fecha de Vencimiento	Fecha de Vencimiento																																																																			
Buen Manejo de Anticipo	Seguros del Estado	11-44-101114532	14/02/2018	14/03/2020	14/03/2020	ANEXO	\$ 235.037.891,10																																																																	
Salarios y Prestaciones Sociales	Seguros del Estado	11-44-101114532	14/02/2018	15/09/2019	15/09/2019	ANEXO 4	\$ 235.037.891,10																																																																	
Calidad del Servicio	Seguros del Estado	11-44-101114532	14/02/2018	15/09/2021	15/09/2021	ANEXO 4	\$ 117.518.945,35																																																																	
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado	11-44-101114532	6 AÑOS			ANEXO 4	\$ 301.725.818,50																																																																	
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros del Estado	11-40-101026172		15/09/2019		ANEXO 4	\$ 156.248.400,00																																																																	
<b>VALOR TOTAL ASEGURADO</b>							\$ 1.130.572.948,05																																																																	


<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA</b>						Código: 200-AD-FL-17 Versión: 1      Pág. 1 de 3 Vigente desde: 15/09/2011		
<b>CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES</b>								
La interventoria dejó constancia que las obras recibidas cumplan con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartas y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.								
<b>PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTEPAGO</b>								
Valor total concedido:						\$193.023.270,00		
Valor total amortizado:						\$193.023.270,00		
<b>RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO</b>								
CÓDIGO DE OBRA NA	PERIODO	VALOR COSTO DIRECTO	VALOR AU	VALOR TOTAL	VR IVA	VR TOTAL	VALOR AMORTIZADO	VALOR NETO
1	DEL 14/02/2018 AL 31/03/2018	\$ 10.884.545,00	\$ 3.259.363,00	\$ 14.123.908,00		\$ 14.123.908,00	4.237.173,0	\$ 9.886.738,00
2	DEL 1/04/2018 AL 30/04/2018	\$ 43.051.537,00	\$ 12.915.481,00	\$ 55.966.998,00		\$ 55.966.998,00	19.483.713,0	\$ 45.511.698,00
3	DEL 1/05/2018 AL 31/05/2018	\$ 62.777.943,00	\$ 18.833.363,00	\$ 81.611.327,00		\$ 81.611.327,00	23.845.657,0	\$ 60.306.532,00
4	DEL 1/06/2018 AL 30/06/2018	\$ 180.726.982,00	\$ 54.218.039,00	\$ 234.945.021,00		\$ 234.945.021,00	72.727.250,0	\$ 169.696.839,00
5	DEL 1/07/2018 AL 31/07/2018	\$ 127.538.399,00	\$ 38.261.520,00	\$ 165.799.918,00		\$ 165.799.918,00	51.814.887,0	\$ 120.434.691,00
6	DEL 1/08/2018 AL 13/08/2018	\$ 100.848.830,00	\$ 30.254.849,00	\$ 131.103.479,00		\$ 131.103.479,00	19.114.601,0	\$ 47.277.950,00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 525.808.215,00</b>	<b>\$ 157.742.465,00</b>	<b>\$ 683.550.681,00</b>		<b>\$ 683.550.681,00</b>	<b>\$193.023.270,00</b>	<b>\$ 453.114.646,00</b>
<b>RECIBO DE DOCUMENTOS</b>								
CLASE DEL DOCUMENTO		CANTIDAD		DESCRIPCION		NÚMERO DE COPIAS		
NA		NA		NA		NA		
La liquidación del contrato no releva al Interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.								
Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en este contenido, pero no exime al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, el dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, si declararen todas imputables a mala calidad de la obra, la Caja de la Vivienda Popular deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.								
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (12) Trece _ días del mes de Noviembre _ de _2018_.								
 Firma: Nombre: Guillermo Burgos Galla Representante legal <b>Consejalista</b> Consorcio Vial Bogotá				 Firma: Nombre: Kerol Garcia Supervisor del Contrato Director Mejoramiento Barrios C.V.P				
 Firma: Nombre: ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX Representante legal Interventoria Consorcio JG								

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>HABITAT Casa de la Vivienda Popular</small>	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA</b>		Código: 208-DGC-Ft-61
			Versión: 1      Pág: 1
	Vigente desde: 23-05-2017		

#### DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No:	688 DE 2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO JOTA JOTA
NÚMERO DE IDENTIFICACION:	901.138.756-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES
ID REPRESENTANTE LEGAL:	79.410.278
OBJETO:	EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL-CIV) UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO" – Grupo 3 – Localidad 5 USME y Localidad 18 RAFAEL URIBE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$449.021.713
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE FEBRERO DE 2018 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE JUNIO DE 2018 ✓
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	CONSORCIO JS
<b>MODIFICACIONES</b>	
VALOR ADICIONADO:	\$0
PLAZO ADICIONAL:	N/A
CESION:	N/A
OTROS:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A

En Bogotá, D.C., a los **CINCO (5)** días del mes de Julio del año 2018, se reunieron **ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.602.923 , en su calidad de representante legal de **CONSORCIO JS**, quien ejerce la Interventoría para la ejecución del Contrato de Obra No. 688 de 2017, y **JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.410.278, en su calidad de representante legal del CONSORCIO JOTA JOTA, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, de la terminación del mencionado Contrato, por terminación de las obras y vencimiento del plazo de ejecución del mismo.


	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA</b>	Código: 208-DGC-Ft-61	
		Versión: 1	Pág: 1
		Vigente desde: 23-05-2017	


### CIV INTERVENIDOS


UPZ		CÓDIGO	NOMENCLATURA Y TRAMOS	TIPO DE PROYECTO	ÁREA ESTIMADA (m2)
No.	BARRIO	CIV			
56	DANUBIO AZUL	5000123	KR 4 H ENTRE CALLE 57 S Y CALLE 58 S	VÍA VEHÍCULAR	259,61
		5000129	KR 3 BIS ENTRE DG 54 D S Y CALLE 54G S	VÍA VEHÍCULAR	200,60
		5000320	DG 62 S ENTRE KR 2C Y KR 2	VÍA VEHÍCULAR	384,75
65	LA PAZ	18006382	CALLE 54 S ENTRE KR 4 B Y KR 4 C	VÍA VEHÍCULAR	128,26
AREA TOTAL					973,22

El estado actual del Contrato en mención corresponderá al reportado por el Interventor a través de su informe final.

En constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original y tres (3) copias con destino a la Dirección de Gestión Corporativa y CID, Interventoría, Contratista y a la carpeta de la Supervisión, a los 5 días del mes de Julio de 2018.

  
 INTERVENTOR.  
 CONSORCIO JS  
 NOMBRE: ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX  
 C.C.; 79.602.923.

  
 CONTRATISTA.  
 CONSORCIO JOTA JOTA  
 NOMBRE: JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES  
 C.C.; 79.410.278


	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA</b>		Código: 208-DGC-Ft-61
			Versión: 1      Pág: 1
	Vigente desde: 23-05-2017		

#### DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No:	690 DE 2017
CONTRATISTA:	BELISARIO ALFREDO DE LEON NARVAEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACION:	15.041.209
REPRESENTANTE LEGAL:	BELISARIO ALFREDO DE LEON NARVAEZ
ID REPRESENTANTE LEGAL:	15.041.209
OBJETO:	EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS VIALES ( CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL-CIV) UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES , ANEXO TECNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$977.060.600.00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO:	14 FEBRERO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 SEPTIEMBRE DE 2018
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	CONSORCIO JS
<b>MODIFICACIONES</b>	
VALOR ADICIONADO:	\$108.476.445.00
PLAZO ADICIONAL:	TREINTA (30) DIAS
CESION:	N/A
OTROS:	N/A
SUSPENSION:	N/A

En Bogotá, D.C., a los **TRECE (13)** días del mes de Septiembre del año 2018, se reunieron Erick José Castillo Curieux, identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.602.923 , en su calidad de representante legal de CONSORCIO JS , quien ejerce la Interventoría para la ejecución del Contrato No. 690 de 2018, Y BELISARIO ALFREDO DE LEON NARVAEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 15.041.209 ,en su calidad de representante legal de BELISARIO ALFREDO DE LEON NARVAEZ, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, de la terminación del mencionado Contrato , por terminación de las obras y vencimiento del plazo de ejecución del mismo. Quedando pendientes por ejecutar, de acuerdo a la lista anexa a la presente acta.


*[Handwritten signature]*


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>HABITAT Caja de la Vivienda Popular</small>	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA</b>		Código: 208-DGC-Ft-61	
			Versión: 1	Pág: 1
			Vigente desde: 23-05-2017	

GRUPO 2 - USME LOCALIDAD 5						
UPZ		BARRIO	CODIGO	NOMENCLATURAS Y TRAMOS	TIPO DE PROYECTO	AREA ESTIMADA (M2)
No	Nombre		CIV			
52	LA FLORA	VILLA DIANA	5004703	CL 89A S ENTRE KR12G E Y KR 12HE	ANDEN Y VIA	307
			5004713	CL 89A S ENTRE KR12F E Y KR 12GE	ANDEN Y VIA	447
			5004724	CL 89A S ENTRE KR12F E Y KR 12DE	ANDEN Y VIA	303,1
			5004725	CRA 12D E ENTRE CL 89S Y CL89A S	ANDEN Y VIA	861,1
59	ALFONSO LOEZ	PUERTA AL LLANO	30001896	KR 8CENTRE CK108S Y CL109 S	ANDEN Y VIA	668,53


El estado actual del Contrato en mención corresponderá al reportado por el Interventor a través de su informe final.

En constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original y tres (3) copias con destino a la Dirección de Gestión Corporativa y CID, Interventoría, Contratista y a la carpeta de la Supervisión, a los 13 días del mes de Septiembre de 2018.

  
 INTERVENTOR.  
 CONSORCIO JS  
 NOMBRE: ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX  
 C.C.: 79.602.923.

  
 CONTRATISTA.  
 BELISARIO ALFREDO DE LEON NARVAEZ  
 NOMBRE: BELISARIO ALFREDO DE LEON NARVAEZ  
 C.C.: 15.041.209




 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>HABITAT Caja de la Vivienda Popular</small>	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA</b>		Código: 208-DGC-Ft-61
	Versión: 1	Pág: 1	
	Vigente desde: 23-05-2017		

#### DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No:	700 DE 2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL BOGOTA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901138618-3
REPRESENTANTE LEGAL:	GUILLERMO BURGOS GRILLO
ID REPRESENTANTE LEGAL:	79.326.707
OBJETO:	EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES ( CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL-CIV) UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES , ANEXO TECNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$643.410.880.00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO:	14 FEBRERO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 SEPTIEMBRE DE 2018
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	CONSORCIO JS
<b>MODIFICACIONES</b>	
VALOR ADICIONADO:	\$140.048.757.00
PLAZO ADICIONAL:	TREINTA (30) DIAS
CESIÓN:	N/A
OTROS:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A


En Bogotá, D.C., a los **TRECE (13)** días del mes de Septiembre del año 2018, se reunieron Erick José Castillo Curieux, identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.602.923 , en su calidad de representante legal de CONSORCIO JS, quien ejerce la Interventoría para la ejecución del Contrato No. 700 de 2018, Y GUILLERMO BURGOS GRILLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.326.707, en su calidad de representante legal de CONSORCIO VIAL BOGOTÁ, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, de la terminación del mencionado Contrato , por terminación de las obras y vencimiento del plazo de ejecución del mismo. Quedando pendientes por ejecutar, de acuerdo a la lista anexa a la presente acta.


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>HABITAT Ciudad de la Vivienda Popular</small>	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA</b>		Código: 208-DGC-Ft-61	
			Versión: 1	Pág: 1
	Vigente desde: 23-05-2017			

GRUPO 1 - CIUDAD BOLIVAR LOCALIDAD 19						
UPZ		BARRIO	CODIGO	NOMENCLATURAS Y TRAMOS	TIPO DE PROYECTO	AREA ESTIMADA (M2)
No	Nombre		CIV			
68	TESORO	EL TESORITO	19012225	KR 18H ENTRE CALLE 81B S Y CALLE 81C S	Andén	154,58
			19012244	KR 18H ENTRE CALLE 81D S Y CALLE 81C S	Andén	137,84
			19012250	KR 18I ENTRE CALLE 81D S Y CALLE 81C S	Vía y Andén	575,12
67	LUCERO	NACIONES UNIDAS	19011267	KR 18R ENTRE CALLE 77 S Y CALLE 77A S	Andén	113,02
			19011108	KR 18P ENTRE CALLE 76 S Y CALLE 75A S	Andén	270
		VISTA HERMOSA	19010202	KR 18K ENTRE CALLE 75A S Y CALLE 76 S	Andén	215,46

El estado actual del Contrato en mención corresponderá al reportado por el Interventor a través de su informe final.

En constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original y tres (3) copias con destino a la Dirección de Gestión Corporativa y CID, Interventoría, Contratación y a la carpeta de la Supervisión, a los 13 días del mes de Septiembre de 2018.

  
 INTERVENTOR  
 CONSORCIO JS  
 NOMBRE: ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX  
 C.C.: 79.602.923

  
 CONTRATISTA  
 CONSORCIO VIAL BOGOTA  
 NOMBRE: GUILLERMO BURGOS GRILLO  
 C.C.: 79.326.707

## CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Bogotá D.C, noviembre 23 de 2017

Señores

**CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

Ciudad

En la ciudad de Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año 2017, comparecieron las siguientes personas jurídicas, por conducto de sus representantes legales, los cuales concurren debidamente autorizados y facultados para otorgar el presente acto:

### ARTÍCULO 1: INTEGRANTES DEL CONSORCIO E IDENTIFICACION:

Nº	NOMBRE DEL INTEGRANTE	NIT	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nº DE CEDULA
1	SEIING S.A.S	900208425-6	EDWIN FERNANDO SIERRA HERNANDEZ	80.257.171
2	JASEN CONSULTORES S.A.S	830087225-5	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX	79.602.923

### ARTÍCULO 2: OBJETO DEL CONSORCIO:

El objeto del presente acuerdo es la integración de un consorcio entre las personas plenamente identificadas en el artículo 1° del presente documento, con el propósito de presentar en forma conjunta propuesta para el concurso de méritos CVP-CM-008-2017. Abierto por la Caja de Vivienda Popular, cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SSTMA PARA LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.,” y para la ejecución del contrato si nos fuese adjudicado.

La integración del consorcio se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la propuesta para participar en el proceso antes referido, así como el cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual adjudicación de acuerdo con los términos y condiciones de la selección, así como en la ejecución del contrato en los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones y los términos contractuales del contrato en caso de ser adjudicatarios.

Las partes acuerdan y manifiestan que el presente consorcio no constituye una persona jurídica distinta de las partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho o sociedad alguna.

La integración del consorcio se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la propuesta para participar en el proceso antes referido, así como el cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual

adjudicación de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la invitación pública y los términos contractuales del contrato en caso de ser adjudicatarios.

### **ARTÍCULO 3: NOMBRE Y DOMICILIO:**

El consorcio que las partes constituyen mediante el presente acuerdo se denominará para todos los efectos de la selección y de la ejecución del contrato, en caso de ser adjudicatarios, “**CONSORCIO JS**” y su domicilio será la ciudad de Bogotá con dirección en Carrera 69 F No 8 – 31, FAX 2900754, Teléfono 2900754.

### **ARTÍCULO 4: RESPONSABILIDAD:**

Los integrantes participando a título de consorcio, comprometen su responsabilidad solidaria frente a la Caja de Vivienda Popular, en lo relacionado con el cumplimiento total de la propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en consecuencia nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, por virtud de lo cual entendemos que las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y el contrato afectan a todos los integrantes que lo conforman.

### **ARTÍCULO 5: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO:**

Las partes han designado a ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, domiciliado en Bogotá, ciudadano Colombiano, identificado con C.C. No. 79.602.923 de Bogotá, para que actué como representante y vocero del Consorcio frente a LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR y terceros.

El representante del Consorcio tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre del CONSORCIO y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la propuesta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que la CAJA DE VIVIENDA POPULAR adjudicase el proceso de selección al consorcio, en especial tendrá las facultades suficientes para:

- Presentar la propuesta
- Suscribir la carta de presentación de la propuesta
- Atender todos los posibles requerimientos que formule LA CAJA con aclaraciones a la propuesta.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la propuesta dentro de los términos y condiciones del proceso de selección.
- Notificarse del acto de adjudicación del proceso de selección, así como de todos los documentos que LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR emita en el curso del proceso de selección como en la ejecución del contrato, en el evento que el consorcio resulte adjudicatario.
- Suscribir el contrato correspondiente, así como las modificaciones, prorrogas, adiciones, liquidación y demás documentos que se produzcan en desarrollo del mismo.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del contrato dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones del proceso de selección.

- Presentar los recursos pertinentes tanto en nombre del consorcio como en nombre de sus integrantes.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevivientes para el consorcio, los miembros del consorcio o los representantes legales de estos, el representante del consorcio tendrá la obligación de informarlo por escrito a la CAJA DE VIVIENDA POPULAR dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el solo hecho de la firma del presente acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se derivan del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo el representante del consorcio, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicara a la entidad contratante.

Las partes han designado a EDWIN FERNANDO SIERRA HERNANDEZ, domiciliado en Bogotá, ciudadano Colombiano, identificado con C.C. No. 80.257.171 de Bogotá, para que actúe como representante Legal Suplente con las mismas facultades del Representante Legal.

#### **ARTÍCULO 6: PORCENTAJE DE PARTICIPACION:**

Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:

<b>INTEGRANTES</b>	<b>PARTICIPACIÓN (%)</b>
SEIING S.A.S	30,00%
JASEN CONSULTORES S.A.S	70,00%

**PARAGRAFO:** La participación de cada una de las partes que conforman el ciento por ciento (100%) del consorcio no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo de LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR.

#### **ARTÍCULO 7: EXCLUSIVIDAD:**

Durante la vigencia del presente acuerdo las partes se obligan a no participar directa o indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato relacionado con la presentación de otra propuesta para el proceso Concurso de méritos CVP-CM-008-2017.

#### **ARTÍCULO 8: DURACION:**

La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la adjudicación será igual al plazo del contrato y un (1) año más, en todo caso EL CONSORCIO durara todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas, en caso de que la propuesta presentada por el Consorcio no resulte favorecida la vigencia del presente acuerdo se extinguirá de manera automática.

## **ARTÍCULO 9: CESION:**


No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del CONSORCIO entre ellos, cuando se trate de una cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, quien en virtud de la ley podrá reservarse la facultad de aprobar dicha cesión.

Requerirá aprobación escrita previa de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, quien en virtud de la ley, podrá reservarse la facultad de aprobar dicha cesión.

## **ARTICULO 10. LEY Y JURISDICCION APLICABLE:**

El presente acuerdo se rige por las leyes de la Republica de Colombia, en especial en lo dispuesto por la ley 80 de 1993 y demás disposiciones complementarias.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2017.



**EDWIN FERNANDO SIERRA HERNANDEZ**  
C.C N° 80.257.171 de Bogotá  
Representante Legal  
**SEING S.A.S**



**ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX**  
C.C. N° 79'602.923 de Bogotá  
Representante Legal  
**JASEN CONSULTORES S.A.S**

## **ACEPTO EL NOMBRAMIENTO COMO REPRESENTANTE DEL CONSORCIO**



**ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX**  
C.C. No. 79.602.923 de Bogotá  
Representante Legal  
**CONSORCIO JS**



**EDWIN FERNANDO SIERRA HERNANDEZ**  
C.C N° 80.257.171 de Bogotá  
Representante Legal Suplente  
**CONSORCIO JS**
